

DIRECCIÓN DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE:	03/10/2022
PORTE:	1

→

03/10/2022

DATOS DE LA OBRA

3E1

REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE LOS HORCONES, VILLA GARCIA, ZACATECAS

ción ;	LOS HORCONES
E ORBA :	REHABILITACION

ADJUDICACION DIRECTA

CTO NO. 9 MVG-23-06-2022

MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ

CONTRATO:	\$	948,00
-----------	----	--------

CONTRATO: 23/06/2022

ANTICIPO : 5

PAGO ANTICIPO :

PI. DE CONTRATO:	N/A
------------------	-----

CAMPI CONTRATO:		N/A

L AMPL. CONTRATO:	N/A
-------------------	-----

INICIO	TI
--------	----

	30-jun-22	15-ago-22
AS PROGRAMADAS:		
AS REALES:		
AS DESPROGRAMADAS:		

OBSERVACIONES DAS:	
--	--

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN:

BOOK REVIEW

OPERADO FISM




**OPERADO
FISM**



MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

INFORME FOTOGRÁFICO

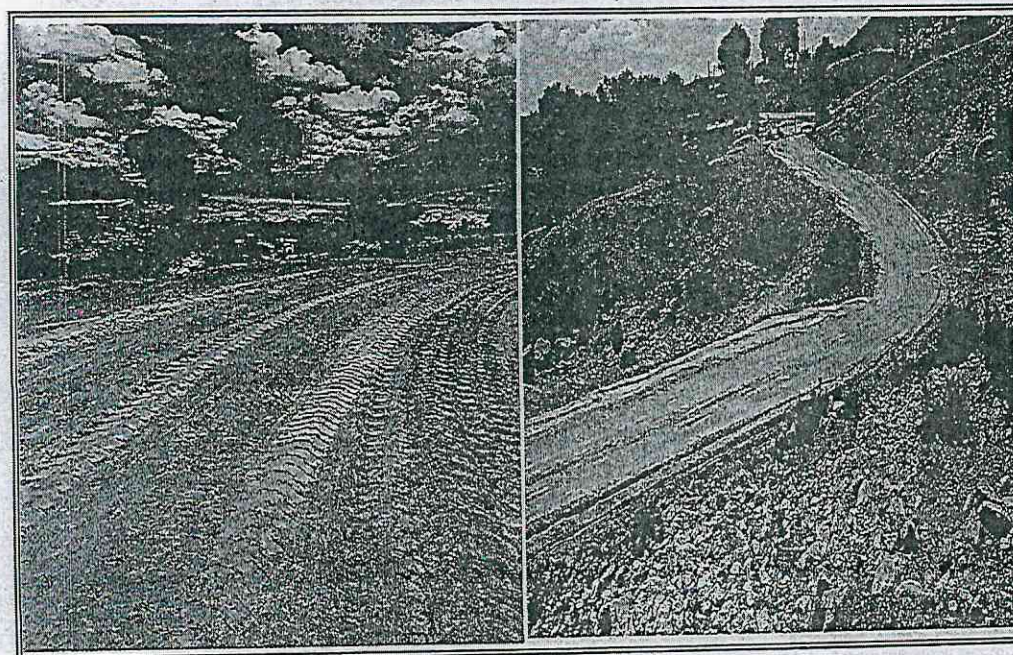

REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE
LOS HORCONES, VILLA GARCIA, ZACATECAS

OBRA:

LOCALIDAD:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

30-jun-22

15-ago-22

000105

BITÁCORA DE OBRA.

Nombre de la obra: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE LOS HORCONES, VILLA GARCIA, ZACATECAS

Nota 1: 30 JUNIO 2022

Se inicia la obra con la elaboracion del letrero alusivo, asi como el despalme y desplante de la terraceria

Nota 2: 19 JULIO 2022

Inicia recompactación de terreno natural

Nota 3: 2 AGOSTO 2022

Inicia el mezclado, tendido y compactado de la capa subrasante y terraplene existente.

Nota 4: 15 AGOSTO 2022

Se da por terminada la obra

