

**GERENCIA TECNICA**

**INFORME:**

**ÁREA DE COORDINACIÓN  
DE SUPERVISIÓN.**

**MES: OCTUBRE**

**AÑO: 2020**

## “3era. ETAPA DE SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE.”


**Empresa Ganadora: PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.**

**Contrato No. SAPSAM-LPE-OB-022-2019.  
Monto Contratado \$9,442,794.70. INCLUYE IVA**

<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 406 DÍAS NATURALES		
<b>FECHAS</b>	<b>INICIO</b>	<b>TERMINACIÓN</b>
<b>PROGRAMADA:</b>	22-oct-19	30-nov-20

**Avance Físico: 78.50%(corresponde al pago de estimaciones N°: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7)**

**Avance Financiero: 74.63% (corresponde al pago de estimaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)**

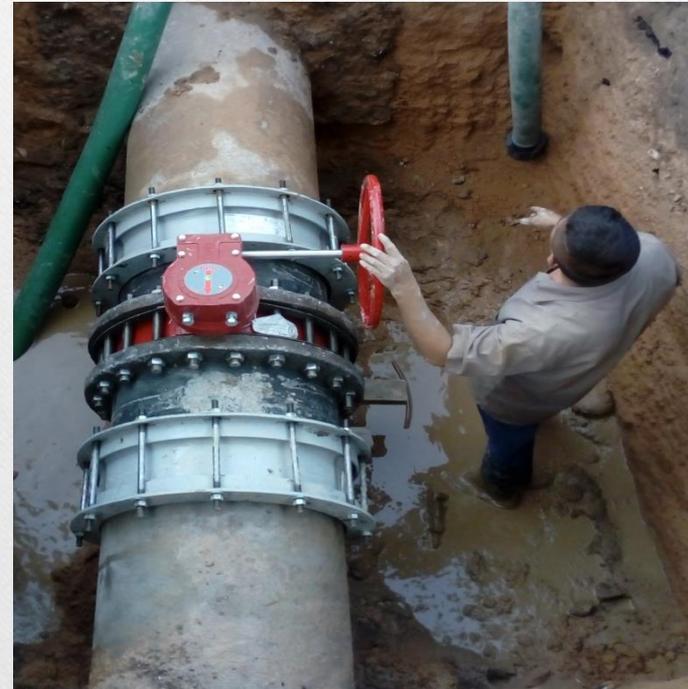

**“CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES CEDROS, ÁLAMOS, PROL. ARAMBERRI Y AVENIDA SUR, COL. LA FINCA (772.24 M CON TUBO PVC SANITARIO PARED COMPACTA SERIE 20 DE 250MM Y 15 POZOS DE VISITA)”**

**Empresa Ganadora:** ING. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ GONZALEZ

**Contrato No** SAPSAM-AD-OB-007-2020

**Monto Contratado** \$ 1,367,791.93 (UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTAY SIETE PESOS 05/100 M.N.), INCLUYE IVA..

**Avance Físico: 100.00%**

**Avance Financiero: 100.00% ( corresponde a pago de estimación 1, 2 y 3a estimación de finiquito).**



## “CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS UBICADAS EN CALLE HIDALGO No. 301 ESQ. BOCANEGRA, ZONA CENTRO (PRIMERA ETAPA)”

**Empresa Ganadora:** ING. OSWALDO MARTIN ALTAMIRANOVARO

**Contrato No** SAPSAM-AD-OB-010-2020

**Monto Contratado** \$ 1, 343,763.50, INCLUYE IVA.

**Monto ejecutado** \$ 1, 343,763.50, INCLUYE IVA.

**Avance Físico: 100%**

**Avance Financiero: 100.00%** (corresponde a pago estimación 1, 2,3 y Estimación 4 de finiquito).



## “REHABILITACIÓN DE TRAMOS DEL ACUEDUCTO LA MAROMA (2A ETAPA), TRAMO 2 SAN VICENTE - TANQUES RECREATIVOS Y TRAMO 3 VIBORILLAS EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P.”

**Empresa Ganadora:** GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT, S.A DE C.V.

**Contrato** SAPSAM-PROAGUA- IO-824020999-E1-2020

**Monto Contratado** \$ 3,144,727.80 (TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 80/100 M.N.) INCLUYE IVA

**Avance Físico: 68.98%**

**Avance Financiero: 48.70%** (corresponde a pago de Estimación 1y 2).

