


# INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA

## DIRECCIÓN DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

No. REPORTE : **1**  
 FECHA REPORTE : **13/04/2023**

REAL		PROGRAMADO	
AVANC			
FIBICO	10	10	10
MANCIE	30	30	30

DATOS DE LA OBRA		PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA		MESES												DIAS	% ENBASE TIEMPO		
NOMBRE :		PARTIDAS	IMPORTE	MARZO	ABRIL	MAYO													
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LA LUZ, COLONIA NIEVES, VILLA GARCIA, ZACATECAS		COLOCACION DE LETRERO	\$ 6,192.88	█															
UBICACIÓN : COLONIA NIEVES, CABECERA MUNICIPAL		LIMPIA TRAZO Y NIVELACION	\$ 43,465.20	█															
TIPO DE OBRA : NUEVA		SUMINISTRO BASE HIDRAULICA	\$ 125,798.48	█															
MODALIDAD EJEC.: ADJUDICACION DIRECTA		CARPETA ASFALTICA	\$ 1,052,049.12		█														
No. CONTRATO : CTO No. 1 MVG - 20-03-2022		TOPES	\$ 7,444.80			█													
EMPRESA : IVAN FRANCISCO BELTRAN GARZA		LIMPIEZA FINAL	\$ 13,798.52				█												
MONTO CONTRATO : \$ 1,248,750.00																			
FECHA CONTRATO : 20/03/2027																			
MONTO ANTICIPO : \$ 374,625.00																			
FECHA PAGO ANTICIPO : 24-mar-23																			
No. AMPL. DE CONTRATO : N/A																			
MONTO AMPL. CONTRATO : N/A																			
FECHA AMPL. CONTRATO : N/A																			
PERIODO DE EJECUCIÓN		INICIO	TERM.																
FECHAS PROGRAMADAS :		20-mar-23	15-may-23																
FECHAS REALES :																			
FECHAS REPROGRAMADAS :																			
OBSERVACIONES																			
SUB-TOTAL																			
16% I.V.A.																			
TOTAL																			



  
 DIRECTOR OBRAS PUBLICAS  
 HUMBERTO AGUILAR DÁVILA


  
 SUPERVISOR DE OBRA  
 JORGE ADRIÁN BASTIDA GOMEZ



MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

INFORME FOTOGRÁFICO

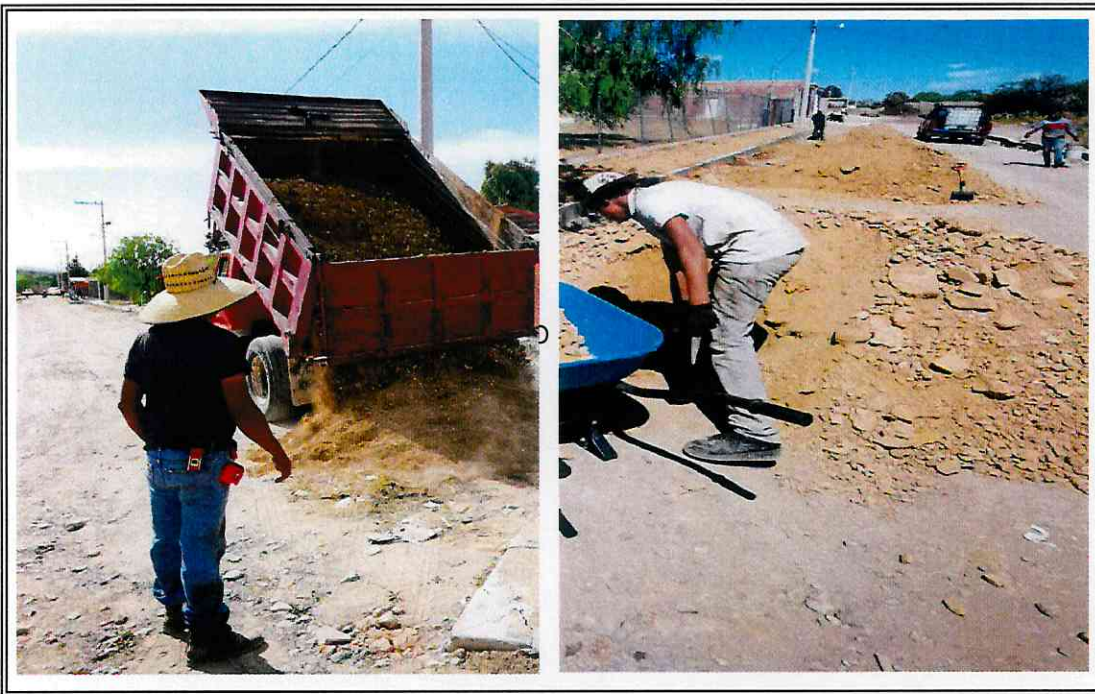

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LA LUZ, COLONIA NIEVES, VILLA GARCIA, ZACATECAS

OBRA:

LOCALIDAD:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

FECHA

PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

COLONIA LAS NIEVES, CABECERA MUNICIPAL

jueves, 13 de abril de 2023

15%

## **BITÁCORA DE OBRA.**

**NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LA LUZ, COLONIA NIEVES, VILLA GARCIA, ZACATECAS**

**Nota 1: Se da el inicio de la obra con el trazo y nivelación del terreno**

**Nota 2: Se continuan los trabajos de nivelación y el despalme con medios mecanicos, así como el acarreo de materiales fuera de la obra**

**Nota 3: Se da inicio al acarreo de materiales de relleno tepetate, para base hidráulica.**
