



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**GUTIÉRREZ ZAMORA**  
2018-2021  
¡BRILLA CON FUERZA!

¡YA ES HORA DE CREER EN TI!  
**ESPERANZA**  
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL  
Y COMBATE A LA POBREZA



## INFORME MENSUAL DE ESTADO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES

# SEPTIEMBRE 2020



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA.  
OFICIO No. P-2020/09/25-0250  
ASUNTO: REPORTE AGOSTO

**DIP. RUBEN RIOS URIBE**  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
LXV LEGISLATURA DEL ESTADO  
XALAPA, VERACRUZ.  
**P R E S E N T E.**

El que suscribe **C. Ing. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional de Gutiérrez Zamora, Veracruz**; por medio del presente me dirijo a usted para hacer de conocimiento que en cumplimiento a lo que establece el artículo 30 de la *Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*, así como *Las Reglas de Carácter General para el cumplimiento de la Presentación de Información Municipal a través de Medios Electrónicos* al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz; Remito a usted el **Estado de Obra Pública correspondiente al mes de agosto 2020**, así como el acta de cabildo donde fueron aprobados.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Gutiérrez Zamora, Ver.; a Viernes 25 de Septiembre de 2020.

**A T E N T A M E N T E**

  
**ING. WILMAN MONJE MORALES.**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE GUTIÉRREZ ZAMORA.

  
2018-2021  
PRESIDENCIA



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA.  
OFICIO No. P-2020/09/25-0251  
ASUNTO: REPORTE AGOSTO

**MTRA. DELIA GONZÁLEZ COBOS**  
AUDITOR GENERAL TITULAR DEL ORGANO  
DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO.  
**P R E S E N T E.**

El que suscribe **C. Ing. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional de Gutiérrez Zamora, Veracruz**; por medio del presente me dirijo a usted para hacer de conocimiento que en cumplimiento a lo que establece el artículo 30 de la *Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*, así como *Las Reglas de Carácter General para el cumplimiento de la Presentación de Información Municipal a través de Medios Electrónicos* al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz; Remito a usted el **Estado de Obra Pública correspondiente al mes de agosto 2020**, así como el acta de cabildo donde fueron aprobados.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Gutiérrez Zamora, Ver.; a Viernes 25 de Septiembre de 2020.  
**A T E N T A M E N T E**

  
**ING. WILMAN MONJE MORALES**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE GUTIÉRREZ ZAMORA.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021

PRESIDENCIA



ACTA NÚMERO **53** **SESIÓN ORDINARIA** DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VERACRUZ.

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO efectuada por el Honorable Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz, a las **NUEVE horas** del **QUINCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE**, de conformidad con lo que disponen los Artículos 36, Fracción I, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz-Llave.- Preside el C. Wilman Monje Morales Presidente Municipal, con quórum integrado por los ciudadanos: C. Rosa María Ortega González, Sindica Única; C. Gonzalo Quiñones López Regidor Primero, Francisco Hatzel Gómez Ochoa Regidor Tercero, Rosalía García Guerrero Regidora Cuarta. El C. Presidente Municipal, C. Wilman Monje Morales, declara abierta la Sesión, acto seguido, el secretario del H. ayuntamiento, procede a pasar lista de asistencia, declarando quórum legal. Inmediatamente da lectura al Orden del Día, misma que a la letra dice: -----

  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL

  
SINDICA  
ÚNICA

  
REGIDOR  
PRIMERO

1.- LISTA DE ASISTENCIA. -----

2.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -----

3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----

REGIDORA  
SEGUNDA

4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS **ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020**.-----

  
REGIDOR  
TERCERO

5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS **ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020**; DE LOS REPORTES DE LOS FONDOS DEL FISM DF 2020; FORTAMUN DF 2020; RECURSOS FISCALES 2020; RECURSOS FISCALES COMPLEMENTARIOS; FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2020; CAPUFE 2020. -----

  
REGIDORA  
CUARTA

6.- ASUNTOS GENERALES. -----

Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, C. WILMAN MONJE MORALES, pregunta al Cuerpo Edilicio si están de acuerdo en aprobar el Orden del Día. - ACUERDO **APROBADO POR MAYORÍA**. -----

  
SECRETARIO F  
AYUNTAMIENTO

**CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA APROBADO Y AGOTADOS LOS PUNTOS 1, 2 y 3 SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO.** -----

**4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.** -----

En uso de la voz la C. Kitzia Eunice Juárez Salazar, Tesorera Municipal, informa al cabildo los Estados Financieros del mes de septiembre de 2020, acorde a lo



establecido en el artículo 45 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre, mismos que fueron preparados por la Tesorería Municipal, en términos del artículo 72 fracción XIII de la misma Ley. En uso de la voz el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al cabildo si son de aprobarse los estados financieros correspondientes al mes de septiembre del año 2020. -----

**El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO.** - Se aprueban los Estados Financieros correspondientes al mes de septiembre del año 2020. **APROBADO POR MAYORÍA.** COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. -----

**5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020; DE LOS REPORTES DE LOS FONDOS DEL FISM DF 2020; FORTAMUN DF 2020; RECURSOS FISCALES 2020; RECURSOS FISCALES COMPLEMENTARIOS; FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2020; CAPUFE 2020.** -----

En uso de la voz el C. Rodolfo Gutiérrez Lechuga, Director de Obras Públicas; informa al cabildo los Estados de Obra Pública del mes de septiembre de 2020, acorde a lo establecido en el artículo 73 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre; y presenta los reportes en lo relativo a los FONDOS DEL FISM DF 2020; FORTAMUN DF 2020; RECURSOS FISCALES 2020; RECURSOS FISCALES COMPLEMENTARIOS; FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2020; CAPUFE 2020. Por lo que el C. Ing. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al Cabildo si son de aprobarse los estados de Obra correspondientes al mes de septiembre del año 2020. -----

**El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO.** - Se aprueban los Estados de Obra Pública correspondientes al mes de septiembre del año 2020, de los reportes de los FONDOS DEL FISM DF 2020; FORTAMUN DF 2020; RECURSOS FISCALES 2020; RECURSOS FISCALES COMPLEMENTARIOS; FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2020; CAPUFE 2020. **APROBADO POR MAYORÍA.** COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. -----

**6.- ASUNTOS GENERALES.** -----

No hubo asuntos generales. -----

Posterior a ello, el C. Ing. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal, en los términos que marca la Ley, en uso de la voz, hace del conocimiento de los miembros del cabildo que se agotaron los asuntos del orden del día de esta

  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
SÍNDICA ÚNICA

  
REGIDOR PRIMERO

REGIDORA SEGUNDA

  
REGIDOR TERCERO

  
REGIDORA CUARTA

  
SECRETARIO F. AYUNTAMIENTO



**Quincuagésima Tercera Sesión Ordinaria** del H. Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz. -----

**7.- CLAUSURA.** -----  
 Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS **NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS**, DEL DÍA **QUINCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTE**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA QUE FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS CIUDADANOS EDILES QUE EN ELLA INTERVINIERON ANTE EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, QUE AUTORIZA Y DA FE. REMÍTASE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA AL H. CONGRESO DEL ESTADO. -----

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL MUNICIPAL  
 GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
 2018-2021  
**SÍNDICA**

C. \_\_\_\_\_  
 ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ  
 SINDICA ÚNICA

C. \_\_\_\_\_  
 WILMAN MONJE MORALES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 GUTIÉRREZ ZAMORA  
 2018 - 2021  
 ¡ BRILLA CON FUERZA !  
**REGIDURIA PRIMERA**

C. \_\_\_\_\_  
 GONZALO QUIÑONES LÓPEZ  
 REGIDOR PRIMERO

Ausencia temporal por acuerdo de cabildo tomado el  
 17/08/20 en acta No. 42 extraordinaria a solicitud escrita;  
 con fundamento en el Art. 24 de Ley Orgánica del  
 Municipio Libre para el Estado de Veracruz.

C. \_\_\_\_\_  
 SILVIANA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ  
 REGIDORA SEGUNDA

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 GUTIÉRREZ ZAMORA  
 2018 - 2021  
 ¡ BRILLA CON FUERZA !  
**REGIDURIA TERCERA**

C. \_\_\_\_\_  
 FRANCISCO HATZEL GÓMEZ  
 REGIDOR TERCERO

C. \_\_\_\_\_  
 ROSALÍA GARCÍA  
 REGIDORA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
 2018 - 2021  
**REGIDURIA CUARTA**

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL MUNICIPAL  
 GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
 2018-2021  
**SECRETARÍA**  
 JORGE CHENA BATRES  
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/62096

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690002	REHABILITACIÓN DE PLAZA, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ESTACIONAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA "BENITO JUAREZ", INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE PARADOR DE TRANSPORTE PÚBLICO	No	No	No	No
2020300690003	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EL MORRO-ENTRONQUE CAMINO ANCLON Y ARENAL DEL KM 0+000 AL 3+925	No	No	No	No
2020300690004	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: EL MANGO – CARRETERA FEDERAL 180, DEL KM 0+000 AL 2+000	No	No	No	No
2020300690005	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS DE PAGUAS DE CORONADO A PARCELAS TRAMO DEL KM 0+000 AL 2+500	Sí	No	Sí	No

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/62096



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/61788

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690101	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS LOMAS CHICAS LA VEGA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS CHICAS	No	No	No	No
2020300690102	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS LOMAS CHICAS - EL RÍO	Sí	No	Sí	No
2020300690103	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS ANCLON ARENAL - AL RÍO	Sí	No	Sí	No
2020300690104	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS CACAHUATAL EL RÍO EN LA LOCALIDAD CACAHUATAL	No	No	No	No
2020300690108	MANTENIMIENTO DE ESCUELA PREPARATORIA, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN AULAS "ENRIQUE C. REBSAMEN", CLAVE: 30SBC2127H, COL. RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA	No	No	No	No
2020300690110	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES BELEN ARBONA ENTRE CALLES ACCESO Y PROF. MARCIANO CAMARILLO ALARCON, CALLE DR. ALFONSO ARMESTO GARCES ENTRE CALLES BELEN ARBONA HDZ. Y HÉROES DE LA BATALLA DEL 26 DE MARZO, EN LA COLONIA CUAUHTLAN	No	No	No	No
2020300690111	AMPLIACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE COAHUILA ENTRE CALLES OAXACA Y CHIAPAS, EN COLONIA AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO Y FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS	No	No	No	No
2020300690115	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DR. ALFONSO ARMESTO GARCES ENTRE CALLE BELEN ARBONA HERNÁNDEZ Y CALLE HÉROES DE LA BATALLA DEL 26 DE MARZO , COLONIA CUAUHTLAN	No	No	No	No



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021  
**OBRAS  
PÚBLICAS**

Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/61788

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690116	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SECCIÓN DE CALLES: NOGAL ENTRE EUCALIPTO Y PALMAS, PINO ENTRE EUCALIPTO Y ROBLE, PRIVADA NOGAL ENTRE CALLES CAOBA Y EUCALIPTO, CALLE CAOBA ENTRE PRIVADA NOGAL Y JACARANDAS, EN LA COLONIA ANCLON Y ARENAL	No	No	No	No
2020300690117	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RURAL TRAMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA - ENTRONQUE EJIDO MARIO HERNÁNDEZ POSADAS DEL KM 0+300 AL 0 + 883.	Sí	Sí	Sí	No
2020300690118	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RURAL ENTRONQUE EJIDO MARIO HERNÁNDEZ POSADAS A ENTRONQUE PAGUAS DE ARROYO GRANDE DEL KM 0+884 AL 0 + 1+410	Sí	Sí	Sí	No
2020300690119	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RURAL LOMAS CHICAS VALÉNZUELA DEL KM 0+300 AL 0 + 855	No	No	No	No
2020300690121	REHABILITACIÓN DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y SACRIFICIOS, COLONIA CENTRO	No	No	No	No
2020300690122	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE CALLE DE LA RIBERA Y GUTIERREZ ZAMORA, COLONIA CENTRO	No	No	No	No
2020300690123	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE SACRIFICIOS Y CALLE MINA, CERRO DE LA CRUZ	No	No	No	No
2020300690124	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLEJÓN DE LA CRUZ ENTRE CALLES 2 DE ABRIL Y CALLE SACRIFICIOS	No	No	No	No

SELLO DIGITAL:

NMJGiVzxCGVpgG1H80GmKL2ScdrjRzTlzc5JIUTjhCTM8VsPDOugxy6NsN6zjUCLfphWmgFly5SXomH0/AmY2GV/N95MVH0Hp+eX2Snu/mr0iJ4bDd5f4B2IH0TadBiuUN1t1CL4dkqil/cRUbaKyB3yZHgXmT5PQ0CJcb760E=

Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/61788

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690125	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CUITLAHUAC ESQUINA CON VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA CUAHUTEMOC	No	No	No	No
2020300690127	REHABILITACIÓN DE CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE LA RIVERA Y CERRO DE LA BANDERA	No	No	No	No
2020300690128	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COLONIA LOS ÁNGELES, MODELO Y SALIDA A EL GIRASOL-LOMA LINDA	Sí	Sí	Sí	No
2020300690129	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO Y 12 DE DICIEMBRE COLONIA PRIMERO DE MAYO Y FIDEL HERRERA BELTRAN	No	No	No	No



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021  
OBRAS  
PÚBLICAS



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/61790

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690216	REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA	No	No	No	No
2020300690217	MEJORAMIENTO DE GUARNICIONES APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA EN CALLES DE LA CABECERA	Sí	Sí	Sí	No
2020300690218	MEJORAMIENTO DE CENTROS CULTURALES Y/O ARTÍSTICO "CASA DE LA CULTURA GUTIERREZ ZAMORA"	No	No	No	No

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/61790



N. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021  
OBRAS  
PÚBLICAS

Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/61791

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690460	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN EL CAMINO RURAL PASO DE BARRILES – EL CEPILLO KM 0+125 AL 0+633	No	No	No	No
2020300690461	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA HIDALGO E IGNACIO ALLENDE DEL KM 0+460 AL 0+852.	No	No	No	No
2020300690462	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CAMINO RURAL BARRILES – CORONADO KM 0+370 AL 0+770	No	No	No	No
2020300690463	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CAMINO RURAL EL CEPILLO – BARRILES KM 0+583 AL 1+074	No	No	No	No
2020300690464	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CAMINO RURAL LOMAS CHICAS – CORONADO KM 0+928 AL 1+436	No	No	No	No

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/61791





# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

<b>Municipio:</b>	GUTIÉRREZ ZAMORA	<b>Localidad:</b>	PAGUAS DE CORONADO	<b>Ejercicio fiscal:</b>	EJERCICIO 2020
<b>No. de obra:</b>	2020300690005	<b>Periodo:</b>	SEPTIEMBRE	<b>Número de estimación:</b>	1.00
<b>Descripción:</b>	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS DE PAGUAS DE CORONADO A PARCELAS TRAMO DEL KM 0+000 AL 2+500			<b>Fuente de financiamiento:</b>	RECURSOS FISCALES COMPLEME
				<b>Fecha de revisión:</b>	22/10/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

### Observaciones:

Empty box for observations.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2016 - 2027  
**OBRAS  
PÚBLICAS**

  
LUIS JAVIER ORÓSTICO LÓPEZ  
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO  
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

<b>Municipio:</b>	GUTIÉRREZ ZAMORA	<b>Localidad:</b>	PAGUAS DE CORONADO	<b>Ejercicio fiscal:</b>	EJERCICIO 2020
<b>No. de obra:</b>	2020300690005	<b>Periodo:</b>	SEPTIEMBRE	<b>Número de estimación:</b>	1.00
<b>Descripción:</b>	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS DE PAGUAS DE CORONADO A PARCELAS TRAMO DEL KM 0+000 AL 2+500			<b>Fuente de financiamiento:</b>	RECURSOS FISCALES COMPLEME
				<b>Fecha de revisión:</b>	22/10/2020



FOTO

Concepto de obra  
ejecutado:



FOTO

Concepto de  
obra ejecutado:

### Observaciones:



  
**LUIS JAVIER ORÓSTICO LÓPEZ**  
**Supervisor de obra Responsable**

INGENIERO  
**Profesión del Supervisor**

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

<b>Municipio:</b> GUTIÉRREZ ZAMORA	<b>Localidad:</b> LOMAS CHICAS	<b>Ejercicio fiscal:</b> EJERCICIO 2020
<b>No. de obra:</b> 2020300690102	<b>Periodo:</b> SEPTIEMBRE	<b>Número de estimación:</b> 1.00
<b>Descripción:</b> REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS LOMAS CHICAS - EL RÍO		<b>Fuente de financiamiento:</b> FONDO DE APORTACIONES PARA
		<b>Fecha de revisión:</b> 16/10/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

**Observaciones:**



NORBERTO JUAREZ MEJIA  
**Supervisor de obra Responsable**

INGENIERO  
**Profesión del Supervisor**

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

<b>Municipio:</b> GUTIÉRREZ ZAMORA	<b>Localidad:</b> ANCLÓN Y ARENAL	<b>Ejercicio fiscal:</b> EJERCICIO 2020
<b>No. de obra:</b> 2020300690103	<b>Periodo:</b> SEPTIEMBRE	<b>Número de estimación:</b> 1.00
<b>Descripción:</b> REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS ANCLON ARENAL - AL RÍO		<b>Fuente de financiamiento:</b> FONDO DE APORTACIONES PARA
		<b>Fecha de revisión:</b> 16/10/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

**Observaciones:**

---



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021  
**OBRAS  
PÚBLICAS**

FRANCISCO GUILLERMO MEDINA BENAVIDES  
**Supervisor de obra Responsable**

INGENIERO  
**Profesión del Supervisor**

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

<b>Municipio:</b>	GUTIÉRREZ ZAMORA	<b>Localidad:</b>	INGENIERO MARIO HERNÁNDEZ F	<b>Ejercicio fiscal:</b>	EJERCICIO 2020
<b>No. de obra:</b>	2020300690117	<b>Periodo:</b>	SEPTIEMBRE	<b>Número de estimación:</b>	3.00
<b>Descripción:</b>	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RURAL TRAMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA - ENTRONQUE EJIDO MARIO HERNÁNDEZ			<b>Fuente de financiamiento:</b>	FONDO DE APORTACIONES PARA
				<b>Fecha de revisión:</b>	16/10/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

### Observaciones:



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021  
OBRAS  
PUBLICAS

ALFREDO MORENO NERI  
**Supervisor de obra Responsable**

INGENIERO

**Profesión del Supervisor**

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

### DATOS GENERALES

<b>Municipio:</b>	GUTIÉRREZ ZAMORA	<b>Localidad:</b>	GENIERO MARIO HERNÁNDEZ	<b>Ejercicio fiscal:</b>	EJERCICIO 2020
<b>No. de obra:</b>	2020300690117	<b>Periodo:</b>	SEPTIEMBRE	<b>Número de estimación:</b>	3.00
<b>Descripción:</b>	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RURAL			<b>Fuente de Financiamiento:</b>	FONDO DE APORTACIONES PARA I
				<b>Fecha de revisión:</b>	16/10/2020



Concepto de obra ejecutado:



Concepto de obra ejecutado:

### Observaciones:

Empty box for observations.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021  
OBRAS  
PUBLICAS

ALFREDO MORENO NERI

**Supervisor de Obra Responsable**

INGENIERO

**Profesión**

- c.c.p.
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

<b>Municipio:</b>	GUTIÉRREZ ZAMORA	<b>Localidad:</b>	PAGUAS DE ARROYO GRANDE	<b>Ejercicio fiscal:</b>	EJERCICIO 2020
<b>No. de obra:</b>	2020300690118	<b>Periodo:</b>	SEPTIEMBRE	<b>Número de estimación:</b>	2.00
<b>Descripción:</b>	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RURAL ENTRONQUE EJIDO MARIO HERNÁNDEZ POSADAS A ENTRONQUE PAGUAS DE ARROYO			<b>Fuente de financiamiento:</b>	FONDO DE APORTACIONES PARA
				<b>Fecha de revisión:</b>	16/10/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

### Observaciones:

Empty box for observations.



NORBERTO JUÁREZ MEJÍA  
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO  
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.


## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

### DATOS GENERALES

<b>Municipio:</b>	GUTIÉRREZ ZAMORA	<b>Localidad:</b>	PAGUAS DE ARROYO GRANDE	<b>Ejercicio fiscal:</b>	EJERCICIO 2020
<b>No. de obra:</b>	2020300690118	<b>Periodo:</b>	SEPTIEMBRE	<b>Número de estimación:</b>	2.00
<b>Descripción:</b>	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RURAL			<b>Fuente de Financiamiento:</b>	FONDO DE APORTACIONES PARA I
				<b>Fecha de revisión:</b>	16/10/2020



Concepto de obra ejecutado:

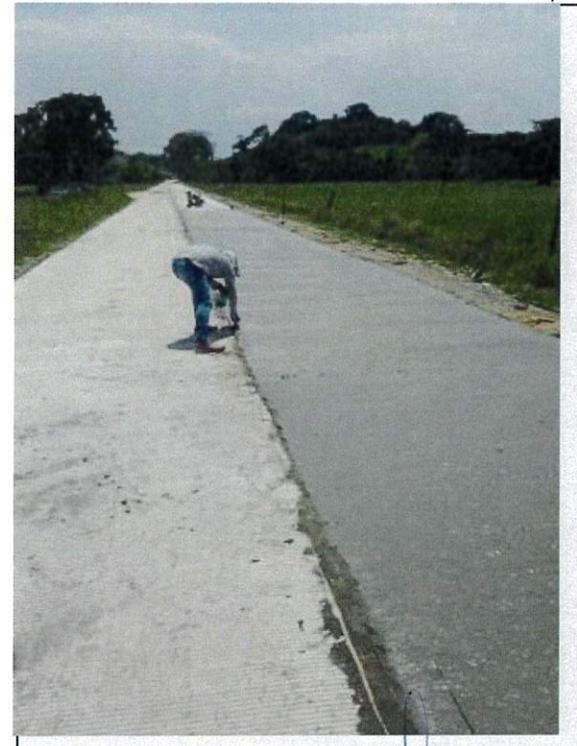

Concepto de obra ejecutado:

### Observaciones:

Empty box for observations.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021  
**OBRAS  
PUBLICAS**

NORBERTO JUAREZ MEJIA

**Supervisor de Obra Responsable**

INGENIERO

**Profesión**

- c.c.p.
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis

**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.****REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)****DATOS GENERALES**

<b>Municipio:</b>	GUTIÉRREZ ZAMORA	<b>Localidad:</b>	GUTIÉRREZ ZAMORA	<b>Ejercicio fiscal:</b>	EJERCICIO 2020
<b>No. de obra:</b>	2020300690128	<b>Periodo:</b>	SEPTIEMBRE	<b>Número de estimación:</b>	2.00
<b>Descripción:</b>	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COLONIA LOS ÁNGELES, MODELO Y SALIDA A EL GIRASOL-LOMA LINDA			<b>Fuente de financiamiento:</b>	FONDO DE APORTACIONES PARA
				<b>Fecha de revisión:</b>	16/10/2020

**FOTO**Concepto de obra  
ejecutado:**FOTO**Concepto de  
obra ejecutado:**Observaciones:**

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021  
**OBRAS  
PÚBLICAS**

**NORBERTO JUAREZ MEJIA**  
**Supervisor de obra Responsable**

INGENIERO  
**Profesión del Supervisor**

c.c.p. Presidente Municipal  
c.c.p. Contralor Interno  
c.c.p. Tesorero Municipal  
c.c.p. Director de Obras Públicas  
c.c.p. Orfis



# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.


## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

### DATOS GENERALES

<b>Municipio:</b> GUTIÉRREZ ZAMORA	<b>Localidad:</b> GUTIÉRREZ ZAMORA	<b>Ejercicio fiscal:</b> EJERCICIO 2020
<b>No. de obra:</b> 2020300690128	<b>Periodo:</b> SEPTIEMBRE	<b>Número de estimación:</b> 2.00
<b>Descripción:</b> AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COLONIA LOS ÁNGELES, MODELO Y SALIDA A EL		<b>Fuente de Financiamiento:</b> FONDO DE APORTACIONES PARA
		<b>Fecha de revisión:</b> 16/10/2020



Concepto de obra ejecutado:

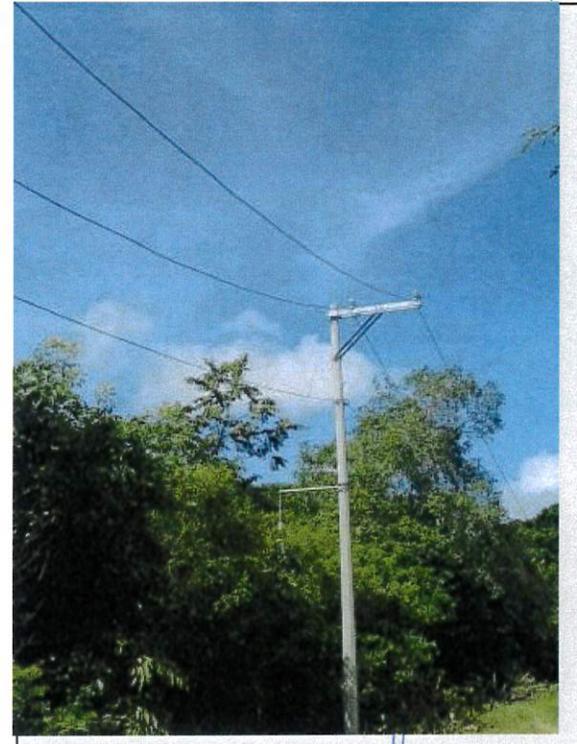

Concepto de obra ejecutado:

### Observaciones:

Empty box for observations.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021  
**OBRAS  
PÚBLICAS**

NORBERTO JUAREZ MEJIA

**Supervisor de Obra Responsable**

INGENIERO

**Profesión**

- c.c.p.
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



### H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

### REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

#### DATOS GENERALES

**Municipio:** GUTIÉRREZ ZAMORA      **Localidad:** GUTIÉRREZ ZAMORA      **Ejercicio fiscal:** EJERCICIO 2020  
**No. de obra:** 2020300690217      **Periodo:** SEPTIEMBRE      **Número de estimación:** 1.00  
**Descripción:** MEJORAMIENTO DE GUARNICIONES APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA EN CALLES DE      **Fuente de Financiamiento:** FONDO DE APORTACIONES PARA E  
**Fecha de revisión:** 19/10/2020



Concepto de obra ejecutado:



Concepto de obra ejecutado:

#### Observaciones:



LUIS JAVIER ORÓSTICO LÓPEZ

**Supervisor de Obra Responsable**  
INGENIERO

**Profesión**

- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



### H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

### REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

#### DATOS GENERALES

<b>Municipio:</b>	GUTIÉRREZ ZAMORA	<b>Localidad:</b>	GUTIÉRREZ ZAMORA	<b>Ejercicio fiscal:</b>	EJERCICIO 2020
<b>No. de obra:</b>	2020300690217	<b>Periodo:</b>	SEPTIEMBRE	<b>Número de estimación:</b>	1.00
<b>Descripción:</b>	MEJORAMIENTO DE GUARNICIONES APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL			<b>Fuente de financiamiento:</b>	FONDO DE APORTACIONES PARA
				<b>Fecha de revisión:</b>	19/10/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

#### Observaciones:

Empty box for observations.

**LUIS JAVIER ORÓSTICO LÓPEZ**  
**Supervisor de obra Responsable**

INGENIERO  
**Profesión del Supervisor**

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis





**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2020

<b>FECHA DE ELABORACION:</b> 22/10/2020
<b>MES QUE SE REPORTA</b> SEPTIEMBRE

**A) PLANEACION Y DATOS GENERALES**

<b>MUNICIPIO:</b> GUTIERREZ ZAMORA	<b>LOCALIDAD:</b> PAGUAS DE CORONADO	<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:</b> REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE PAGUAS DE CORONADO A PARCELAS TRAMO DEL KM +000 AL 2+500
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> RECURSOS FISCALES COMPL	<b>No. DE OBRA:</b> 2020300690005	

**ANTECEDENTES:**

<b>CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:</b>	SI	X	NO
<b>OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:</b>			
<b>TIPO DE ZONA:</b>	RURAL	CLAVE	N/A
	URBANA	AGEB:	
<b>SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:</b>	SI	NO	X
<b>SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO</b>	SI	X	NO
<b>GRADO DE REZAGO SOCIAL:</b>	MUY ALTO	ALTO	MEDIO
		X	BAJO
			MUY BAJO
<b>TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:</b>	DIRECTA	X	COMPLEMENTARIA
			RESTRINGIDA
<b>COORDENADAS DE GEORREFERENCIA</b>			
<b>LATITUD</b>	20.388008000	<b>LONGITUD</b>	-97.149700000

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:**  
SOMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA, EXTRACCION DE MATERIAL TIPO II (GRAVA DE RIO) PARA REVESTIMIENTO, ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO, OPERACIÓN DE COMPACTACIÓN DE CARA

**DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:**  
SOMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA, EXTRACCION DE MATERIAL TIPO II (GRAVA DE RIO) PARA REVESTIMIENTO, ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO, OPERACIÓN DE COMPACTACIÓN DE CARA

**C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA\***

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACION	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
UNO	\$419,844.55	2	\$419,844.55	ECIBO 18 -0	\$846,990.75	\$423,495.38	\$3,650.82	\$0.00	\$419,844.55
ANTICIPO	\$423,495.38	1	\$423,495.38	13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,495.38
TOTALES	\$843,339.93		\$843,339.93		\$846,990.75	\$423,495.38	\$3,650.82	\$0.00	\$843,339.93



<b>MONTO AUTORIZADO:</b>	\$846,990.75	C/IVA		
<b>MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:</b>	\$846,990.75	C/IVA		
<b>VALIDACIÓN DEL PROYECTO:</b>	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
<b>DEPENDENCIA QUE VALIDA:</b>				
<b>FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:</b>	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
<b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:</b>				
<b>PERMISOS Y CONCESIONES:</b>	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
<b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:</b>				
<b>TIPO DE LICITACIÓN:</b>	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	EXISTE		X

<b>NO. DE CONTRATO:</b>	MGZ-RF2020/0005/OP-005	<b>FECHA:</b>	15/09/2020
<b>CONTRATISTA:</b>	MARIA ISABEL LEAL TOMAS		
<b>RFC:</b>	LET1951227LA9		
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$846,990.75	C/IVA	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO</b>	PROGRAMADA	REAL
		15/09/2020	16/09/2020
	<b>TÉRMINO</b>	30/09/2020	30/09/2020
	<b>DÍAS</b>	15	15
<b>ANTICIPO:</b>	<b>APLICA</b>	X	NO APLICA
	<b>MONTO:</b>	\$423,495.38	<b>PORCENTAJE:</b> 50.00
	<b>FECHA DE PAGO:</b>	16/09/2020	

**B) REPORTE**

	EXISTE	FECHAS
<b>MONTO PAGADO EN EL MES:</b>	\$846,990.75	21/09/2020
<b>MONTO PAGADO ACUMULADO:</b>	\$846,990.75	21/09/2020
<b>FINIQUITO CON IVA:</b>	\$0.00	
<b>ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:</b>		

**AVANCE FÍSICO REAL**

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**OBSERVACIONES:**

<b>TIPO DE FIANZA:</b>	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
<b>MONTO AFIANZADO:</b>	\$423,495.38	\$73,016.44	\$84,699.08
<b>AFIANZADORA:</b>	RTA, S.A DE C.V., GRUPO RTA, S.A DE C.V., GRUPO RTA, S.A DE C.V., GRUPO		
<b>No. DE FIANZA:</b>	3900-03198-0	3900-03199-2	3900-03209-03
<b>FECHA:</b>	15/09/2020	15/09/2020	21/09/2020
<b>CONVENIO MODIFICATORIO:</b>	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO		INICIAL
			FINAL
	NO APLICA		
<b>MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:</b>	\$846,990.75	C/IVA	

Ing. Rodolfo Gutiérrez Lechuga  
DIRECTOR DE OBRAS

LUIS JAVIER ORÓSTICO LÓPEZ  
SUPERVISOR

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2020

<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> 22/10/2020
<b>MES QUE SE REPORTA</b> SEPTIEMBRE

**A) PLANEACION Y DATOS GENERALES**

<b>MUNICIPIO:</b> GUTIERREZ ZAMORA	<b>LOCALIDAD:</b> PAGUAS DE CORONADO	<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:</b> REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE PAGUAS DE CORONADO A PARCELAS TRAMO DEL KM 0+000 AL 2+500
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> RECURSOS FISCALES COMPL	<b>No. DE OBRA:</b> 2020300690005	

<b>ANTECEDENTES:</b>	
<b>CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:</b> SI X NO	
<b>GRADO DE REZAGO SOCIAL:</b>	
<b>TIPO DE ZONA:</b> RURAL URBANA	<b>CLAVE AGE:</b> N/A
<b>SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:</b> SI X NO	<b>TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:</b> DIRECTA X COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA
<b>COORDENADAS DE GEORREFERENCIA</b>	
<b>LATITUD</b> 20.388008000	<b>LONGITUD</b> -97.149700000

<b>DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:</b> SOMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA, EXTRACCION DE MATERIAL TIPO II (GRAVA DE RIO) PARA REVESTIMIENTO, ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO OPERACIÓN DE COMPACTACIÓN DE CARA
---

<b>DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:</b> SOMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA, EXTRACCION DE MATERIAL TIPO II (GRAVA DE RIO) PARA REVESTIMIENTO, ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO OPERACIÓN DE COMPACTACIÓN DE CARA
---

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACION	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
UNO	\$419,844.55	2	\$419,844.55	ECIBO 18-0	\$846,990.75	\$423,495.38	\$3,650.82	\$0.00	\$419,844.55
ANTICIPO	\$423,495.38	1	\$423,495.38	13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,495.38
TOTALES	\$843,339.93		\$843,339.93		\$846,990.75	\$423,495.38	\$3,650.82	\$0.00	\$843,339.93



<b>MONTO AUTORIZADO:</b>	\$846,990.75	C/IVA		
<b>MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:</b>	\$846,990.75	C/IVA		
<b>VALIDACIÓN DEL PROYECTO:</b>	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
<b>DEPENDENCIA QUE VALIDA:</b>				
<b>FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:</b>	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
<b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:</b>				
<b>PERMISOS Y CONCESIONES:</b>	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
<b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:</b>				
<b>TIPO DE LICITACIÓN:</b>	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	EXISTE	X
	licitación pública			

<b>NO. DE CONTRATO:</b>	MGZ-RF2020/0005/OP-005	<b>FECHA:</b>	15/09/2020
<b>CONTRATISTA:</b>	MARIA ISABEL LEAL TOMAS		
<b>RFC:</b>	LET1951227LA9		
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$846,990.75	C/IVA	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO 15/09/2020	16/09/2020	
	TÉRMINO 30/09/2020	30/09/2020	
	DÍAS 15	15	
<b>ANTICIPO:</b>	APLICA X	NO APLICA	
	MONTO: \$423,495.38	PORCENTAJE: 50.00	
	FECHA DE PAGO:	16/09/2020	

B) REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
<b>MONTO PAGADO EN EL MES:</b>	\$846,990.75	21/09/2020
<b>MONTO PAGADO ACUMULADO:</b>	\$846,990.75	21/09/2020
<b>FINIQUITO CON IVA:</b>	\$0.00	
<b>ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:</b>		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>OBSERVACIONES:</b>

<b>TIPO DE FIANZA:</b>	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
<b>MONTO AFIANZADO:</b>	\$423,495.38	\$73,016.44	\$84,699.08
<b>AFIANZADORA:</b>	RTA, S.A DE C.V., GRUPO RTA, S.A DE C.V., GRUPO RTA, S.A DE C.V., GRUPO		
<b>No. DE FIANZA:</b>	3900-03198-0	3900-03199-2	3900-03209-03
<b>FECHA:</b>	15/09/2020	15/09/2020	21/09/2020
<b>CONVENIO MODIFICATORIO:</b>	MONTO EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA		
<b>MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:</b>	\$846,990.75	C/IVA	

Ing. Rodolfo Gutiérrez Lechuga  
DIRECTOR DE OBRAS

LUIS JAVIER OROSTICO LÓPEZ  
SUPERVISOR

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2020

<b>FECHA DE ELABORACION:</b> 16/10/2020
<b>MES QUE SE REPORTA</b> SEPTIEMBRE

**A) PLANEACION Y DATOS GENERALES**

<b>MUNICIPIO:</b> GUTIERREZ ZAMORA	<b>LOCALIDAD:</b> LOMAS CHICAS	<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:</b> REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS LOMAS CHICAS - EL RÍO
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> FONDO DE APORTACIONES	<b>No. DE OBRA:</b> 2020300690102	


<b>ANTECEDENTES:</b>	
<b>CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:</b> SI <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
<b>GRADO DE REZAGO SOCIAL:</b>	
<b>TIPO DE ZONA:</b> RURAL <input checked="" type="checkbox"/> URBANA <input type="checkbox"/>	<b>CLAVE AGE:</b> N/A
<b>SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:</b> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<b>TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:</b> DIRECTA <input checked="" type="checkbox"/> COMPLEMENTARIA <input type="checkbox"/> RESTRINGIDA <input type="checkbox"/>
<b>COORDENADAS DE GEORREFERENCIA</b>	
<b>LATITUD:</b> 20.414326000	<b>LONGITUD:</b> -97.146203000

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:**  
SOMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA, EXTRACCION DE MATERIAL TIPO II (GRAVA DE RIO) PARA REVESTIMIENTO, ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO OPERACION DE TENDIDO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO OPERACION DE COMPACTACION DE CARA DE MATERIAL

**DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:**  
SOMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA, EXTRACCION DE MATERIAL TIPO II (GRAVA DE RIO) PARA REVESTIMIENTO, ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO OPERACION DE TENDIDO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO OPERACION DE COMPACTACION DE CARA DE MATERIAL

**C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA\***

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					IMPORTE NETO
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACION	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	
FINIQUITO	\$1,103,874.01	1	\$1,103,874.01	ZAM006	\$1,108,652.69	\$0.00	\$4,778.67	\$0.00	\$1,103,874.01
TOTALES	\$1,103,874.01		\$1,103,874.01		\$1,108,652.69	\$0.00	\$4,778.67	\$0.00	\$1,103,874.01



<b>MONTO AUTORIZADO:</b>	\$1,108,652.69	C/IVA
<b>MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:</b>	\$1,108,652.69	C/IVA
<b>VALIDACION DEL PROYECTO:</b>	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/>	X
<b>DEPENDENCIA QUE VALIDA:</b>		
<b>FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:</b>	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/>	X
<b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:</b>		
<b>PERMISOS Y CONCESIONES:</b>	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/>	X
<b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:</b>		EXISTE <input type="checkbox"/>
<b>TIPO DE LICITACION:</b>	ADJUDICACION DIRECTA <input type="checkbox"/> INVITACION A MENOS 3 PERSONAS <input type="checkbox"/> LICITACION PUBLICA <input checked="" type="checkbox"/>	

<b>NO. DE CONTRATO:</b>	MGZ-FISM2020/0102/OP-007	<b>FECHA:</b>	06/03/2020
<b>CONTRATISTA:</b>	CLAUDIA GRISELDA MORALES CALDERON		
<b>RFC:</b>	MOCC790904T35		
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$1,108,652.69	C/IVA	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b>	PROGRAMADA	REAL
	<b>TÉRMINO:</b>	02/03/2020	09/03/2020
	<b>DÍAS:</b>	30/04/2020	07/04/2020
<b>ANTICIPO:</b>	<b>APLICA:</b>	59	30
	<b>MONTO:</b>	NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	X
	<b>FECHA DE PAGO:</b>		PORCENTAJE:

**B) REPORTE**

<b>MONTO PAGADO EN EL MES:</b>	EXISTE \$1,108,652.69	FECHAS 07/04/2020
<b>MONTO PAGADO ACUMULADO:</b>	EXISTE \$1,108,652.69	FECHAS 07/04/2020
<b>FINIQUITO CON IVA:</b>	\$0.00	
<b>ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:</b>		

**AVANCE FÍSICO REAL**

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	80	100	100	100	100	100	100	0	0	0
REAL	0	0	80	100	100	100	100	100	100	0	0	0
ACUMULADO	0	0	80	100	100	100	100	100	100	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**OBSERVACIONES:**

<b>TIPO DE FIANZA:</b>	ANTICIPO	<b>CUMPLIMIENTO:</b>	\$95,573.51	<b>VICIOS OCULTOS:</b>	\$110,865.27
<b>MONTO AFIANZADO:</b>					
<b>AFIANZADORA:</b>	RTA, S.A DE C.V., GRUPO RTA, S.A DE C.V., GRUPO				
<b>No. DE FIANZA:</b>	3900-03044-9	<b>FECHA:</b>	06/03/2020		
<b>CONVENIO MODIFICATORIO:</b>	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA	
	PLAZO		INICIAL	FINAL	
	NO APLICA				
<b>MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:</b>			\$1,108,652.69		C/IVA

Ing. Rodolfo Gutiérrez Lechuga  
DIRECTOR DE OBRAS

NORBERTO JUÁREZ MEJÍA  
SUPERVISOR

FORMATO 11

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2020

<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> 16/10/2020
<b>MES QUE SE REPORTA</b> SEPTIEMBRE

**A) PLANEACION Y DATOS GENERALES**

<b>MUNICIPIO:</b> GUTIERREZ ZAMORA	<b>LOCALIDAD:</b> ANCLÓN Y ARENAL	<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:</b> REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS ANCLON ARENAL - AL RÍO
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> FONDO DE APORTACIONES	<b>No. DE OBRA:</b> 2020300690103	


<b>CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:</b>		<b>SI</b>	<b>X</b>	<b>NO</b>
<b>OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:</b>				
<b>TIPO DE ZONA:</b>	RURAL <b>X</b> URBANA	<b>CLAVE AGE:</b>	N/A	
<b>SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>X</b>
<b>SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO</b>		<b>SI</b>	<b>X</b>	<b>NO</b>
<b>GRADO DE REZAGO SOCIAL:</b>				
	MUY ALTO	ALTO	MEDIO <b>X</b>	BAJO
				MUY BAJO
<b>TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:</b>				
	DIRECTA	<b>X</b>	COMPLEMENTARIA	RESTRINGIDA
<b>COORDENADAS DE GEORREFERENCIA</b>				
<b>LATITUD</b>	20.434669000	<b>LONGITUD</b>	-97.115160000	

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:**  
SUNISTRIBUTO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA, EXTRACCION DE MATERIAL TIPO II (GRAVA DE RIO) PARA REVESTIMIENTO, ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO OPERACIÓN DE COMPACTACIÓN DE CARA DE MATERIAL

**DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:**  
SUNISTRIBUTO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA, EXTRACCION DE MATERIAL TIPO II (GRAVA DE RIO) PARA REVESTIMIENTO, ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO OPERACIÓN DE COMPACTACIÓN DE CARA DE MATERIAL

**C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA\***

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
FINIQUITO	\$553,709.94	1	\$553,709.94	103	\$556,106.95	\$0.00	\$2,397.01	\$0.00	\$553,709.94
TOTALES	\$553,709.94		\$553,709.94		\$556,106.95	\$0.00	\$2,397.01	\$0.00	\$553,709.94



<b>MONTO AUTORIZADO:</b>	\$556,106.95	C/IVA		
<b>MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:</b>	\$556,106.95	C/IVA		
<b>VALIDACIÓN DEL PROYECTO:</b>	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
<b>DEPENDENCIA QUE VALIDA:</b>				
<b>FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:</b>	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
<b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:</b>				
<b>PERMISOS Y CONCESIONES:</b>	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
<b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:</b>				
<b>TIPO DE LICITACIÓN:</b>	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA			EXISTE X

<b>NO. DE CONTRATO:</b>	MGZ-FISM2020/0103/OP-008	<b>FECHA:</b>	06/03/2020
<b>CONTRATISTA:</b>	ERENDIRA YULIANI PEREZ LUNA		
<b>RFC:</b>	PELE720728616		
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$556,106.95	C/IVA	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO</b>	PROGRAMADA	REAL
	02/03/2020	09/03/2020	07/04/2020
	<b>TÉRMINO</b>	30/04/2020	07/04/2020
	<b>DÍAS</b>	59	30
<b>ANTICIPO:</b>	<b>APLICA</b>	NO APLICA	X
	<b>MONTO:</b>		PORCENTAJE:
	<b>FECHA DE PAGO:</b>		

**B) REPORTE**

	<b>EXISTE</b>	<b>FECHAS</b>
<b>MONTO PAGADO EN EL MES:</b>	\$556,106.95	07/04/2020
<b>MONTO PAGADO ACUMULADO:</b>	\$556,106.95	07/04/2020
<b>FINIQUITO CON IVA:</b>	\$0.00	
<b>ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:</b>		

**AVANCE FÍSICO REAL**

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	80	100	100	100	100	100	100	0	0	0
REAL	0	0	80	100	100	100	100	100	100	0	0	0
ACUMULADO	0	0	80	100	100	100	100	100	100	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**OBSERVACIONES:**

<b>TIPO DE FIANZA:</b>	ANTICIPO	<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>VICIOS OCULTOS</b>	
<b>MONTO AFIANZADO:</b>		\$47,940.25	\$55,610.70	
<b>AFIANZADORA:</b>		RTA, S.A DE C.V., GRUPO RTA, S.A DE C.V., GRUPO		
<b>No. DE FIANZA:</b>		3900-03045-0	3900-03096-0	
<b>FECHA:</b>		06/03/2020	08/04/2020	
<b>CONVENIO MODIFICATORIO:</b>	<b>MONTO</b>	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	
	<b>PLAZO</b>		INICIAL	FINAL
	<b>NO APLICA</b>			
<b>MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:</b>		\$556,106.95	C/IVA	

Ing. Rodolfo Gutiérrez Lechuga  
DIRECTOR DE OBRAS

JUAN FRANCISCO GUILLERMO MEDINA BENAVIDE  
SUPERVISOR

FORMATO 11

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2020

<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> 16/10/2020
<b>MES QUE SE REPORTA</b> SEPTIEMBRE

**A) PLANEACION Y DATOS GENERALES**

<b>MUNICIPIO:</b> GUTIERREZ ZAMORA	<b>LOCALIDAD:</b> EJIDO INGENIERO MARIO HERNÁNDEZ POSADAS	<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:</b> CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO RURAL TRAMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA - ENTRONQUE EJIDO MARIO HERNÁNDEZ POSADAS
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> FONDO DE APORTACIONES	<b>No. DE OBRA:</b> 2020300690117	

<b>ANTECEDENTES:</b>	
<b>CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:</b> SI X NO	
<b>GRADO DE REZAGO SOCIAL:</b>	
<b>TIPO DE ZONA:</b> RURAL X URBANA	<b>CLAVE AGE:</b> N/A
<b>SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:</b> SI X NO	<b>TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:</b> DIRECTA COMPLEMENTARIA X RESTRINGIDA
<b>SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO:</b> SI X NO	
<b>COORDENADAS DE GEORREFERENCIA</b>	
<b>LATITUD:</b> 20.486682000	<b>LONGITUD:</b> -97.096505000

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:**  
SOMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA ROTULADO EN LONA DE POLICLORURO DE VINILO (P.C.V.) DE 6 MM. DE ESPESOR, MEDIDAS 3.00 X 2.00 M. FIJADO EN BASTIDOR DE MADERA, ROTULACION DE ACUERDO AL CROQUIS TIPO, TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS INCLUSIVE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

**DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:**  
SOMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA ROTULADO EN LONA DE POLICLORURO DE VINILO (P.C.V.) DE 6 MM. DE ESPESOR, MEDIDAS 3.00 X 2.00 M. FIJADO EN BASTIDOR DE MADERA, ROTULACION DE ACUERDO AL CROQUIS TIPO, TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS INCLUSIVE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

**C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA\***

No. EST.	MONTO CON IVA	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					IMPORTE NETO
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACION	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	
FINIQUITO	\$358,559.24	3	\$358,559.24	ZAM030	\$360,111.44	\$0.00	\$1,552.20	\$0.00	\$358,559.24
UNO	\$1,323,150.70	1	\$1,323,150.70	8634492FEB	\$1,328,878.63	\$0.00	\$5,727.92	\$0.00	\$1,323,150.70
2	\$1,559,250.00	2	\$1,559,250.00	ZAM030	\$1,566,000.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$1,559,250.00
TOTALES	\$3,240,959.94		\$3,240,959.94		\$3,254,990.07	\$0.00	\$14,030.12	\$0.00	\$3,240,959.94



<b>MONTO AUTORIZADO:</b>	\$3,254,990.07	C/IVA		
<b>MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:</b>	\$3,254,990.07	C/IVA		
<b>VALIDACIÓN DEL PROYECTO:</b>	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
<b>DEPENDENCIA QUE VALIDA:</b>				
<b>FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:</b>	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
<b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:</b>				
<b>PERMISOS Y CONCESIONES:</b>	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
<b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:</b>				
<b>TIPO DE LICITACIÓN:</b>	ADJUDICACIÓN DIRECTA			EXISTE
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			X
	LICITACIÓN PÚBLICA			

<b>NO. DE CONTRATO:</b>	MGZ-FISM2020/0117/OP-018	<b>FECHA:</b>	
<b>CONTRATISTA:</b>	CLAUDIA GRISELDA MORALES CALDERON		
<b>RFC:</b>	MOCC790904T35		
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$3,254,990.07	C/IVA	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>PROGRAMADA</b>	<b>REAL</b>	
	INICIO 01/06/2020	15/06/2020	
	TÉRMINO 15/09/2020	29/07/2020	
	DÍAS 107	45	
<b>ANTICIPO:</b>	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

**B) REPORTE**

	EXISTE	FECHAS
<b>MONTO PAGADO EN EL MES:</b>	\$1,566,000.00	03/08/2020
<b>MONTO PAGADO ACUMULADO:</b>	\$2,894,878.00	03/08/2020
<b>FINIQUITO CON IVA:</b>	\$0.00	
<b>ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:</b>		

**AVANCE FÍSICO REAL**

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	30	100	100	100	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	30	100	100	100	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	30	100	100	100	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**OBSERVACIONES:**

<b>TIPO DE FIANZA:</b>	ANTICIPO	<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>VICIOS OCULTOS</b>
<b>MONTO AFIANZADO:</b>		\$280,602.59	\$325,499.01
<b>AFIANZADORA:</b>		RTA, S.A DE C.V., GRUPO RTA, S.A DE C.V., GRUPO	
<b>No. DE FIANZA:</b>		3900-03138-3	3900-03208-1
<b>FECHA:</b>		12/06/2020	29/07/2020
<b>CONVENIO MODIFICATORIO:</b>	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA		
<b>MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:</b>		\$3,254,990.07	C/IVA

Ing. Rodolfo Gutiérrez Lechuga  
DIRECTOR DE OBRAS

ALFREDO MORENO NERI  
SUPERVISOR

FORMATO 11

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2020

<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> 16/10/2020
<b>MES QUE SE REPORTA</b> SEPTIEMBRE

**A) PLANEACION Y DATOS GENERALES**

<b>MUNICIPIO:</b> GUTIERREZ ZAMORA	<b>LOCALIDAD:</b> PAGUAS DE ARROYO GRANDE	<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:</b> CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO RURAL
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> FONDO DE APORTACIONES	<b>No. DE OBRA:</b> 2020300690118	ENTRONQUE EJIDO MARIO HERNÁNDEZ POSADAS A ENTRONQUE PAGUAS DE ARROYO

<b>ANTECEDENTES:</b>	
<b>CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:</b> SI X NO	<b>GRADO DE REZAGO SOCIAL:</b>
<b>OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:</b>	MUY ALTO ALTO MEDIO X BAJO MUY BAJO
<b>TIPO DE ZONA:</b> RURAL X URBANA	<b>TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:</b>
<b>CLAVE AGE:</b> N/A	DIRECTA COMPLEMENTARIA X RESTRINGIDA
<b>SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:</b> SI NO X	
<b>SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO:</b> SI X NO	
<b>COORDENADAS DE GEORREFERENCIA</b>	
<b>LATITUD:</b> 20.490997000	<b>LONGITUD:</b> -97.097692000

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:**  
SOMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA ROTULADO EN LONA DE POLICLORURO DE VINILO (P.C.V.) DE 6 MM. DE ESPESOR, MEDIDAS 3.00 X 2.00 M. FIJADO EN BASTIDOR DE MADERA, ROTULACION DE ACUERDO AL CROQUIS TIPO, TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO Ejes Y REFERENCIAS. INCLUIVE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

**DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:**  
SOMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA ROTULADO EN LONA DE POLICLORURO DE VINILO (P.C.V.) DE 6 MM. DE ESPESOR, MEDIDAS 3.00 X 2.00 M. FIJADO EN BASTIDOR DE MADERA, ROTULACION DE ACUERDO AL CROQUIS TIPO, TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO Ejes Y REFERENCIAS. INCLUIVE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

<b>C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*</b>									
No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
2	\$1,617,000.00	2	\$1,617,000.00	ZAM031	\$1,624,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$1,617,000.00
1	\$539,385.00	1	\$539,385.00	ZAM29	\$541,720.00	\$0.00	\$2,335.00	\$0.00	\$539,385.00
<b>TOTALES</b>			\$2,156,385.00		\$2,165,720.00	\$0.00	\$9,335.00	\$0.00	\$2,156,385.00



<b>MONTO AUTORIZADO:</b>	\$3,160,211.22	C/IVA
<b>MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:</b>	\$3,160,211.22	C/IVA
<b>VALIDACIÓN DEL PROYECTO:</b>	EXISTE	NO EXISTE
<b>DEPENDENCIA QUE VALIDA:</b>	EXISTE	NO EXISTE
<b>FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:</b>	EXISTE	NO EXISTE
<b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:</b>	EXISTE	NO EXISTE
<b>PERMISOS Y CONCESIONES:</b>	EXISTE	NO EXISTE
<b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:</b>	EXISTE	NO EXISTE
<b>TIPO DE LICITACIÓN:</b>	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS
	LICITACIÓN PÚBLICA	

<b>NO. DE CONTRATO:</b>	MGZ-FISM2020/0118/OP-019	<b>FECHA:</b>	17/07/2020
<b>CONTRATISTA:</b>	CLAUDIA GRISELDA MORALES CALDERON		
<b>RFC:</b>	MOCC790904T35		
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$3,160,211.22	C/IVA	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO</b>	PROGRAMADA	REAL
	<b>TÉRMINO</b>	01/06/2020	20/07/2020
	<b>DÍAS</b>	15/08/2020	0
	<b>APLICA</b>	0	NO APLICA
<b>ANTICIPO:</b>	<b>MONTO:</b>		NO APLICA
	<b>FECHA DE PAGO:</b>		PORCENTAJE:

<b>B) REPORTE</b>		
	EXISTE	FECHAS
<b>MONTO PAGADO EN EL MES:</b>	\$1,624,000.00	02/09/2020
<b>MONTO PAGADO ACUMULADO:</b>	\$2,165,720.00	02/09/2020
<b>FINIQUITO CON IVA:</b>	\$0.00	
<b>ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:</b>		

<b>AVANCE FÍSICO REAL</b>												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	20	50	90	100	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	20	50	90	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	20	50	90	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**OBSERVACIONES:**

<b>TIPO DE FIANZA:</b>	ANTICIPO	<b>CUMPLIMIENTO:</b>		<b>VICIOS OCULTOS:</b>
<b>MONTO AFIANZADO:</b>		\$272,432.00		
<b>AFIANZADORA:</b>		RTA, S.A DE C.V., GRUPO		
<b>No. DE FIANZA:</b>		3900-03189-3		
<b>FECHA:</b>		17/07/2020		
<b>CONVENIO MODIFICATORIO:</b>	<b>MONTO</b>	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	<b>PLAZO</b>		INICIAL	FINAL
	<b>NO APLICA</b>			
<b>MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:</b>		\$3,160,211.22		C/IVA

Ing. Rodolfo Gutiérrez Lechuga  
DIRECTOR DE OBRAS

NORBERTO JUAREZMEJIA  
SUPERVISOR

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.**  
**ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**  
**EJERCICIO 2020**

<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	16/10/2020
<b>MES QUE SE REPORTA</b>	SEPTIEMBRE

**A) PLANEACION Y DATOS GENERALES**

<b>MUNICIPIO:</b> GUTIERREZ ZAMORA	<b>LOCALIDAD:</b> GUTIERREZ ZAMORA	<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:</b> AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA LOS ANGELES, MODELO Y SALIDA A EL GIRASOL-LOMA LINDA
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> FONDO DE APORTACIONES	<b>No. DE OBRA:</b> 2020300690128	

<b>ANTECEDENTES:</b>									
<b>CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:</b>			SI	X	NO				
<b>OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:</b>									
<b>TIPO DE ZONA:</b>	RURAL	<b>CLAVE AGE:</b>	0109	<b>MUY ALTO</b>	ALTO	MEDIO	BAJO	<b>MUY BAJO</b>	X
<b>SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:</b>	URBANA	<b>SI</b>		<b>NO</b>	X				
<b>SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO</b>		<b>SI</b>		<b>NO</b>	X				
<b>TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:</b>									
DIRECTA		X		COMPLEMENTARIA		RESTRINGIDA			
<b>COORDENADAS DE GEORREFERENCIA</b>									
<b>LATITUD</b>	20.452098000	<b>LONGITUD</b>	-97.092227000						

<b>DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:</b>
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-12-750, INCLUYE ELABORACIÓN DE CEPAS PARA EL HINCADO DEL MISMO, PARADO CON HIAB, PLOMEADO Y APISONADO CON PIEDRA BOLA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 1R3; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BUS PARA ACOMETIDAS; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA RDA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 1K; SUMINISTRO Y

<b>DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:</b>
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-12-750, INCLUYE ELABORACIÓN DE CEPAS PARA EL HINCADO DEL MISMO, PARADO CON HIAB, PLOMEADO Y APISONADO CON PIEDRA BOLA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 1R3; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BUS PARA ACOMETIDAS; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA RDA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 1K; SUMINISTRO Y

<b>C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*</b>									
No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
FINIQUITO	\$175,756.36	2	\$175,756.36	332	\$176,517.21	\$0.00	\$760.85	\$0.00	\$175,756.36
1	\$710,325.00	1	\$710,325.00	B301	\$713,400.00	\$0.00	\$3,075.00	\$0.00	\$710,325.00
TOTALES	\$886,081.36		\$886,081.36		\$889,917.21	\$0.00	\$3,835.85	\$0.00	\$886,081.36



<b>MONTO AUTORIZADO:</b>	\$889,917.21	<b>C/IVA</b>	
<b>MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:</b>	\$889,917.21	<b>C/IVA</b>	
<b>VALIDACIÓN DEL PROYECTO:</b>	EXISTE	X	NO EXISTE
<b>DEPENDENCIA QUE VALIDA:</b>	CFE		NO APLICA
<b>FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:</b>	EXISTE	X	NO EXISTE
<b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:</b>			CFE
<b>PERMISOS Y CONCESIONES:</b>	EXISTE		NO EXISTE
<b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:</b>			NO APLICA
<b>TIPO DE LICITACIÓN:</b>	ADJUDICACIÓN DIRECTA		EXISTE
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		X
	LICITACIÓN PÚBLICA		

<b>NO. DE CONTRATO:</b>	MGZ-FISM2020/0128/OP-012	<b>FECHA:</b>	29/04/2020
<b>CONTRATISTA:</b>	ISAÍAS ARTURO GUERRERO ACOSTA		
<b>RFC:</b>	GUA1801025H39		
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$889,917.21	<b>C/IVA</b>	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	30/04/2020	02/05/2020
	TÉRMINO	30/06/2020	30/06/2020
	DÍAS	62	60
<b>ANTICIPO:</b>	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

<b>B) REPORTE</b>		
	EXISTE	FECHAS
<b>MONTO PAGADO EN EL MES:</b>	\$176,517.21	02/09/2020
<b>MONTO PAGADO ACUMULADO:</b>	\$889,917.21	02/09/2020
<b>FINIQUITO CON IVA:</b>	\$0.00	
<b>ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:</b>		

<b>AVANCE FÍSICO REAL</b>												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	50	100	100	100	100	0	0	0
REAL	0	0	0	0	50	100	100	100	100	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	50	100	100	100	100	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>TIPO DE FIANZA:</b>	ANTICIPO	<b>CUMPLIMIENTO</b>	VICIOS OCULTOS
<b>MONTO AFIANZADO:</b>		\$76,717.00	\$88,991.72
<b>AFIANZADORA:</b>		ENTES, S.A. DE C.V., GRUJENTES, S.A. DE C.V., GRU	
<b>No. DE FIANZA:</b>		5111-10844-5	5111-10912-0
<b>FECHA:</b>		29/04/2020	30/06/2020
<b>CONVENIO MODIFICATORIO:</b>	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO		INICIAL
	NO APLICA		FINAL
<b>MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:</b>		\$889,917.21	C/IVA

Ing. Rodolfo Gutiérrez Lechuga  
DIRECTOR DE OBRAS

NORBERTO JUÁREZ MEJÍA  
SUPERVISOR

FORMATO 11

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2020

<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	19/10/2020
<b>MES QUE SE REPORTA</b>	SEPTIEMBRE

**A) PLANEACION Y DATOS GENERALES**

<b>MUNICIPIO:</b> GUTIERREZ ZAMORA	<b>LOCALIDAD:</b> GUTIERREZ ZAMORA	<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:</b> MEJORAMIENTO DE GUARNICIONES APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> FONDO DE APORTACIONES	<b>No. DE OBRA:</b> 2020300690217	

<b>ANTECEDENTES:</b>									
<b>CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:</b> SI X NO			<b>GRADO DE REZAGO SOCIAL:</b>						
<b>OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:</b>			MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	X	
<b>TIPO DE ZONA:</b> RURAL URBANA	<b>CLAVE AGE:</b> N/A		<b>TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:</b>						
<b>SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:</b>	SI	NO X	DIRECTA	COMPLEMENTARIA	X	RESTRINGIDA			
<b>SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO</b>	SI X	NO							
<b>COORDENADAS DE GEORREFERENCIA</b>									
<b>LATITUD</b> 20.447019000	<b>LONGITUD</b> -97.091694000								

<b>DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:</b>
APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO EN SECCIÓN DE GUARNICIONES.

<b>DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:</b>
APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO EN SECCIÓN DE GUARNICIONES.

**C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA\***

No. EST.	MONTO CON IVA	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					IMPORTE NETO
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	
1	\$199,137.93	1	\$199,137.93	119	\$200,000.00	\$0.00	\$862.06	\$0.00	\$199,137.93
<b>TOTALES</b>			\$199,137.93		\$200,000.00	\$0.00	\$862.06	\$0.00	\$199,137.93



<b>MONTO AUTORIZADO:</b>	\$200,000.00	C/IVA		
<b>MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:</b>	\$200,000.00	C/IVA		
<b>VALIDACION DEL PROYECTO:</b>	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
<b>DEPENDENCIA QUE VALIDA:</b>				
<b>FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:</b>	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
<b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:</b>				
<b>PERMISOS Y CONCESIONES:</b>	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
<b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:</b>				
<b>TIPO DE LICITACIÓN:</b>	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	licitación pública	X

<b>NO. DE CONTRATO:</b>	MGZ-FORTAMUNDF2020/0217/OP-00	<b>FECHA:</b>	01/08/2020
<b>CONTRATISTA:</b>	ERENDIRA YULIANI PEREZ LUNA		
<b>RFC:</b>	PELE720728616		
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$200,000.00	C/IVA	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO</b>	PROGRAMADA	REAL
	<b>TÉRMINO</b>	01/04/2020	03/08/2020
	<b>DÍAS</b>	15/09/2020	17/08/2020
<b>ANTICIPO:</b>	<b>APLICA</b>	NO APLICA	X
	<b>MONTO:</b>		PORCENTAJE:
	<b>FECHA DE PAGO:</b>		

<b>B) REPORTE</b>		
	EXISTE	FECHAS
<b>MONTO PAGADO EN EL MES:</b>	\$200,000.00	02/09/2020
<b>MONTO PAGADO ACUMULADO:</b>	\$200,000.00	02/09/2020
<b>FINIQUITO CON IVA:</b>	\$0.00	
<b>ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:</b>		

<b>AVANCE FÍSICO REAL</b>												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>TIPO DE FIANZA:</b>	ANTICIPO	<b>CUMPLIMIENTO</b>	\$17,241.38	<b>VICIOS OCULTOS</b>	\$20,000.00
<b>MONTO AFIANZADO:</b>					
<b>AFIANZADORA:</b>	RTA, S.A DE C.V., GRUPO RTA, S.A DE C.V., GRUPO				
<b>No. DE FIANZA:</b>	3900-03188-8	3900-03194-5			
<b>FECHA:</b>	01/08/2020	17/08/2020			
<b>CONVENIO MODIFICATORIO:</b>	<b>MONTO</b>	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA	
	<b>PLAZO</b>		INICIAL	FINAL	
	<b>NO APLICA</b>				
<b>MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:</b>		\$200,000.00		C/IVA	

<b>OBSERVACIONES:</b>

Ing. Rodolfo Gutiérrez Lechuga  
DIRECTOR DE OBRAS

LUIS JAVIER OROSTICO LÓPEZ  
SUPERVISOR

FORMATO 11

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



**Sistema de Información Municipal de  
Veracruz  
SIMVER**

**Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /62096**

**C. Wilman Monje Morales  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
P R E S E N T E.**

**ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN**

Fecha de recepción de documentación:	22/10/2020 12:48:46 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/10/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	SEPTIEMBRE
Fuente de financiamiento:	RECURSOS FISCALES COMPLEMENTARIOS
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

gP7ZLYzVoJ0KyxxR4RxTKD00/kBBInhaO4NtlbB++05GMfJakYKIFsrSR+Z35/dTmhi3CBhWd8bOZEMhl+8n0LN7aanQ9TA7wKQbgKtUmnkA1S23OGVhK6rLuLIIV9uE4/T0dICziE96h62+AFDWiNpIHUsqVsQyEGrOI  
FeThll=

*“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”*



**Sistema de Información Municipal de  
Veracruz  
SIMVER**

**Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /61790**

**C. Wilman Monje Morales  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
P R E S E N T E.**

**ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN**

Fecha de recepción de documentación:	21/10/2020 10:20:38 a. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/10/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	SEPTIEMBRE
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

W4ClgDfsz03L9UJF7hZlj7d1LH1IRpSa7F/6st0RfPtZp4iaFuzMlywqTc4j2e23qR410DgUQhBRNEezlemmF3/uoGH64azYCzefhMuVvDCQytBYdZ8npMUQqodGfwe1jXes7hTlCsfayOnnyj8JEawoW5A/3BncxB4Qv9eH+NE=

*“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”*



**Sistema de Información Municipal de  
Veracruz  
SIMVER**

**Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /61791**

**C. Wilman Monje Morales  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
P R E S E N T E.**

**ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN**

Fecha de recepción de documentación:	21/10/2020 10:22:09 a. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/10/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	SEPTIEMBRE
Fuente de financiamiento:	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

rBND98lAPg/F2FtoLFhrMSUuKmiqTBx4c0wWGMHIuOwpFtnk9BEtpovJp3E6up7poEN1rPVMvaHqCGI+8dC44lxAp9xkSiTVKrwD+iCbaYnwNCFt6qhc3CWklwNQEZdpEI6cntIE6vnKvC9DSHbLvgZReR2+fEpptV7G3+1cSE=

*“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”*



**Sistema de Información Municipal de  
Veracruz  
SIMVER**

**Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /61788**

**C. Wilman Monje Morales  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
P R E S E N T E.**

**ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN**

Fecha de recepción de documentación:	21/10/2020 10:18:21 a. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/10/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	SEPTIEMBRE
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

NMJGiVzxCGVpgG1H80GmKL2ScdrjbRzTlzc5JIUTjhCTM8VsPDOugxy6NsN6zjUCLfphWmgFly5SXomH0 /AmY2GV/N95MVH0Hp+eX2Snu/mr0iJ4bDd5f4B2IH0TadBiuUN1t1CL4dkqil/cRUbaKyB3yZHgXmT5PQ0C Jcb760E=

*“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”*

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA  
PRESENTE

**ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS**  
**INTEGRACIÓN DEL ESTADO MENSUAL DE OBRA PÚBLICA**

**PERIODO:** OCTUBRE 2020

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 15/10/2020 AL 31/10/2020

DOCUMENTO ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO	RECEPCIÓN	
		FECHA	HORA
OP1. OFICIO DE REMISIÓN.	PDF	22/10/2020	14:30:44
OP2. ACTA DE SESIÓN DE CABILDO.	PDF	22/10/2020	14:30:57
OP3. RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES.	PDF	22/10/2020	14:31:16
OP4. REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (FORMATO 9).	PDF	22/10/2020	14:31:27
OP5. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO (FORMATO 11).	PDF	22/10/2020	14:31:45
OP6. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. (FORMATO...	PDF	22/10/2020	14:32:46
OP9. TERCER INFORME TRIMESTRAL DE OBRAS Y ACCIONES.	PDF	22/10/2020	14:49:39
OP12. MODIFICACIÓN A LA PROPUESTA DE INVERSIÓN (FORMATO 02).	PDF	22/10/2020	14:53:56

El presente documento se emite en el caso de Estados Financieros y Estados de Obra Pública mensuales de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para las demás se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. No exime de solicitudes, se reciben documentos con reserva de Ley, este recibo no implica validación de la información.
