

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

No. REPORTE:	1
FECHA REPORTE:	07/07/2023

	REAL	PROGRAMADO
AVANCO		
FISICO	100	100
FINANCIER	100	100

DATOS DE LA OBRA	
NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE QUARNICIONES DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS DE DIMENSIÓN Y BANQUETAS DE CONCRETO F'c=160 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, EN LA CALLE LA LUZ, COLONIA NIEVES, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCÍA, ZACATECAS.	
UBICACIÓN:	CALLE LA LUZ, COLONIA LOS HUESOS
TIPO DE OBRA:	NUEVA
MODALIDAD EJEC.:	ADJUDICACION DIRECTA
No. CONTRATO:	CTO NO 1 MVG-27-03-2023
EMPRESA:	JOSE GUADALUPE CERDEJAS MONREAL
MONTO CONTRATO:	\$ 540,051.79
FECHA CONTRATO:	27/03/2023
MONTO ANTICIPO:	\$
FECHA PAGO ANTICIPO:	0-cre-00
No. AMPL. DE CONTRATO:	N/A
MONTO AMPL. CONTRATO:	N/A
FECHA AMPL. CONTRATO:	N/A
PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO TERM.
FECHAS PROGRAMADAS:	28-mar-23 5-may-23
FECHAS REALES:	28-mar-23 5-may-23
FECHAS REPROGRAMADAS:	

PARTIDAS	IMPORTES	MESES			DIAS	% EN BASE TIEMPO
		MARZO	ABRIL	MAYO		
LETrero	\$ 7,115.80					
PRELIMINARES	\$ 13,433.81					
QUARNICIONES	\$ 228,570.45					
BANQUETAS	\$ 140,897.38					
LIMPIEZA	\$ 7,786.50					
SUB-TOTAL	\$ 407,803.94					
16% I.V.A.	\$ 65,248.85					
TOTAL	\$ 473,052.79					



SUPERVISOR DE OBRA
[Signature]



DIRECTOR OBRAS PUBLICAS
[Signature]





**OPERADO
EFSM**

00020



MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

INFORME FOTOGRAFICO

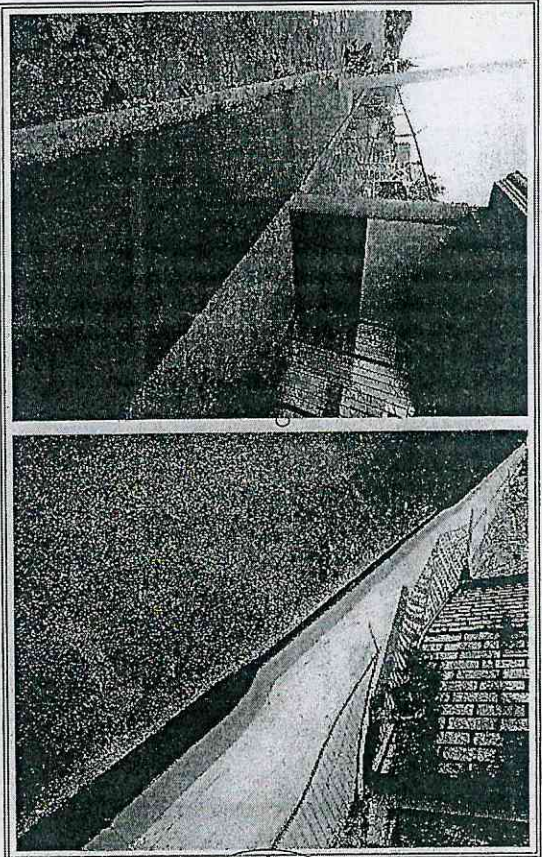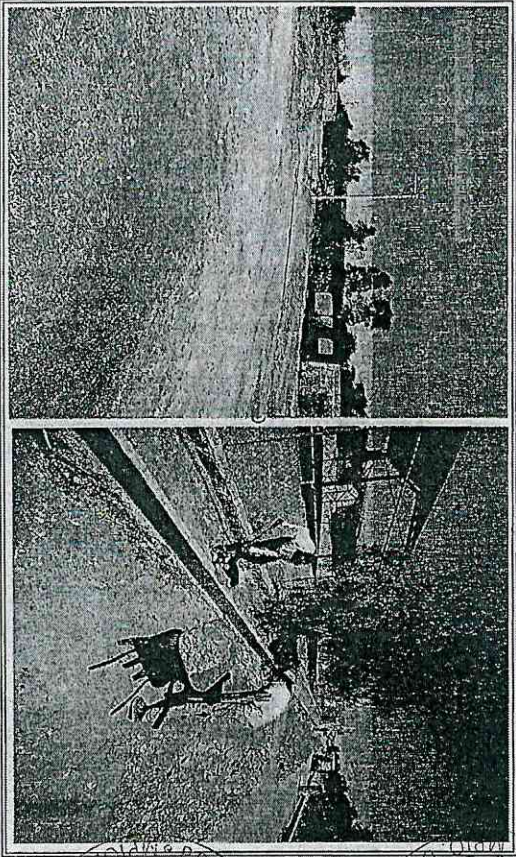

OPERANDO
PERMISO



CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO F-C=200 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS DE DIMENSION Y BANQUETAS DE CONCRETO F-C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, EN LA CALLE LA LUZ, COLONIA NIEVES, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCÍA, ZACATECAS.

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO
FECHA

CALLE LA LUZ, COLONIA NIEVES, CABECERA MUNICIPAL
28-mar-23 | TERMINO 5-may-23
viernes, 7 de julio de 2023

000202

BITÁCORA DE OBRA.

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS DE DIMENSIÓN Y BANQUETAS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, EN LA CALLE LA LUZ, COLONIA NIEVES, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA, ZACATECAS.

Nota 1: Se da inicio a la obra con el trazo y nivelación de las áreas en donde se construiran las guarniciones.

Nota 2: Inician con la construcción de las guarniciones, se observa el simbrado de las guarniciones, así como el colado con concreto con la ayuda de concreto premezclado.

Nota 3: Continuan con la construcción de guarniciones, a la fecha llevan 120 metros colados.

Nota 4: Se continua con la construcción de guarniciones, y se da inicio a la excavación con máquina para el alojamiento del muro de mampostería.

Nota 5: Inician la construcción del muro de mampostería con piedra asentada con mezcla de cemento y arena.

Nota 6: Se continuan con el último tramo de guarniciones, y a la vez la colocación del tubo negro corrugado sobre la zanja pluvial.

Nota 7: Se da inicio con la construcción de la banqueteta, con la nivelación, limpia y relleno con material de banco tepetate, se extiende, humedece, para continuar con la compactación, utilizando maquina compactadora, para su posterior colado.

Nota 8: Continuan con la construcción de banquetas

Nota 9: Se finalizo la construcción de las banquetas, por lo que se procede a realizar la limpieza de los materiales restantes en el área de trabajo, para iniciar a pintar las guarniciones a mano, dando dos pasadas.

Nota 10: Se ha concluido la aplicación de la pintura y la colocación del letrero alusivo a la obra, por lo que se dan por finalizados los trabajos en la obra.

