



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!

¡YA ES HORA DE CREER EN TI!
ESPERANZA
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL
Y COMBATE A LA POBREZA



INFORME MENSUAL DE ESTADO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES

MARZO 2019



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA.
OFICIO No. P-2019/24/04-0186
ASUNTO: REPORTE DEL MES DE
MARZO

DIP. JOSÉ MANUEL POZOS CASTRO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
LXV LEGISLATURA DEL ESTADO
XALAPA, VERACRUZ.
PRESENTE:

El que suscribe **C. Ing. Wilman Monje Morales**, Presidente Municipal Constitucional de Gutiérrez Zamora, Ver.; por medio del presente me dirijo a Usted para hacer de conocimiento que en cumplimiento a lo que establece el artículo 30 de la *Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*, así como *Las Reglas de Carácter General para el cumplimiento de la Presentación de Información Municipal a través de Medios Electrónicos* al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz; remito a Usted el **Estado de Obra Pública correspondiente al mes de Marzo de 2019**, generado en el Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), así como el acta de cabildo donde fueron aprobados.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Gutiérrez Zamora, Ver.; a Miércoles 24 de Abril de 2019.

ATENTAMENTE


ING. WILMAN MONJE MORALES.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE GUTIÉRREZ ZAMORA.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
PRESIDENCIA

c.c.p. el archivo



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!

¡YA ES HORA DE CREER EN TI!
ESPERANZA
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL
Y COMBATE A LA POBREZA

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021**



**DEPENDENCIA: PRESIDENCIA.
OFICIO No. P-2019/24/04-0187
ASUNTO: REPORTE DEL MES DE
MARZO**

C.P.C LORENZO ANTONIO PORTILLA VÁSQUEZ
AUDITOR GENERAL TITULAR DEL ORGANO
DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO.
PRESENTE:

El que suscribe **C. Ing. Wilman Monje Morales**, Presidente Municipal Constitucional de Gutiérrez Zamora, Ver.; por medio del presente me dirijo a Usted para hacer de conocimiento que en cumplimiento a lo que establece el artículo 30 de la *Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*, así como *Las Reglas de Carácter General para el cumplimiento de la Presentación de Información Municipal a través de Medios Electrónicos* al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz; remito a Usted el **Estado de Obra Pública correspondiente al mes de Marzo de 2019**, generado en el Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), así como el acta de cabildo donde fueron aprobados.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Gutiérrez Zamora, Ver.; a Miércoles 24 de Abril de 2019.

ATENTAMENTE


ING. WILMAN MONJE MORALES.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE GUTIÉRREZ ZAMORA.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
PRESIDENCIA

c.c.p. el archivo



ACTA NUMERO 17 SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
GUTIÉRREZ ZAMORA, VERACRUZ

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO efectuada por el Honorable Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz, a las NUEVE horas del QUINCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, de conformidad con lo que disponen los Artículos 36, Fracción I, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz-Llave.- Preside el C. Wilman Monje Morales Presidente Municipal, con quórum integrado por los ciudadanos: C. Rosa María Ortega González, Sindica Única; C. Gonzalo Quiñones López Regidor Primero, Silviana Rodríguez Martínez Regidora Segunda, Francisco Hatzel Gómez Ochoa Regidor Tercero, Rosalía García Guerrero Regidora Cuarta. El C. Presidente Municipal, C. Wilman Monje Morales, declara abierta la Sesión, acto seguido, el secretario del H. ayuntamiento, procede a pasar lista de asistencia, declarando quórum legal. Inmediatamente da lectura al Orden del Día, misma que a la letra dice: - - - - -


PRESIDENTE
MUNICIPAL


SÍNDICA
ÚNICA


REGIDOR
PRIMERO

1.- LISTA DE ASISTENCIA. - - - - -


REGIDORA
SEGUNDA

2.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. - - - - -

3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. - - - - -


REGIDOR
TERCERO

4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.- - - - -


REGIDORA
CUARTA

5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019; DE LOS REPORTES DE LOS FONDOS DEL FISM DF 2019, FORTAMUN DF 2019, CAPUFE 2018 PASIVOS, RECURSOS FISCALES 2019. - - - - -


SECRETARIO F
AYUNTAMIENTO

6.- ASUNTOS GENERALES. - - - - -

Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, C. WILMAN MONJE MORALES, pregunta al Cuerpo Edilicio si están de acuerdo en aprobar el Orden del Día. - ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. - - - - -

CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA APROBADO Y AGOTADOS LOS PUNTOS 1, 2 y 3 SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO. - - - - -

4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.- - - - -



En uso de la voz la C. Kitzia Eunice Juárez Salazar, Tesorera Municipal, informa al cabildo los Estados Financieros del mes de marzo de 2019, acorde a lo establecido en el artículo 45 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre, mismos que fueron preparados por la Tesorería Municipal, en términos del artículo 72 fracción XIII de la misma Ley. En uso de la voz el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al cabildo si son de aprobarse los estados financieros correspondientes al mes de marzo del año 2019.-----

El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO. - Se aprueban los Estados Financieros correspondientes al mes de marzo del año 2019. APROBADO POR UNANIMIDAD. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.-----


PRESIDENTE
MUNICIPAL


SÍNDICA
ÚNICA

5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019; DE LOS REPORTES DE LOS FONDOS DEL FISM DF 2019, FORTAMUN DF 2019, CAPUFE 2018 PASIVOS, RECURSOS FISCALES 2019.-----


REGIDOR
PRIMERO

En uso de la voz el C. Arq. Antonio Ríos Pérez, Director de Obras Públicas; informa al cabildo los Estados de Obra Pública del mes de marzo de 2019, acorde a lo establecido en el artículo 73 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre; y presenta los reportes de los fondos y en los relativos al FISM DF 2019, FORTAMUN DF 2019 no se presenta movimientos durante el mes y de CAPUFE 2018 PASIVOS solo una obra presenta reporte de pago. En uso de la voz el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al cabildo si son de aprobarse los estados de Obra correspondientes al mes de marzo del año 2019; de los reportes de los fondos del FISM DF 2019, FORTAMUN DF 2019, CAPUFE 2018 PASIVOS, Recursos Fiscales 2019. El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO. - Se aprueban los Estados de Obra Pública correspondientes al mes de marzo del año 2019, de los reportes de los fondos del FISM DF 2019, FORTAMUN DF 2019, CAPUFE 2018 PASIVOS, Recursos Fiscales 2019. APROBADO POR UNANIMIDAD. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.-----


REGIDORA
SEGUNDA


REGIDOR
TERCERO


REGIDORA
CUARTA

6.- ASUNTOS GENERALES.-----

No hubo asuntos generales.-----

Posterior a ello, el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal, en los términos que marca la Ley, en uso de la voz, hace del conocimiento de los miembros del cabildo que se agotaron los asuntos del orden del día de esta Décimo Séptima sesión ordinaria del H. Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz.-----


SECRETARIO F
AYUNTAMIENTO

7.- CLAUSURA.-----

Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS, DEL DÍA QUINCE DE ABRIL, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA QUE FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS



CIUDADANOS EDILES QUE EN ELLA INTERVINIERON ANTE EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, QUE AUTORIZA Y DA FE. REMÍTASE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA AL H. CONGRESO DEL ESTADO. -----

C. 
WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!
SINDICATURA
ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICA ÚNICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!
REGIDURIA PRIMERA
GONZALO QUIÑONES LÓPEZ
REGIDOR PRIMERO

C. 
SILVIANA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
REGIDORA SEGUNDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!
REGIDURIA TERCERA
FRANCISCO HATZEL GÓMEZ OCHOA
REGIDOR TERCERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!
REGIDURIA CUARTA
ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
SECRETARÍA
JORGE CHENA BATRES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/48132

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2019300690003	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS PARA RESTRICCIÓN DE ACCESO VEHICULAR EN CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA DE LA RIVERA Y CALLE MANUEL. GTZ. ZAMORA EN PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD	Sí	No	Sí	No
2019300690002	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD EL MORRO	Sí	No	Sí	No
2019300690001	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ACCESO AL EJIDO SOTO Y GAMA	No	No	No	No

SELLO DIGITAL:

WoYkVvgweov7OHi/4PzitPxdrbnRpG0V6weDzsSogoHE0o6wlgFiwyDrkvPyJg7o5z/JwtKCi2asjX4TZNUgNmGEqAcBwZv6OjKi7CmGRMX1Nhawyzuaksl1r0qZrJQ0y06w8a4C5p+xnBYCbPS/tiJWxa7DZxK0L2qJu5PlpQA=

Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/48130

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2019300690101	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO PUENTE TECOLUTLA - EL MORRO DEL KM 0+000 AL KM 2 + 500	Sí	No	Sí	No
2019300690102	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: ARROYO GRANDE - EL MANGO DEL KM 0+ 000 AL KM 2+ 000	Sí	Sí	Sí	No
2019300690103	REHABILITACIÓN DE CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES RICARDO FLORES MAGÓN Y FRANCISCO I. MADERO EN COLONIA REVOLUCIÓN	Sí	Sí	Sí	No
2019300690104	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: LA GALEANA -TRES CRUCES DEL KM 0+000 AL KM 3+000	Sí	Sí	Sí	No
2019300690105	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: LA GALEANA -ZAPOTAL	Sí	Sí	Sí	No
2019300690106	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS, COCINA COMEDOR Y BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO CLAVE: 30EJN0241Y	Sí	No	Sí	No
2019300690107	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA LAS FLORES	No	No	No	No
2019300690108	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA AGEB 019A, COLONIA PRIMERO DE MAYO	No	No	No	No
2019300690109	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA AGEB 0185, COLONIA CUAUHTLAN	No	No	No	No
2019300690110	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LA LUZ DEL PORTUGUÉS	No	No	No	No
2019300690111	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 0096 GUTIÉRREZ ZAMORA	No	No	No	No
2019300690112	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 0109 GUTIÉRREZ ZAMORA	No	No	No	No
2019300690113	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 0151 GUTIÉRREZ ZAMORA	No	No	No	No

SELLO DIGITAL:

nSBN5Y0/GW+e1cL6/E7/zzCgSts4leNFB52Y9yDgRMFmca/ffdX9KowoaUgLeCtF/0J8E4DLWSG+wVpy0EFwR9Oxk6Q5BWKfAYnkL6ADavJe9Td7tsDIP1kU4jAUd2AFcjMHJrgdy9q8Dr0r3wDsOm9n8ot+0U3MNejVw8ixc8=

Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/48130

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2019300690114	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 185 GUTIÉRREZ ZAMORA	No	No	No	No
2019300690115	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 019A GUTIÉRREZ ZAMORA	No	No	No	No
2019300690116	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 0202 GUTIÉRREZ ZAMORA	No	No	No	No
2019300690117	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 0217 GUTIÉRREZ ZAMORA	No	No	No	No
2019300690118	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD ANCLÓN Y ARENAL	No	No	No	No
2019300690119	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD ARROYO GRANDE	No	No	No	No
2019300690120	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD IGNACIO MUÑOZ (ZAPOTAL)	No	No	No	No

SELLO DIGITAL:

nSBN5Y0/GW+e1cL6/E7/zzCgSts4leNFB52Y9yDgRMFmca/fldx9KowoaUgLeCTF/0J8E4DLWSG+wVpy0EFWr9Oxk6Q5BWkfAYnkL6ADavJe9Td7tsDIP1kU4JjAUd2AFcjMHJRGdy9q8Dr0r3wDsOm9n8ot+0U3MNejVw8ixc8=

Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/47654

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
-------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------

SIN MOVIMIENTOS EN EL PERIODO.



SELLO DIGITAL:

JdeFFQ7WDMpbfv0FS2fEohzLQ5JGuvLOW44r1KbGHFChr5rkwe27PwwYVb1dR0iwo6DKI37FU8rHxDzP3YiyZH9fdWtMEINcunO+MgcY+4sl8ThsL6YsArLpioRHaqL0eUZ2B+foKu8US8/I641B8QqRxQvppfA0xRG81pBQWAg=

Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/47974

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2019300690404	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN SECCIÓN DE CALLES MELCHOR OCAMPO ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE MELCHOR OCAMPO Y JUVENTINO ROSAS, JUVENTINO ROSAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA ALLENDE EN LA LOCALIDAD RAFAEL	Sí	Sí	Sí	No
2019300690412	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS ENTRE "EL FALSO Y CEMENTERIO DE SANTA ROSA" DEL KM 0+000 AL KM 1+460	Sí	Sí	Sí	No
2019300690418	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN TRAMO: UNIVERSIDAD-ENTRONQUE A CAMINO PAGUAS DE ARROYO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 0+860	Sí	No	Sí	No

EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/47974



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2016 - 2021
**OBRAS
PÚBLICAS**

SELLO DIGITAL:

cq2OxrSN1QucoT8KV1iS+LZXPgMXSqAcW3ZrU73GCXWtwzC5kSYk2H37gZbkuBj2AyyOLF0wjHtK+hYvuitL5b65bMIW1KsBKWQW5eHUNfvScrp886MSCu+qOfFt6Uoi5Sfgj0a9e90zlikPV505614/J09HSUKIsh2JjDIGEYc=




H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	EL MORRO	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2019
No. de obra:	2019300690002	Periodo:	MARZO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD EL MORRO			Fuente de financiamiento:	RECURSOS FISCALES
				Fecha de revisión:	15/04/2019

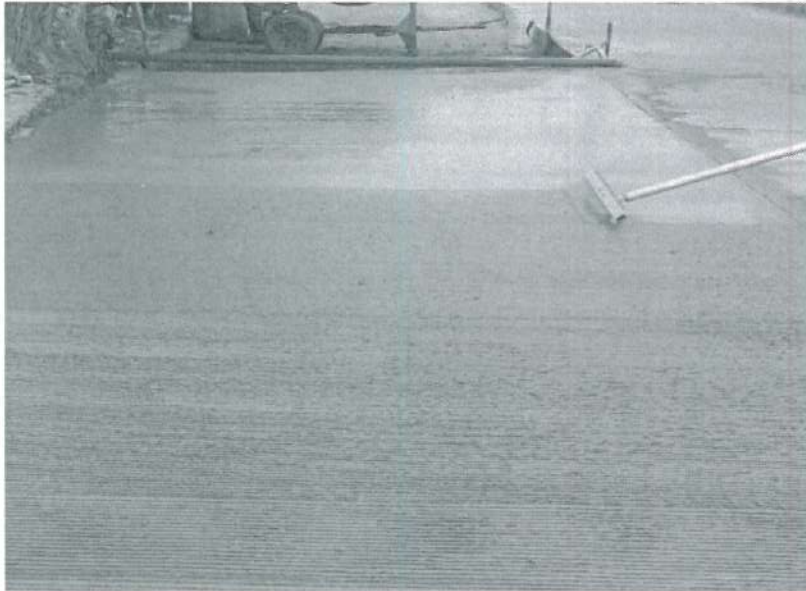

FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRAS
PÚBLICAS


RODOLFO GUTIÉRREZ LECHUGA
INGENIERO
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis




H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2019
No. de obra:	2019300690003	Periodo:	MARZO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS PARA RESTRICCIÓN DE ACCESO VEHICULAR EN CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA DE LA RIVERA Y CALLE MANUEL. GTZ. ZAMORA EN PRIMER			Fuente de financiamiento:	RECURSOS FISCALES
				Fecha de revisión:	15/04/2019

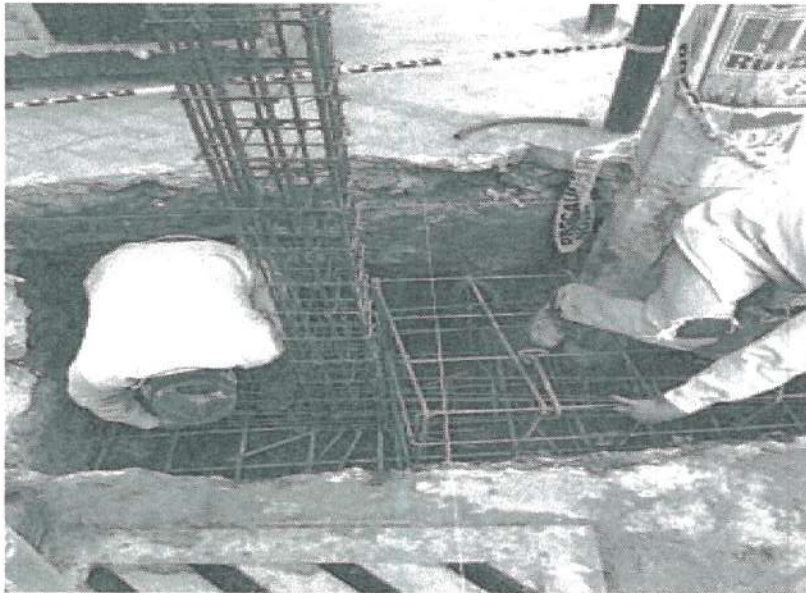

FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

LEONEL RODRIGUEZ RÍOS
INGENIERO

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)


DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	EL MORRO	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2019
No. de obra:	2019300690101.00	Periodo:	MARZO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO PUENTE TECOLUTLA - EL MORRO DEL KM 0+000 AL KM 2 + 500			Fuente de financiamiento:	OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	15/04/2019



FOTO


Concepto de obra ejecutado:

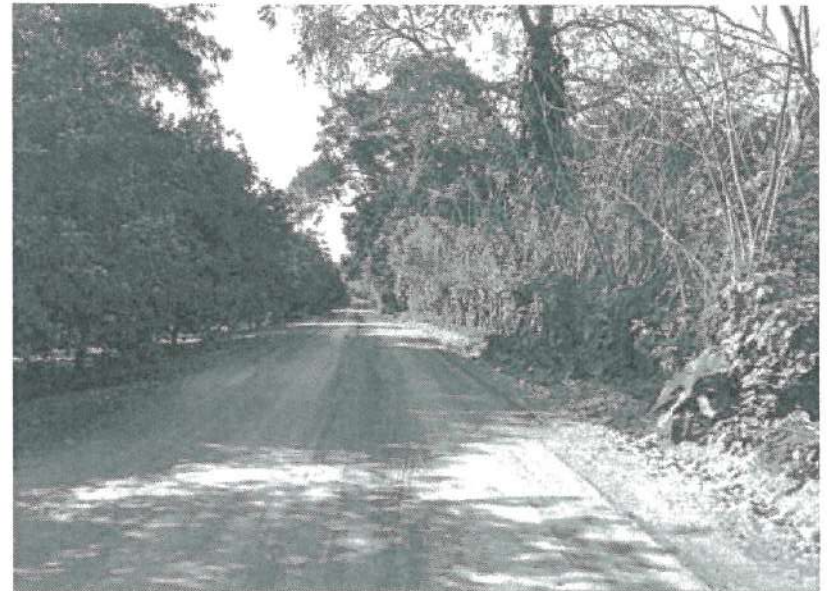

FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:




ALFREDO MORENO NERI
 INGENIERO
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	EL MANGO	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2019
No. de obra:	2019300690102	Periodo:	MARZO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: ARROYO GRANDE - EL MANGO DEL KM 0+000 AL KM 2+000			Fuente de financiamiento:	SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	15/04/2019



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Observaciones area (empty space for notes)




 ALFREDO MORENO NERI
 INGENIERO
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	EL MANGO	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2019
No. de obra:	2019300690102	Periodo:	MARZO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: ARROYO GRANDE - EL MANGO DEL KM 0+			Fuente de Financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA L
				Fecha de revisión:	15/04/2019



FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:




FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:




ALFREDO MORENO NERI
 INGENIERO
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2019
No. de obra:	2019300690103	Periodo:	MARZO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES RICARDO FLORES MAGÓN Y FRANCISCO I. MADERO EN COLONIA REVOLUCIÓN			Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA
				Fecha de revisión:	15/04/2019



FOTO

Concepto de obra ejecutado:




FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.




LUIS JAVIER ORÓSTICO
 INGENIERO
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2019
No. de obra:	2019300690103	Periodo:	MARZO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES RICARDO FLORES MAGÓN Y			Fuente de Financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA L
				Fecha de revisión:	15/04/2019



FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:



FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2019 - 2021
OBRAS
PÚBLICAS

LUIS JAVIER CRÓSTICO LOPEZ

INGENIERO

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio: GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad: HERMENEGILDO GALEANA	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2019
No. de obra: 2019300690104	Periodo: MARZO	Número de estimación: 1.00
Descripción: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: LA GALEANA -TRES CRUCES DEL KM 0+000 AL KM 3+000		Fuente de financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA
		Fecha de revisión: 15/04/2019



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Observaciones area (empty space for notes)



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

2018-2021

NORBERTO JUAREZ MEJIA
INGENIERO

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	HERMENEGILDO GALEANA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2019
No. de obra:	2019300690104	Periodo:	MARZO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: LA GALEANA -TRES CRUCES DEL KM 0+000			Fuente de Financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA L
				Fecha de revisión:	15/04/2019



FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:




FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:



Observaciones:

Empty box for observations.



NORBERTO JUAREZ MEJIA
 INGENIERO
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio: GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad: HERMENEGILDO GALEANA	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2019
No. de obra: 2019300690105	Periodo: MARZO	Número de estimación: 1.00
Descripción: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: LA GALEANA -ZAPOTAL		Fuente de financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA
		Fecha de revisión: 15/04/2019



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021

LEONEL RODRÍGUEZ RÍOS
INGENIERO
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	HERMENEGILDO GALEANA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2019
No. de obra:	2019300690105	Periodo:	MARZO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: LA GALEANA -ZAPOTAL			Fuente de Financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA L
				Fecha de revisión:	15/04/2019



FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:




FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.




LEONEL RODRÍGUEZ RÍOS
 INGENIERO
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2019
No. de obra:	2019300690106	Periodo:	MARZO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS, COCINA COMEDOR Y BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO CLAVE: 30EJN0241Y			Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA
				Fecha de revisión:	15/04/2019



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.



LUIS JAVIER OROSTICO LÓPEZ
INGENIERO

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	RAFAEL VALENZUELA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2019
No. de obra:	2019300690404	Periodo:	MARZO	Número de estimación:	3.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN SECCIÓN DE CALLES MELCHOR OCAMPO ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE			Fuente de financiamiento:	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES
				Fecha de revisión:	15/04/2019



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:



NORBERTO JUAREZ MEJIA
 INGENIERO
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	RAFAEL VALENZUELA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2019
No. de obra:	2019300690404	Periodo:	MARZO	Número de estimación:	3.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN SECCIÓN DE CALLES MELCHOR OCAMPO ENTRE			Fuente de Financiamiento:	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 2
				Fecha de revisión:	15/04/2019



FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:



FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
**OBRAS
PÚBLICAS**

NORBERTO JUÁREZ MEJIA
INGENIERO
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2019
No. de obra:	2019300690412	Periodo:	MARZO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS ENTRE "EL FALSO Y CEMENTERIO DE SANTA ROSA" DEL KM 0+000 AL KM			Fuente de financiamiento:	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES
				Fecha de revisión:	15/04/2019



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2019-2021
**OBRAS
PÚBLICAS**

ALFREDO MORENO NERI
INGENIERO
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	ARRILLO PUERTO (SANTA ROS)	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2019
No. de obra:	2019300690412	Periodo:	MARZO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS			Fuente de Financiamiento:	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 2
				Fecha de revisión:	15/04/2019

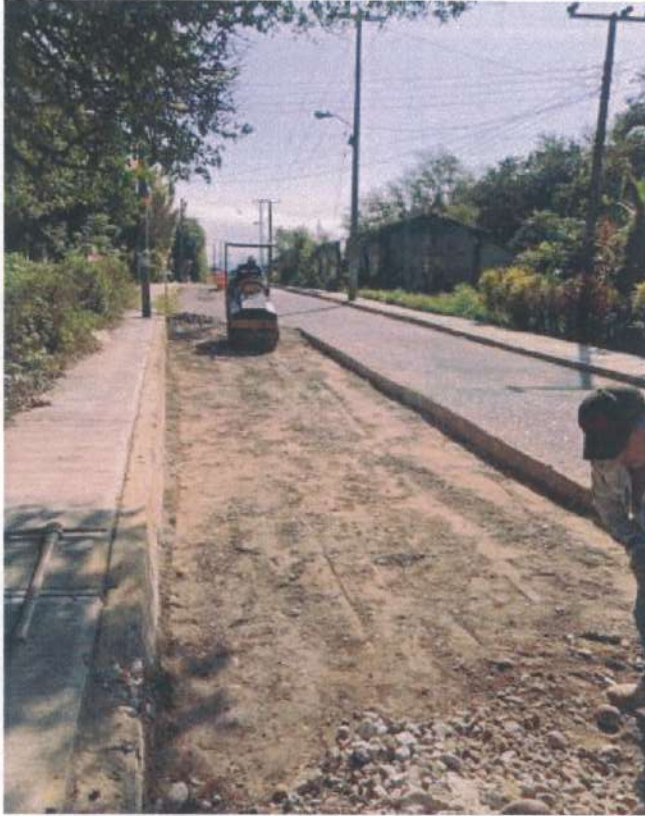


FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:





FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:

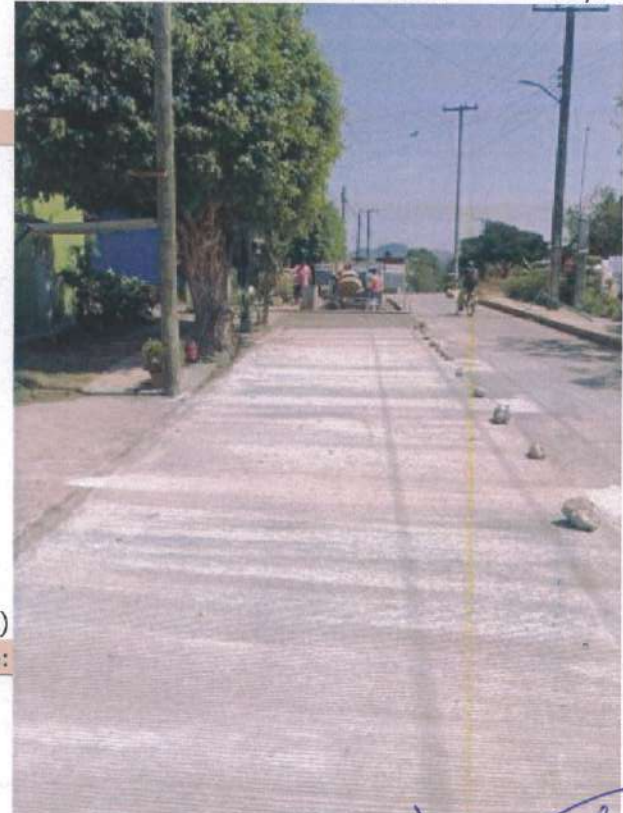

Observaciones:

Observaciones:



ALFREDO MORENO NERI
INGENIERO
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	PALO BLANCO	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2019
No. de obra:	2019300690418	Periodo:	MARZO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN TRAMO: UNIVERSIDAD-ENTRONQUE A CAMINO PAGUAS DE ARROYO GRANDE DEL KM 0+000 AL			Fuente de financiamiento:	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES
				Fecha de revisión:	15/04/2019



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations



NORBERTO JUÁREZ MEJIA
 INGENIERO
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACIÓN:	15/04/2019
MES QUE SE REPORTA	MARZO

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA		LOCALIDAD: RAFAEL VALENZUELA		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN SECCION DE CALLES MELCHOR OCAMPO ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CAMINOS Y PUENTES FEDER		No. DE OBRA: 2019300690404		

ANTECEDENTES:				
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	X	NO	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:				
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE	GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
	URBANA	AGEB:	N/A	MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO X MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	X	NO	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI	X	NO	
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:				
	DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	X
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA				
LATITUD	20.407376540	LONGITUD	-97.127479001	
	PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI	NO X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIAS, CARGA DE MATERIALES, AFINE Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE, CIMBRA EN FRONTERA, PAVIMENTO DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO, JUNTA DE DILATACIÓN, CORTE DE PAVIMENTO Y APLICACIÓN DE CURACRETO.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIAS, CARGA DE MATERIALES, AFINE Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE, CIMBRA EN FRONTERA, PAVIMENTO DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO, JUNTA DE DILATACIÓN, CORTE DE PAVIMENTO Y APLICACIÓN DE CURACRETO.

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
FINIQUITO	\$7,909.26	4	\$7,909.26	B93-R4	\$7,943.50	\$0.00	\$34.24	\$0.00	\$7,909.26
ESTIMACION 3	\$1,100,884.27	3	\$1,100,884.27	B93-R3	\$1,105,650.00	\$0.00	\$4,765.73	\$0.00	\$1,100,884.27
TOTALES	\$1,108,793.53		\$1,108,793.53		\$1,113,593.50	\$0.00	\$4,799.97	\$0.00	\$1,108,793.53

MONTO AUTORIZADO:	\$1,113,593.50	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$1,113,593.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA			EXISTE
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			X
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	MGTZ-LR35-CAPUFE/2018300690404	FECHA:	16/11/2018
CONTRATISTA:	JOSÉ DE JESÚS TOLENTINO DORANTES		
MONTO CONTRATADO:	\$3,085,111.70	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	19/11/2018	
	TÉRMINO	15/03/2019	
	DÍAS	103	
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$1,113,593.50	21/03/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$1,105,650.00	15/03/2019
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	20/03/2019

AVANCE FISICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	50	80	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	50	80	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	50	80	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:
OBRA TERMINADA -CAPUFE 2018

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:	\$301,724.14	\$308,511.17		
AFIANZADORA:	FIRTA, S.A DE C.V. Grupo Firta, S.A de C.V. Grupo Firta			
No. DE FIANZA:	1166-00566-3	1166-00606-6		
FECHA:	16/11/2018	15/03/2019		
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	PLAZO	X	INICIAL	FINAL
			02/01/2019	15/03/2019
	NO APLICA			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$3,085,111.70			C/IVA

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRAS
PUBLICAS

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ROBERTO JUAREZ MEJIA
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACION:
15/04/2019
MES QUE SE REPORTA
MARZO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS ENTRE "EL FALSO Y CEMENTERIO DE SANTA ROSA" DEL KM 0+000 AL KM
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	CAMINOS Y PUENTES FEDER	No. DE OBRA:	2019300690412		

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		SI	X	NO						
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:								
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGE:	N/A	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	X	MUY BAJO	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI		NO	X	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:				
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO		DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	X	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		PROYECTO ESPECIAL			CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI	NO	X	
LATITUD	20.416677000	LONGITUD	-97.164713000							

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS, APERTURA DE CAJA EN TERRACERIAS, CARGA DE MATERIALES, AFINE Y COMPACTACIÓN DE BASE, CIMBRA EN FRONTERA, PAVIMENTO DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO, JUNTA DE DILATACIÓN, CORTE DE PAVIMENTO Y APLICACIÓN DE CURACRETO.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS, APERTURA DE CAJA EN TERRACERIAS, CARGA DE MATERIALES, AFINE Y COMPACTACIÓN DE BASE, CIMBRA EN FRONTERA, PAVIMENTO DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO, JUNTA DE DILATACIÓN, CORTE DE PAVIMENTO Y APLICACIÓN DE CURACRETO.

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
FINIQUITO	\$429,896.98	3	\$429,896.98	R-3	\$431,758.00	\$0.00	\$1,861.02	\$0.00	\$429,896.98
ESTIMACIÓN 2	\$742,665.00	2	\$742,665.00	R-2	\$745,880.00	\$0.00	\$3,215.00	\$0.00	\$742,665.00
TOTALES	\$1,172,561.98		\$1,172,561.98		\$1,177,638.00	\$0.00	\$5,076.02	\$0.00	\$1,172,561.98

MONTO AUTORIZADO:	\$1,177,638.00	C/IVA	
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$1,177,638.00	C/IVA	
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE X	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:			
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE X	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:			
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X	
	LICITACIÓN PÚBLICA		

NO. DE CONTRATO:	MGTZ-LR41-CAPUFE/2018300690412	FECHA:	23/11/2018
CONTRATISTA:	FRANCISCO RAFAEL LÓPEZ GONZÁLEZ		
MONTO CONTRATADO:	\$1,177,638.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	02/01/2019	26/11/2018
	TÉRMINO	31/03/2019	16/01/2019
	DÍAS	0	46
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
FECHA DE PAGO:			

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$431,758.00	07/02/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$745,880.00	29/01/2019
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	17/01/2019

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:
TERMINADA -CAPUFE 2018

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
OBRAS
PÚBLICAS

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$172,413.79	\$200,000.00	
AFIANZADORA:	FIANZAS DORAMA, S.A.	FIANZAS DORAMA, S.A.	
No. DE FIANZA:	19A04176	19A08797	
FECHA:	23/11/2018	16/01/2019	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO	X	FECHA
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$1,177,638.00	C/IVA	

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ALBERTO MORENO NERI
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACIÓN:	15/04/2019
MES QUE SE REPORTA	MARZO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIÉRREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	PALO BLANCO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN TRAMO: UNIVERSIDAD-ENTRONQUE A CAMINO PAGUAS DE ARROYO GRANDE DEL KM 0+000 AL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	CAMINOS Y PUENTES FEDER	No. DE OBRA:	2019300690418		

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		SI	X	NO							
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		CLAVE		N/A		GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
TIPO DE ZONA:	RURAL	URBANA				MUY ALTO	ALTO	MEDIO	X	BAJO	MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:			SI	NO	X	TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:					
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO			SI	X	NO	DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	X		
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		LATITUD		LONGITUD		PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI	NO	X
		20.499522907		-97.113444983							

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

CUNETEO A AMBOS LADOS DE CAMINO, EXTRACCIÓN DE MATERIALES TIPO II (GRAVA DE SABANA) PARA REVESTIMIENTO Y TIPO II (GRAVA DE RIO), ESCARIFICADO DISGREGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO, OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO, OPERACIÓN DE COMPACTADO EN CAPA DE 20 CM DE ESPESOR CON VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO A 90 % PROCTOR CON APLICACIÓN DE

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

CUNETEO A AMBOS LADOS DE CAMINO, EXTRACCIÓN DE MATERIALES TIPO II (GRAVA DE SABANA) PARA REVESTIMIENTO Y TIPO II (GRAVA DE RIO), ESCARIFICADO DISGREGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO, OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO, OPERACIÓN DE COMPACTADO EN CAPA DE 20 CM DE ESPESOR CON VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO A 90 % PROCTOR CON APLICACIÓN DE

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIM UNICA	\$366,515.51	1	\$366,515.51	0000403258	\$368,102.15	\$0.00	\$1,586.65	\$0.00	\$366,515.51
TOTALES	\$366,515.51		\$366,515.51		\$368,102.15	\$0.00	\$1,586.65	\$0.00	\$366,515.51

MONTO AUTORIZADO:	\$368,102.15	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$368,102.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	X	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	X	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE	X	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	MGTZ-LR40CAPUFE/2018300690418	FECHA:	21/12/2018
CONTRATISTA:	FRANCISCO RAFAEL LÓPEZ GONZÁLEZ		
MONTO CONTRATADO:	\$368,102.15		C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	02/01/2019	22/12/2018
	TÉRMINO	31/03/2019	15/03/2019
	DÍAS	73	84
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$368,102.15	08/02/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$0.00	
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	18/03/2019

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	50	80	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	50	80	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	50	80	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TERMINADO - CAPUFE 2018

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRAS
PÚBLICAS

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$104,108.53	\$36,810.22	
AFIANZADORA:	Fianzas Dorama, S.A	Fianzas Dorama, S.A	
No. DE FIANZA:	19A09952	19A09955	
FECHA:	21/12/2018	15/03/2019	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO		FECHA
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	NO APLICA		
		\$368,102.15	5/IVA

Arg. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

NORBERTO JUÁREZ MEJÍA
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACION:	15/04/2019
MES QUE SE REPORTA	MARZO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	EL MORRO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD EL MORRO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES	No. DE OBRA:	2019300690002		

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		SI	X	NO					
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:							
TIPO DE ZONA:	RURAL URBANA	CLAVE AGEB:	N/A	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	X	BAJO	MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI		NO	X	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO		DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	X
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI			
LATITUD	20.434774	LONGITUD	-97.089617	NO	X				

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:	EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIAS, CARGA DE MATERIALES, AFINE Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE, CIMBRA EN FRONTERA, PAVIMENTO DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO, JUNTA DE DILATACIÓN, CORTE DE PAVIMENTO Y APLICACIÓN DE CURACRETO.
---	--

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:	EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIAS, CARGA DE MATERIALES, AFINE Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE, CIMBRA EN FRONTERA, PAVIMENTO DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO, JUNTA DE DILATACIÓN, CORTE DE PAVIMENTO Y APLICACIÓN DE CURACRETO.
---	--

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACIÓN	\$448,060.34	1	\$448,060.34	0000403258	\$450,000.00	\$0.00	\$1,939.66	\$0.00	\$448,060.34
TOTALES	\$448,060.34		\$448,060.34		\$450,000.00	\$0.00	\$1,939.66	\$0.00	\$448,060.34

MONTO AUTORIZADO:	\$450,000.00	C/IVA	
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$450,000.00	C/IVA	
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:			X
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:			X
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	licitación PÚBLICA

NO. DE CONTRATO:	MGZ-RP2019/0002/OP-002	FECHA:	27/02/2019
CONTRATISTA:	FRANCISCO RAFAEL LÓPEZ GONZÁLEZ		
MONTO CONTRATADO:	\$450,000.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	28/02/2019	28/02/2019
	TÉRMINO	30/03/2019	13/03/2019
	DÍAS	31	14
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
FECHA DE PAGO:			

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$450,000.00	13/03/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$0.00	
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	20/03/2019

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:	
----------------	--

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$38,793.10	\$45,000.00	
AFIANZADORA:	Fianzas Dorama, S.A	Fianzas Dorama, S.A	
No. DE FIANZA:	19A08812	19A09987	
FECHA:	27/02/2019	13/03/2019	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO PLAZO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	NO APLICA	INICIAL	FINAL
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRAS:	\$450,000.00	C/IVA	

Arq. ANTONIO ROS PEREZ DIRECTOR DE OBRAS
 RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA SUPERVISOR

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACION:	15/04/2019
MES QUE SE REPORTA	MARZO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	GUTIERREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE COLUMNAS PARA RESTRICCIÓN DE ACCESO VEHICULAR EN CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA DE LA RIVERA Y CALLE MANUEL. GTZ. ZAMORA EN PRIMER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES	No. DE OBRA:	201930069003		

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		SI	X	NO					
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:							
TIPO DE ZONA:	RURAL URBANA	CLAVE AGE:	N/A	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	X
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI		NO	X	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO		DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI	NO	X	
LATITUD	20.449144000	LONGITUD	-97.084734000						

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
DEMOLICIONES DE CONCRETO, EXCAVACIONES, HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO No3, ELABORACION DE DADO, VACIADO DE CONCRETO EN COLUMNAS REFORZADO CON ACERO DIMENSIONES 0.20X0.20 12 VARILLAS ½" ESTRIBUS@15 CM DE 1/4", ELABORACION DE CADENA ARMADA CON VARILLAS DE REFUERZO No 4 DE SECCIÓN 0.25 X 0.25 6 VARILLAS DE ½" ESTRIBUS@15 CM X", GUARNICIONES DE CONCRETO F" C=150KG/CM2 AGREGADO MAX ¾" SECCIÓN 15X20X50 ACABADO CON VOLTEADOR,

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
DEMOLICIONES DE CONCRETO, EXCAVACIONES, HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO No3, ELABORACION DE DADO, VACIADO DE CONCRETO EN COLUMNAS REFORZADO CON ACERO DIMENSIONES 0.20X0.20 12 VARILLAS ½" ESTRIBUS@15 CM DE 1/4", ELABORACION DE CADENA ARMADA CON VARILLAS DE REFUERZO No 4 DE SECCIÓN 0.25 X 0.25 6 VARILLAS DE ½" ESTRIBUS@15 CM X", GUARNICIONES DE CONCRETO F" C=150KG/CM2 AGREGADO MAX ¾" SECCIÓN 15X20X50 ACABADO CON VOLTEADOR,

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACION	\$99,568.97	1	\$99,568.97	0000403258	\$100,000.00	\$0.00	\$431.03	\$0.00	\$99,568.97
TOTALES	\$99,568.97		\$99,568.97		\$100,000.00	\$0.00	\$431.03	\$0.00	\$99,568.97

MONTO AUTORIZADO:	\$100,000.00	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$100,000.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X		
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	MGZ-RP2019/0003/OP-003	FECHA:	26/02/2019
CONTRATISTA:	FRANCISCO RAFAEL LÓPEZ GONZÁLEZ		
MONTO CONTRATADO:	\$100,000.00		C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	27/02/2019	27/02/2019
	TERMINO	30/03/2019	13/03/2019
	DÍAS	32	15
ANTICIPO:	APLICA MONTO:	NO APLICA	X
	FECHA DE PAGO:	PORCENTAJE:	

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$100,000.00	13/03/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$100,000.00	13/03/2019
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	14/03/2019

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	20	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	20	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	20	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		\$8,620.69	\$10,000.00
AFIANZADORA:		Fianzas Dorama, S.A	Fianzas Dorama, S.A
No. DE FIANZA:		19A08810	19A09985
FECHA:		26/02/2019	13/03/2019
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$100,000.00	C/IVA

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

Arq. ANTONIO RÍOS PÉREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ING. LEONEL RODRÍGUEZ RÍOS
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACION:
15/04/2019
MES QUE SE REPORTA
MARZO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: EL MORRO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PUENTE TECOLUTLA - EL MORRO DEL KM 0+000 AL KM 2 + 500
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA: 2019300690101	

ANTECEDENTES:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	GRADO DE REZAGO SOCIAL:
TIPO DE ZONA: RURAL <input checked="" type="checkbox"/> URBANA <input type="checkbox"/>	MUY ALTO <input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BAJO <input type="checkbox"/> MUY BAJO <input type="checkbox"/>
CLAVE AGEB: N/A	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	DIRECTA <input type="checkbox"/> INDIRECTA <input type="checkbox"/> COMPLEMENTARIA <input checked="" type="checkbox"/>
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	PROYECTO ESPECIAL: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
LATITUD: 20.436965000	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
LONGITUD: -97.084993000	

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
CUNETEO A AMBOS LADOS DE CAMINO, EXTRACCIÓN DE MATERIALES TIPO II (GRAVA DE SABANA) PARA REVESTIMIENTO Y TIPO II (GRAVA DE RIO), ESCARIFICADO DISGREGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO, OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO, OPERACIÓN DE COMPACTADO EN CAPA DE 20 CM DE ESPESOR CON VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO A 90 % PROCTOR CON APLICACIÓN DE

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
CUNETEO A AMBOS LADOS DE CAMINO, EXTRACCIÓN DE MATERIALES TIPO II (GRAVA DE SABANA) PARA REVESTIMIENTO Y TIPO II (GRAVA DE RIO), ESCARIFICADO DISGREGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO, OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO, OPERACIÓN DE COMPACTADO EN CAPA DE 20 CM DE ESPESOR CON VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO A 90 % PROCTOR CON APLICACIÓN DE

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACIÓN	\$932,961.21	1	\$932,961.21	A743-A790	\$937,000.00	\$0.00	\$4,038.79	\$0.00	\$932,961.21
TOTALES	\$932,961.21		\$932,961.21		\$937,000.00	\$0.00	\$4,038.79	\$0.00	\$932,961.21

MONTO AUTORIZADO:	\$937,000.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$937,000.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/> INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS <input type="checkbox"/> LICITACIÓN PÚBLICA <input checked="" type="checkbox"/>	EXISTE <input type="checkbox"/>

NO. DE CONTRATO:	MGZ-FISM2019/0101/OP-001	FECHA:	31/01/2019
CONTRATISTA:	ALARHEZ Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$937,000.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	01/02/2019	01/02/2019
	TÉRMINO	30/03/2019	20/02/2019
	DÍAS	58	20
	APLICA	NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANTICIPO:	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$937,000.00	18/02/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$0.00	
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	20/02/2019

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$80,775.86	\$93,700.00	
AFIANZADORA:	SCE Fianzas Monterrey, SCE Fianzas Monterrey, S.		
No. DE FIANZA:	1978270	1978287	
FECHA:	31/01/2019	20/02/2019	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE <input type="checkbox"/>	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO	NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	FECHA
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$937,000.00	C/IVA	

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

Arq. ANTONIO RÍOS PÉREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ALFREDO MORENO NERI
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACIÓN:
15/04/2019
MES QUE SE REPORTA
MARZO

DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	EL MANGO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2019300690102
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: ARROYO GRANDE - EL MANGO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	

ANTECEDENTES:			
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	X	NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:			
TIPO DE ZONA:	RURAL	X	URBANA
CLAVE AGEB:	N/A		
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	NO	X
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI	NO	X
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA			
LATITUD	20.482671000	LONGITUD	-97.122823000
GRADO DE REZAGO SOCIAL:			
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	X
BAJO	MUY BAJO		
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			
DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	X
PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI	NO
			X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
CUNETEO A AMBOS LADOS DE CAMINO, EXTRACCIÓN DE MATERIALES TIPO II (GRAVA DE SABANA) PARA REVESTIMIENTO Y TIPO II (GRAVA DE RIO), ESCARIFICADO DISGREGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO, OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO, OPERACIÓN DE COMPACTADO EN CAPA DE 20 CM DE ESPESOR CON VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO A 90 % PROCTOR CON APLICACIÓN DE

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
CUNETEO A AMBOS LADOS DE CAMINO, EXTRACCIÓN DE MATERIALES TIPO II (GRAVA DE SABANA) PARA REVESTIMIENTO Y TIPO II (GRAVA DE RIO), ESCARIFICADO DISGREGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO, OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO, OPERACIÓN DE COMPACTADO EN CAPA DE 20 CM DE ESPESOR CON VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO A 90 % PROCTOR CON APLICACIÓN DE

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE			FACTURAS				
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACIÓN UN	\$790,045.76	1	\$790,045.76	A742	\$793,465.87	\$0.00	\$3,420.11	\$0.00	\$790,045.76
TOTALES	\$790,045.76		\$790,045.76		\$793,465.87	\$0.00	\$3,420.11	\$0.00	\$790,045.76

MONTO AUTORIZADO:	\$793,465.87	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$793,465.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		X	
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	MGZ-FISM2019/0102/OP-002	FECHA:	31/01/2019
CONTRATISTA:	ALARHEZ Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$793,465.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/02/2019	01/02/2019
	TÉRMINO	30/03/2019	18/02/2019
	DÍAS	58	46
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$793,465.87	18/02/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$793,465.87	18/02/2019
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	20/02/2019

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$68,402.23	\$79,346.58	
AFIANZADORA:	FIANZAS MONTERREY, E FIANZAS MONTERREY,		
No. DE FIANZA:	1978271	1978312	
FECHA:	29/01/2019	18/02/2019	
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$793,465.00	C/IVA	

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

Arg. ANTONIO RIGS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ALFRIDO MORENO NERI
SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACION:
15/04/2019
MES QUE SE REPORTEA
MARZO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	GUTIERREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES RICARDO FLORES MAGON Y FRANCISCO I. MADERO EN COLONIA REVOLUCION
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2019300690103		

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		SI	X	NO					
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:							
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGEB:	N/A	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	X
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	URBANA	SI		NO	X	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	X	SI	X	NO		DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	X
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI	NO	X	
LATITUD	20.446334006	LONGITUD	-97.086695913						

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
DEMOLICIÓN A MANO DE LAVADEROS DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO, EXCAVACIONES EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II PROFUNDIDAD DE 2 M, GHUARNICIONES DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 SECCIÓN 15X20X50, ELABORACIÓN DE LAVADERO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE BARANDAL PASAMANOS A BASE DE TUBO DE ACERO NEGRO DE 1 1/2" A 0.90 M DE ALTURA PINTADO CON ANTICORROSIVO Y

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
DEMOLICIÓN A MANO DE LAVADEROS DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO, EXCAVACIONES EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II PROFUNDIDAD DE 2 M, GHUARNICIONES DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 SECCIÓN 15X20X50, ELABORACIÓN DE LAVADERO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE BARANDAL PASAMANOS A BASE DE TUBO DE ACERO NEGRO DE 1 1/2" A 0.90 M DE ALTURA PINTADO CON ANTICORROSIVO Y

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACION UNO	\$149,353.45	1	\$149,353.45	14-15	\$150,000.00	\$0.00	\$646.55	\$0.00	\$149,353.45
TOTALES	\$149,353.45		\$149,353.45		\$150,000.00	\$0.00	\$646.55	\$0.00	\$149,353.45

MONTO AUTORIZADO:	\$150,000.00	C/IVA			
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$150,000.00	C/IVA			
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:					
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:					
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	licitación pública	EXISTE	X

NO. DE CONTRATO:	MGZ-FISM/2019/0103/OP-003	FECHA:	01/02/2019
CONTRATISTA:	MATEO GÓMEZ GUERRA		
MONTO CONTRATADO:	\$150,000.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	05/02/2019	05/02/2019
	TÉRMINO	30/03/2019	06/03/2019
	DÍAS	54	30
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
FECHA DE PAGO:			

	REPORTE	
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$150,000.00	25/02/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$150,000.00	25/02/2019
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	28/02/2019

AVANCE	AVANCE FÍSICO REAL											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	20	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	20	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	20	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:		\$12,931.03	\$15,000.00	
AFIANZADORA:		FIANZAS MONTERREY, E	FIANZAS MONTERREY,	
No. DE FIANZA:		197860	1978315	
FECHA:		01/02/2019	06/03/2019	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	PLAZO		INICIAL	FINAL
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$150,000.00		C/IVA

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

Arq. ANTONIO RUIZ PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

LUIS JAVIER GONZALEZ LOPEZ
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACIÓN:	15/04/2019
MES QUE SE REPORTA	MARZO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIÉRREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	HERMENEGILDO GALEANA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: LA GALEANA -TRES CRUCES DEL KM 0+000 AL KM 3+000
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2019300690104		

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		SI	X	NO						
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:								
TIPO DE ZONA:	RURAL X	CLAVE AGEB:	N/A	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	X	BAJO	MUY BAJO	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI		NO	X	TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:				
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO		DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	X	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI	NO			X
LATITUD	20.465798235	LONGITUD	-97.164980053							

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
CUNETEO A AMBOS LADOS DE CAMINO, EXTRACCIÓN DE MATERIALES TIPO II (GRAVA DE SABANA) PARA REVESTIMIENTO Y TIPO II (GRAVA DE RIO), ESCARIFICADO DISGREGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO, OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO, OPERACIÓN DE COMPACTADO EN CAPA DE 20 CM DE ESPESOR CON VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO A 90 % PROCTOR CON APLICACIÓN DE

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
CUNETEO A AMBOS LADOS DE CAMINO, EXTRACCIÓN DE MATERIALES TIPO II (GRAVA DE SABANA) PARA REVESTIMIENTO Y TIPO II (GRAVA DE RIO), ESCARIFICADO DISGREGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO, OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO, OPERACIÓN DE COMPACTADO EN CAPA DE 20 CM DE ESPESOR CON VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO A 90 % PROCTOR CON APLICACIÓN DE

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACIÓN 2	\$477,513.22	2	\$477,513.22	A754	\$479,580.38	\$0.00	\$2,067.16	\$0.00	\$477,513.22
ESTIMACIÓN 1	\$754,670.23	1	\$754,670.23	A751	\$757,937.20	\$0.00	\$3,266.97	\$0.00	\$754,670.23
TOTALES	\$1,232,183.45		\$1,232,183.45		\$1,237,517.58	\$0.00	\$5,334.13	\$0.00	\$1,232,183.45

MONTO AUTORIZADO:	\$1,237,517.58	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$1,237,517.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	LICITACIÓN PÚBLICA	EXISTE

NO. DE CONTRATO:	MGZ-FISM2019/0104/OP-004	FECHA:	08/02/2019
CONTRATISTA:	ALARHEZ Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$1,237,517.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	11/02/2019	11/02/2019
	TÉRMINO	30/03/2019	02/03/2019
	DÍAS	48	20
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$479,580.38	05/03/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$757,937.20	25/02/2019
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	06/03/2019

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:		\$106,682.55	\$123,751.76	
AFIANZADORA:		E FIANZAS MONTERREY,	E FIANZAS MONTERREY,	
No. DE FIANZA:		1978271	1978312	
FECHA:		08/02/2019	05/03/2019	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	PLAZO		INICIAL	FINAL
	NO APLICA			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$1,237,517.00		C/IVA

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ DIRECTOR DE OBRAS
 NORBERTO SUÁREZ MEJIA SUPERVISOR
 FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACIÓN:	15/04/2019
MES QUE SE REPORTA	MARZO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: HERMENEGILDO GALEANA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: LA GALEANA -ZAPOTAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA: 2019300690105	

ANTECEDENTES:					
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO					
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:					
TIPO DE ZONA: RURAL X URBANA	CLAVE AGEB: N/A				
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO	SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI X NO				
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA					
LATITUD: 20.461949841	LONGITUD: -97.161517877				
GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	X	BAJO	MUY BAJO
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:					
DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	X		
PROYECTO ESPECIAL:					
CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI	NO	X		

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
CUNETEO A AMBOS LADOS DE CAMINO, EXTRACCIÓN DE MATERIALES TIPO II (GRAVA DE SABANA) PARA REVESTIMIENTO Y TIPO II (GRAVA DE RIO), ESCARIFICADO DISGREGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO, OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO, OPERACIÓN DE COMPACTADO EN CAPA DE 20 CM DE ESPESOR CON VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO A 90 % PROCTOR CON APLICACIÓN DE

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
CUNETEO A AMBOS LADOS DE CAMINO, EXTRACCIÓN DE MATERIALES TIPO II (GRAVA DE SABANA) PARA REVESTIMIENTO Y TIPO II (GRAVA DE RIO), ESCARIFICADO DISGREGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO, OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO, OPERACIÓN DE COMPACTADO EN CAPA DE 20 CM DE ESPESOR CON VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO A 90 % PROCTOR CON APLICACIÓN DE

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACIÓN UN	\$800,579.29	1	\$800,579.29	A755	\$804,045.00	\$0.00	\$3,465.71	\$0.00	\$800,579.29
TOTALES	\$800,579.29		\$800,579.29		\$804,045.00	\$0.00	\$3,465.71	\$0.00	\$800,579.29

MONTO AUTORIZADO:	\$804,045.00	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$804,045.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		X	
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	MGZ-FISM2019/0105/OP-005	FECHA:	14/02/2019
CONTRATISTA:	ALARHEZ Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$804,045.00		C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	15/02/2019	15/02/2019
	TÉRMINO	30/03/2019	06/03/2019
	DÍAS	44	20
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

	REPORTE	
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$804,045.00	05/03/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$804,045.00	05/03/2019
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	08/03/2019

AVANCE	AVANCE FÍSICO REAL											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	70	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	70	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	70	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:		\$69,314.22	\$80,404.50	
AFIANZADORA:		FIANZAS MONTERREY, E FIANZAS MONTERREY,		
No. DE FIANZA:		1978284	1978317	
FECHA:		14/02/2019	06/03/2019	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	PLAZO		INICIAL	FINAL
	NO APLICA			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$804,045.00	C/IVA	

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ DIRECTOR DE OBRAS
ING. LEONEL RODRIGUEZ RIOS SUPERVISOR

FORMATO 11



**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACIÓN:	15/04/2019
MES QUE SE REPORTA	MARZO

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: GUTIERREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE SANITARIOS, COCINA COMEDOR Y BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO CLAVE: 30EJN0241Y
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES F	No. DE OBRA: 2019300690106	

ANTECEDENTES:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> NO	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	GRADO DE REZAGO SOCIAL:
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA X	MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO X
CLAVE AGEB: 0151	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> X	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> X	DIRECTA INDIRECTA COMPLEMENTARIA X
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X
LATITUD 20.443828722 LONGITUD -97.087217691	

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, CONTRUCCIÓN DE MUROS, CASTILLOS ARMADOS, APLANADOS EN MUROS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJANTES, COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS, DEMOLICIÓN DE LOSETA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETAS, PINTURA EN MUROS.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, CONTRUCCIÓN DE MUROS, CASTILLOS ARMADOS, APLANADOS EN MUROS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJANTES, COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS, DEMOLICIÓN DE LOSETA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETAS, PINTURA EN MUROS.

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACIÓN	\$646,800.00	1	\$646,800.00	A880	\$649,600.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$646,800.00
TOTALES	\$646,800.00		\$646,800.00		\$649,600.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$646,800.00

MONTO AUTORIZADO:	\$649,600.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$649,600.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		EXISTE
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	X

NO. DE CONTRATO:	MGZ-FISM2019/0106/OP-006	FECHA:	28/02/2019
CONTRATISTA:	ROMA ASC S.A DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$649,600.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA REAL		
	INICIO 01/03/2019	01/03/2019	
	TÉRMINO 30/03/2019	12/03/2019	
	DÍAS 30	12	
ANTICIPO:	APLICA MONTO: NO APLICA	X	
	FECHA DE PAGO: PORCENTAJE:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$649,600.00	12/03/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$649,600.00	12/03/2019
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	15/03/2019

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		\$56,000.00	\$64,960.00
AFIANZADORA:		E FIANZAS MONTERREY, S	E FIANZAS MONTERREY, S
No. DE FIANZA:		1978290	1978326
FECHA:		28/02/2019	12/03/2019
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO	INICIAL	FINAL
	PLAZO		
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$649,600.00	C/IVA

Arg. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ING. LUIS JAVIER PROSTICO LOPEZ
SUPERVISOR

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACIÓN:	15/04/2019
MES QUE SE REPORTA	MARZO

DATOS GENERALES	
MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA LOCALIDAD: RAFAEL VALENZUELA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN SECCION DE CALLES MELCHOR OCAMPO ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CAMINOS Y PUENTES FEDER No. DE OBRA: 2019300690404	

ANTECEDENTES:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO	GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO X MUY BAJO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: TIPO DE ZONA: RURAL URBANA CLAVE AGE: N/A	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA INDIRECTA COMPLEMENTARIA X
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO	PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI X NO	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA: LATITUD 20.407376540 LONGITUD -97.127479001	

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIAS, CARGA DE MATERIALES, AFINE Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE, CIMBRA EN FRONTERA, PAVIMENTO DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO, JUNTA DE DILATACIÓN, CORTE DE PAVIMENTO Y APLICACIÓN DE CURACRETO.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIAS, CARGA DE MATERIALES, AFINE Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE, CIMBRA EN FRONTERA, PAVIMENTO DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO, JUNTA DE DILATACIÓN, CORTE DE PAVIMENTO Y APLICACIÓN DE CURACRETO.

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
FINIQUITO	\$7,909.26	4	\$7,909.26	B93-R4	\$7,943.50	\$0.00	\$34.24	\$0.00	\$7,909.26
ESTIMACION 3	\$1,100,884.27	3	\$1,100,884.27	B93-R3	\$1,105,650.00	\$0.00	\$4,765.73	\$0.00	\$1,100,884.27
TOTALES	\$1,108,793.53		\$1,108,793.53		\$1,113,593.50	\$0.00	\$4,799.97	\$0.00	\$1,108,793.53

MONTO AUTORIZADO:	\$1,113,593.50	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$1,113,593.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PUBLICA	EXISTE X

NO. DE CONTRATO:	MGTZ-LR35-CAPUFE/2018300690404	FECHA:	16/11/2018
CONTRATISTA:	JOSÉ DE JESÚS TOLENTINO DORANTES		
MONTO CONTRATADO:	\$3,085,111.70	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	02/01/2019	19/11/2018
	TÉRMINO	31/03/2019	15/03/2019
	DÍAS	89	103
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$1,113,593.50	21/03/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$1,105,650.00	15/03/2019
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	20/03/2019

AVANCE FISICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	50	80	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	50	80	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	50	80	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:
OBRA TERMINADA -CAPUFE 2018

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$301,724.14	\$308,511.17	
AFIANZADORA:	FIRTA, S.A DE C.V. Grupo Firta, S.A DE C.V. Grupo Firta		
NO. DE FIANZA:	1166-00566-3	1166-00606-6	
FECHA:	16/11/2018	15/03/2019	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO FECHA
	PLAZO	X	INICIAL 02/01/2019 FINAL 15/03/2019 02/01/2019
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$3,085,111.70		C/IVA

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIERREZ ZAMORA, VER. 2018-2021 OBRAS PUBLICAS

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ DIRECTOR DE OBRAS

ROBERTO JUAREZ MEJIA SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACION:
15/04/2019
MES QUE SE REPORTA
MARZO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS ENTRE "EL FALSO Y CEMENTERIO DE SANTA ROSA" DEL KM 0+000 AL KM
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	CAMINOS Y PUENTES FEDER	No. DE OBRA:	2019300690412		

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		SI	X	NO					
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:									
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGE:	N/A	GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
	URBANA			MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	X	MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI		NO	X	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO		DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	X
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		PROYECTO ESPECIAL			CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI	NO	X
LATITUD	20.416677000	LONGITUD	-97.164713000						

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS, APERTURA DE CAJA EN TERRACERIAS, CARGA DE MATERIALES, AFINE Y COMPACTACIÓN DE BASE, CIMBRA EN FRONTERA, PAVIMENTO DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO, JUNTA DE DILATACIÓN, CORTE DE PAVIMENTO Y APLICACIÓN DE CURACRETO.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS, APERTURA DE CAJA EN TERRACERIAS, CARGA DE MATERIALES, AFINE Y COMPACTACIÓN DE BASE, CIMBRA EN FRONTERA, PAVIMENTO DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO, JUNTA DE DILATACIÓN, CORTE DE PAVIMENTO Y APLICACIÓN DE CURACRETO.

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
FINIQUITO	\$429,896.98	3	\$429,896.98	R-3	\$431,758.00	\$0.00	\$1,861.02	\$0.00	\$429,896.98
ESTIMACIÓN 2	\$742,665.00	2	\$742,665.00	R-2	\$745,880.00	\$0.00	\$3,215.00	\$0.00	\$742,665.00
TOTALES	\$1,172,561.98		\$1,172,561.98		\$1,177,638.00	\$0.00	\$5,076.02	\$0.00	\$1,172,561.98

MONTO AUTORIZADO:	\$1,177,638.00	C/IVA	
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$1,177,638.00	C/IVA	
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE X	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:			
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE X	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:			
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X	
	LICITACIÓN PÚBLICA		

NO. DE CONTRATO:	MGTZ-LR41-CAPUFE/2018300690412	FECHA:	23/11/2018
CONTRATISTA:	FRANCISCO RAFAEL LÓPEZ GONZÁLEZ		
MONTO CONTRATADO:	\$1,177,638.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	02/01/2019	26/11/2018
	TÉRMINO	31/03/2019	16/01/2019
	DÍAS	0	46
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
FECHA DE PAGO:			

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$431,758.00	07/02/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$745,880.00	29/01/2019
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	17/01/2019

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:
TERMINADA -CAPUFE 2018

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
OBRAS
PÚBLICAS

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS		
MONTO AFIANZADO:	\$172,413.79	\$200,000.00			
AFIANZADORA:	FIANZAS DORAMA, S.A.		FIANZAS DORAMA, S.A.		
No. DE FIANZA:	19A04176	19A08797			
FECHA:	23/11/2018	16/01/2019			
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA	
	PLAZO	X	INICIAL	FINAL	
	NO APLICA		02/01/2019	16/01/2019	02/01/2019
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$1,177,638.00	C/IVA			

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ALBERTO MORENO NERI
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACIÓN:	15/04/2019
MES QUE SE REPORTA	MARZO

DATOS GENERALES	
MUNICIPIO: GUTIÉRREZ ZAMORA LOCALIDAD: PALO BLANCO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN TRAMO: UNIVERSIDAD-ENTRONQUE A CAMINO PAGUAS DE ARROYO GRANDE DEL KM 0+000 AL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CAMINOS Y PUENTES FEDER No. DE OBRA: 2019300690418	

ANTECEDENTES:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	GRADO DE REZAGO SOCIAL:
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA CLAVE AGEB: N/A	MUY ALTO ALTO MEDIO X BAJO MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI NO X	TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO SI X NO	DIRECTA INDIRECTA COMPLEMENTARIA X
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X
LATITUD 20.499522907 LONGITUD -97.113444983	

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
CUNETEO A AMBOS LADOS DE CAMINO, EXTRACCIÓN DE MATERIALES TIPO II (GRAVA DE SABANA) PARA REVESTIMIENTO Y TIPO II (GRAVA DE RIO), ESCARIFICADO DISGREGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO, OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO, OPERACIÓN DE COMPACTADO EN CAPA DE 20 CM DE ESPESOR CON VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO A 90 % PROCTOR CON APLICACIÓN DE

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
CUNETEO A AMBOS LADOS DE CAMINO, EXTRACCIÓN DE MATERIALES TIPO II (GRAVA DE SABANA) PARA REVESTIMIENTO Y TIPO II (GRAVA DE RIO), ESCARIFICADO DISGREGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO, OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO, OPERACIÓN DE COMPACTADO EN CAPA DE 20 CM DE ESPESOR CON VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO A 90 % PROCTOR CON APLICACIÓN DE

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIM UNICA	\$366,515.51	1	\$366,515.51	0000403258	\$368,102.15	\$0.00	\$1,586.65	\$0.00	\$366,515.51
TOTALES	\$366,515.51		\$366,515.51		\$368,102.15	\$0.00	\$1,586.65	\$0.00	\$366,515.51

MONTO AUTORIZADO:	\$368,102.15	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$368,102.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE X NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE X NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	EXISTE X

NO. DE CONTRATO:	MGTZ-LR40CAPUFE/2018300690418	FECHA:	21/12/2018
CONTRATISTA:	FRANCISCO RAFAEL LÓPEZ GONZÁLEZ		
MONTO CONTRATADO:	\$368,102.15		C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	02/01/2019	22/12/2018
	TÉRMINO	31/03/2019	15/03/2019
	DÍAS	73	84
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
MONTO PAGADO EN EL MES:	EXISTE \$368,102.15	FECHAS 08/02/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$0.00	
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	18/03/2019

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	50	80	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	50	80	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	50	80	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TERMINADO - CAPUFE 2018

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRAS PÚBLICAS

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$104,108.53	\$36,810.22	
AFIANZADORA:	Fianzas Dorama, S.A	Fianzas Dorama, S.A	
No. DE FIANZA:	19A09952	19A09955	
FECHA:	21/12/2018	15/03/2019	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE IMPORTE/PERIODO	FECHA
	PLAZO	INICIAL FINAL	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	NO APLICA		
		\$368,102.15	5/IVA

Arg. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

NORBERTO JUÁREZ MEJÍA
SUPERVISOR

FORMATO 11
