

INFORME TRIMESTRAL

ÁREA DE COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

TRIMESTRE:IV

***MESES:
OCTUBRE-NOVIEMBRE-
DICIEMBRE***

AÑO: 2019

“AMPLIACION DE EMISOR DE SALIDA DE LA PTAR EN EL EJIDO LOS ANGELES (400 mts) 2ª INVITACIÓN”

Empresa Ganadora: CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V.

Contrato N° SAPSAM-AD-OB-017-2019.

Monto Contratado: \$ 1,117,351.51. INCLUYE IVA

Monto Contratado: \$ 1,117,351.41. INCLUYE IVA

Avance Físico: 100.00%

Avance Financiero: 100.00% . Terminada

PLAZO DE EJECUCIÓN: 61 DÍAS NATURALES		
FECHAS	INICIO	TERMINACIÓN
PROGRAMADA:	08-ago-19	07-oct-19
REAL:	08-ago-19	07-oct-19

Nota: Construcción de 400 ml de tubería de polietileno de alta densidad de doble pared para alcantarillado sanitario de 30" y 6 Pozos de visita tipo especial.



“REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN BOULEVARD CARLOS LASSO”

Empresa Ganadora: ING. CLAUDIO PEREZ RANGEL
Contrato No. SAPSAM-AD-SROB-019-2019
Monto Contratado \$ 199,410.53 . INCLUYE IVA
Monto Ejecutado \$ 212,318.98 . INCLUYE IVA

PLAZO DE EJECUCIÓN: 61 DÍAS NATURALES

FECHAS	INICIO	TERMINACIÓN
PROGRAMADA:	15-ago-19	14-oct-19
REAL:	16-ago-19	29-oct-19

Avance Físico: 100.00%

Avance Financiero: 100.00% (Convenio de modificación en Monto y Tiempo)

Nota: DESCONEXIÓN SUMINISTRO, COLOCACIÓN DESCONEXIÓN DE RED ANTIGUA Y CONEXIÓN DE NUEVO TENDIDO ELÉCTRICO DE CANALIZACIONES A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA, DESDE NUEVO CENTRO DE CARGA CON SUS RESPECTIVOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y ATERRIZADO A TIERRAS, INCLUYENDO ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN MURO, PEINADO DE CABLES E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES, TOMA CORRIENTE, LUMINARIAS Y ACCESORIOS NECESARIO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.



Comparación de Precios (Shopping).
No. SAPSAM-PRODI-AA-824020999-E1-2019

“CORRECCIÓN DE ERRORES DE MEDICIÓN MEDIANTE LA SUSTITUCIÓN DE 415
MICROMEDIDORES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA”

Empresa Ganadora: : MARTELEC, S.A DE C.V.
Contrato No. SAPSAM-PRODI-AA-824020999-E1-2019
Monto Contratado \$ 502,213.10 . INCLUYE IVA
Monto Ejecutado \$502,213.10. INCLUYE IVA

Avance Físico: 100.00%
Avance Financiero: 100.00%

Nota: SUSTITUCIÓN DE 415 MICROMEDIDORES EN CUADRO Y 15 MODIFICACIONES CON MICROMEDIDOR.

PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 DÍAS NATURALES	
FECHAS	INICIO	TERMINACIÓN
PROGRAMADA:	17-sep-19	15-dic-19

Antes



Después



“3era. ETAPA DE SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE.”

Empresa Ganadora: PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.


Contrato No. SAPSAM-LPE-OB-022-2019.

Monto Contratado \$ \$9,442,794.70. INCLUYE IVA

PLAZO DE EJECUCIÓN:	406 DÍAS NATURALES	
FECHAS	INICIO	TERMINACIÓN
PROGRAMADA:	22-oct-19	30-nov-20

Avance Físico: 39.80% (Adquisición de Suministros y Piezas Especiales)

Avance Financiero: 37.95% (Pago del Anticipo y Estimación N°1)

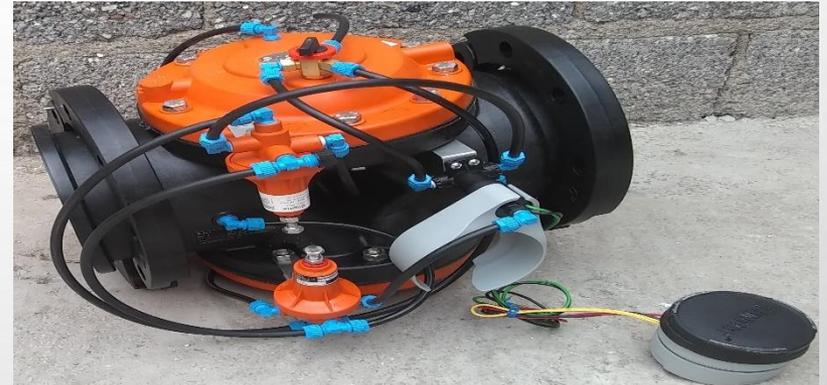

**“Construcción de redes de agua potable y alcantarillado sanitario en la Avenida las Torres^{GIC}
(tramo Justos Sierra-Fray Bartolomé de las Casas).”**

**Empresa Ganadora: ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YÁÑEZ.
Contrato No. SAPSAM-IR-OB-023-2019
Contrato Monto Contratado \$ 2,500,595.02 INCLUYE IVA.**

Avance Físico: AGUA POTABLE 90.00 %

DRENAJE SANITARIO: 95.00%

Avance Financiero: 70.62% (Pago de Anticipo y Estimación N° 1)



“ESTUDIO PARA IDENTIFICACIÓN DE PERDIDAS FÍSICAS Y MEDICIÓN EN EL ACUEDUCTO CEDRAL-MATEHUALA.”

Empresa Ganadora: JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ

Contrato: SAPSAM-AD-SROB-025-2019

Contrato Monto Contratado \$ 224,740.35, INCLUYE IVA.

Avance Físico: 95%

Avance Financiero: 0.00% (No Aplica pago de anticipo)

Existe un primer convenio en tiempo, sin embargo, a la fecha no se ha entregado ninguna información y no se ha realizado ningún trámite de pago.

PLAZO DE EJECUCIÓN:	45 DÍAS NATURALES	
FECHAS	INICIO	TERMINACIÓN
PROGRAMADA:	09-oct-19	22-nov-19
REAL:	09-oct-19	03-dic-19



“CONSTRUCCIÓN DE CINCO POZOS DESARENADORES EN DIFERENTES CRUCEROS DE LA CIUDAD DE MATEHUALA S.L.P.”

Empresa Ganadora: ING. JOSE VICENTE ACEVEDO OROZCO

Contrato: SAPSAM-AD-OB-029-2019

Monto Contratado \$ 238,573.63 , INCLUYE IVA.

Avance Físico: 20%

Avance Financiero: 30.00% (Pago de Anticipo)

Convenio en tiempo.

PLAZO DE EJECUCIÓN:	44 DÍAS NATURALES	
FECHAS	INICIO	TERMINACIÓN
PROGRAMADA:	03-dic-19	15-ene-20
REAL:	03-dic-19	26-ene-20



“ACCIONES EJECUTADAS POR INSTRUCCIONES.”

•COMISIONES.

•Supervisión de construcción de tanque de Mampostería, Carretera a la Paz km N° 3



Décima Reunión de CORESE



APARTADO PRODI, 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019



ANEAS

• ANEAS CURSOS Y TALLERES

-
- **11 DE NOVIEMBRE 2019.**
- **9:00-18:00 Eficiencia Energética**
- Ing. Héctor Martínez

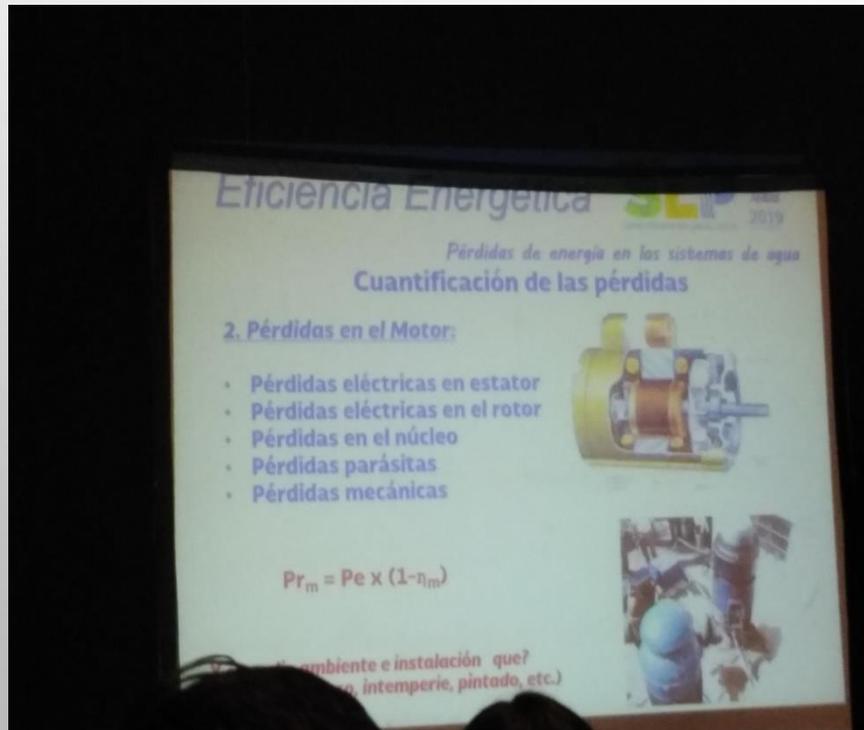

APOYO AL ÁREA DE COORDINACION DE CONSTRUCCIÓN-COMERCIAL

DIRECCION	FECHA	CUADRILLA 1				CUADRILLA 2				OBSERVACION
		Francisco Herrera Zepeda	Luís Roberto López Medina	Bernardino Casares Landeros	David Escalante Garza	Pedro Luis Olvera Bracamonte				
		TONAS	DESCARG	HEBIDO	DACHE	TONAS	DESCAR	HEBIDO	DACHE	
LIBERTAD 205 A NTE	19 de noviembre de 2019	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DRENAJE POR AZOLVE Y COLAPSO NO
CARRETERA 57 N' 702	19 de noviembre de 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	TOMA DE AGUA
NEGRETE 407	20 de noviembre de 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	TOMA DE AGUA
HIDALGO 1701 B	20 de noviembre de 2019	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	22/11
SAN BENITO 109	20 Y 21 de Noviembre 2019	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		INSTALACION
NEGRETE 518 A	21 de noviembre de 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	TOMA DE AGUA
RIO JORDAN 210	21 de noviembre de 2019	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ARTEAGA 15	21 de noviembre de 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	HUNDIMIENTO
REGULES 726	21 de noviembre de 2019	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ASFALTO
REP. DE BOLIVIA 105	21 Y 22 de Noviembre 2019	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	TOMA DE AGUA Y DESCARGA A POZO
RIO GRIJALVA 309	22 de noviembre de 2019	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONEXIÓN
FRANCISCO I MADERO 4	22 de noviembre de 2019	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	REPORTE, SE EFECTUO CON CONCRETO
FRANCISCO I MADERO 4	22 de noviembre de 2019	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	REPORTE, SE EFECTUO CON CONCRETO
PROLLERDO DE TEJADA	22 de noviembre de 2019	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONCRETO
PROLLERDO DE TEJADA	22 de noviembre de 2019	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	CONCRETO
NUEVO LEON 803 A	23 de noviembre de 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
NUEVO LEON 807	23 de noviembre de 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
PALMA NEGRA 1520	25 de noviembre de 2019	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
RIO YAQUI 201 B	25 de noviembre de 2019	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EUCALIPTOS 512	26 de noviembre de 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	CONCRETO
SAN FRANCISCO 36	26 de noviembre de 2019	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AGUASCALIENTES 906	26 de noviembre de 2019	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ANTONIO HERNANDEZ 10	27 de noviembre de 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	USUARIO EFECTUO EXCAVACION
HIDALGO 818 B NTE	27 de noviembre de 2019	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DERIVACION TOMA LAS MALVINAS 55MTS
REGULES 324	27 de noviembre de 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EFECTUO POR TUBO FOGO
ALTAMIRANO 102B	27 Y 28 de Noviembre 2019	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	HORARIO NOCTURNO
INDEPENDENCIA 1102 A M	28 Y 29 de Noviembre 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	HORARIO NOCTURNO
AV. MANTI 211	29 de noviembre de 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
INDEPENDENCIA 1102 A M	29 de noviembre de 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
RIO BRAVO 201	30 de noviembre de 2019	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INDEPENDENCIA 1102 A M	2 de diciembre de 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
HIDALGO 818 B NTE	2 de diciembre de 2019	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
PROL MATAMOROS 707	3 de diciembre de 2019	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	PENDIENTE COLOCAR MEDIDOR EN CAJA
JULIAN CARRILLO	4 de diciembre de 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
REACOMODO DE TUBER	4 de diciembre de 2019	12 ML	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CUADRILLA A PRESTAMO	4 de diciembre de 2019	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	ARMANDO CON SEGUNDO
JULIAN CARRILLO	5 de diciembre de 2019	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
CUADRILLA A PRESTAMO	5 de diciembre de 2019	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	ARMANDO CON SEGUNDO

Onceava Reunión de CORESE

APARTADO PRODI, 06 DE Diciembre de 2019



APOYO AL ÁREA DE COORDINACION DE CONSTRUCCIÓN-COMERCIAL

Bacheos



Calle Julián Carrillo.



INFORME TRIMESTRAL

ÁREA DE COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

TRIMESTRE:IV

**MESES:
OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE**

AÑO: 2018

Elaboro.

Recibido.

Ing. Joel Blas Muñoz Loreda.
Coordinador de Supervisión.

Secret^a Brenda Carranza Contreras.
Recepción de Dirección General
