

INFORME DE SUPERVISION DE OBRA

DIRECCIÓN DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

REAL PROGRAMADC		
AVANC FÍSICO	100	100
AVANC JANCIE	100	100


No. REPORTE :	1
FECHA REPORTE :	03/10/2023

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE :		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES GUADALUPE Y DIAZ ORDAZ EN LA COMUNIDAD DE TIERRITAS BLANCAS, VILLA GARCÍA, ZAGATECAS	
UBICACIÓN :	CABECERA MUNICIPAL	TIPO DE OBRA :	NUOVA
MODALIDAD EJEC.:	ADJUDICACION DIRECTA	No. CONTRATO :	CTO. NO. 8 INV-G-27-07-2023
EMPRESA :	IVAN FRANCISCO BELTRAN GAREZA	MONTO CONTRATO :	\$ 1,236,617.51
FECHA CONTRATO :	27/07/2023	MONTO ANTICIPO :	\$ 370,985.25
FECHA PAGO ANTICIPO :	0-ene-00	No. AMPL. DE CONTRATO :	N/A
MONTO AMPL. CONTRATO :	N/A	FECHA AMPL. CONTRATO :	N/A
PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO	TERM.	
FECHAS PROGRAMADAS :	28-jul-23	8-sep-23	
FECHAS REALES :	28-jul-23	8-sep-23	

OBSERVACIONES :

PARTIDAS	IMPORTE	MESES												DIAS	% EN BASE TIEMPO
		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE											
PRELIMINARES \$ 5,336.51		[Gantt chart showing work progress from July to September]													
DESPLALME		[Gantt chart showing work progress from July to September]													
ACARREO DE MATERIALES		[Gantt chart showing work progress from July to September]													
RELLENO Y COMPACTACIÓN		[Gantt chart showing work progress from July to September]													
SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPEDRADO HIDRAULICO		[Gantt chart showing work progress from July to September]													
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA		[Gantt chart showing work progress from July to September]													
SUB-TOTAL	\$ 5,336.51														
16% I.V.A.	\$ 853.84														
TOTAL	\$ 6,190.35														



DIRECTOR OBRAS PUBLICAS
HUMBERTO AGUILAR DA VILA


SUPERVISOR DE OBRA
J. A. G. J.
JORGE ADRIÁN BASTIDA GOMEZ



MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

INFORME FOTOGRÁFICO

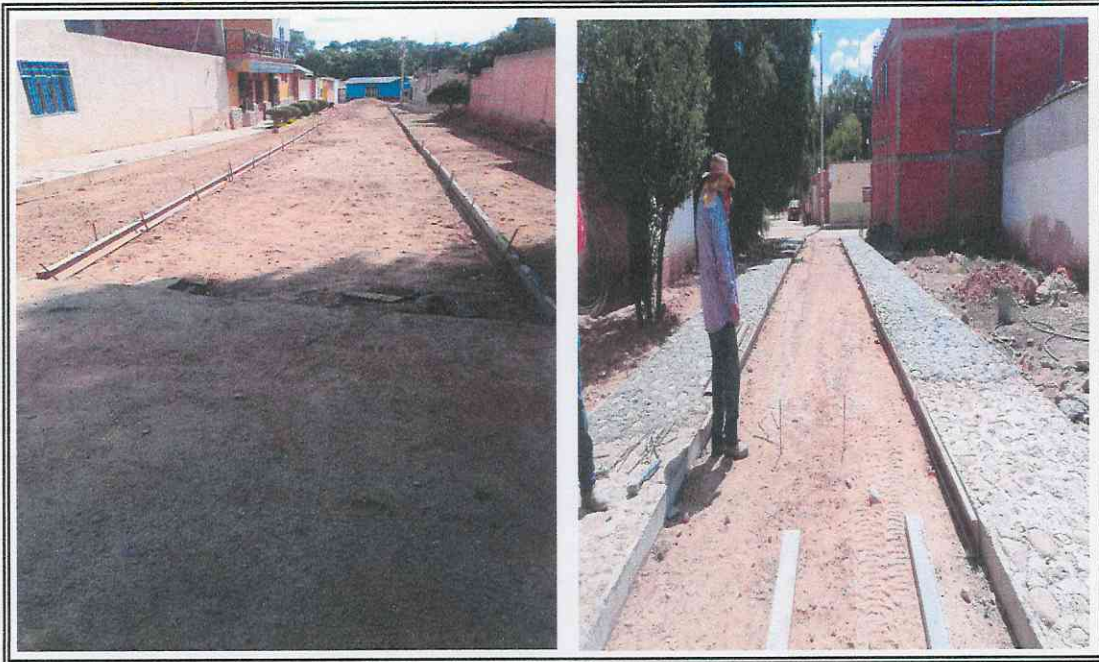

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES GUADALUPE Y
DÍAZ ORDAZ EN LA COMUNIDAD DE TIERRITAS BLANCAS, VILLA GARCIA,
ZACATECAS

OBRA:

LOCALIDAD:

PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO

FECHA

PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

100

CABECERA MUNICIPAL

28-jul-23 TERMINO

8-sep-23

martes, 3 de octubre de 2023

BITÁCORA DE OBRA.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES GUADALUPE Y DIAZ ORDAZ EN LA COMUNIDAD DE TIERRITAS BLANCAS, VILLA GARCIA, ZACATECAS

Nota 1: Se da el inicio de la obra con la limpieza, trazo y nivelación del terreno, estableciendo los ejes de referencia y bancos de nivel.

Nota 2: Se continúan los trabajos de excavación con medios mecánicos, así como el acarreo de materiales fuera de la obra.

Nota 3: Se inicia con trabajos de afine y compactación del terreno natural para dar a nivel subrasante.

Nota 4: Se continúan con los trabajos de relleno y compactación de material inerte de banco autorizado (tepetate), con medios mecánicos, en capas de 10 a 15 cms de espesor, puesto en obra medido compactado con la humedad suficiente.

Nota 5: Se da inicio con la colocación de empedrado con concreto hidráulico $f'c=250$ kg/cm² premezclado de 15 cm de espesor T.M.A. 3/4" y piedra de río de tamaño promedio de 13 cm.

Nota 6: Se continúa con la colocación del empedrado.

Nota 7: Se inicia la colocación de lozas de concreto hidráulico $f'c=250$ kg/cm² premezclado de 15 cm de espesor T.M.A. 3/4. Se da por terminado la colocación del empedrado con concreto hidráulico.

Nota 8: Se continúa con el colado de lozas de concreto hidráulico $f'c=250$ kg/cm² premezclado de 15 cm de espesor T.M.A. 3/4.

Nota 9: Se finaliza el colado de lozas de concreto.

Nota 10: Se realizan trabajos de limpieza general de la obra, y se dan por terminada la misma.
