

DIRECCIÓN DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

No. REPORTE:	1
FECHA REPORTE:	07/07/2023

REAL PROGRAMADO	
AVANC	
F/SICO	100
MANCIE	100

NOMBRE : AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES SAN FELICIANO, SAN JOSE, LA UNIDAD, SANTA FE, SAN PEDRO Y SAN PABLO DE LA COLONIA LOS HUESOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA, ZACATECAS			
UBICACIÓN :	COLONIA LOS HUESOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL	AMPLIACION	
TIPO DE OBRA :			
MODALIDAD EJEC.:	ADJUDICACION DIRECTA		
No.CONTRATO :	OTO. NO. 2 MVG-10-04-2023		
EMPRESA :	JOSE GUADALUPE CENDEJAS MONREAL		
MONTO CONTRATO :	\$	1,492,509.99	
FECHA CONTRATO :		10/04/2023	
MONTO ANTICIPO :	\$	-	
FECHA PAGO ANTICIPO :		0-ene-00	
No. AMPL. DE CONTRATO:	N/A		
MONTO AMPL. CONTRATO:	N/A		
FECHA AMPL. CONTRATO:	N/A		
PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO	TERM.	
FECHAS PROGRAMADAS :	10-abr-23	10-jun-23	
FECHAS REALES :	10-abr-23	10-jun-23	
FECHAS REPROGRAMADAS :			

[illegible]

PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA						MESES							% EN BASE TIEMPO
PARTIDAS	IMPORTES	ABRIL	MAYO	JUNIO		DIAS							
LETREIRO	\$ 3,845.38	[Bar Chart]											
PRELIMINARES	\$ 19,984.82	[Bar Chart]											
EXCAVACIONES	\$ 284,975.20	[Bar Chart]	[Bar Chart]										
CARGA Y ACARREO	\$ 71,839.96	[Bar Chart]	[Bar Chart]										
PLANTILLA Y RELLENOS	\$ 182,646.51		[Bar Chart]										
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS	\$ 454,719.57		[Bar Chart]										
POZOS DE VISITA	\$ 195,472.70		[Bar Chart]										
DESCARGAS DOMICILIARIAS	\$ 73,182.40												
SUB-TOTAL	\$ 1,286,646.54												
16% I.V.A.	\$ 205,863.45												
TOTAL	\$ 1,492,509.99												

SUPERVISOR DE OBRA

DIRECTOR OBRAS PUBLICAS

The seal of the Municipality of Villa García, Zac. is a circular emblem. It features a central figure, possibly a saint or a historical figure, surrounded by a wreath. The text "MUNICIPIO DE VILLA GARCIA, ZAC." is inscribed around the perimeter of the seal.

000205


OPERADO FISM



MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OPERADO
FISM

INFORME FOTOGRÁFICO

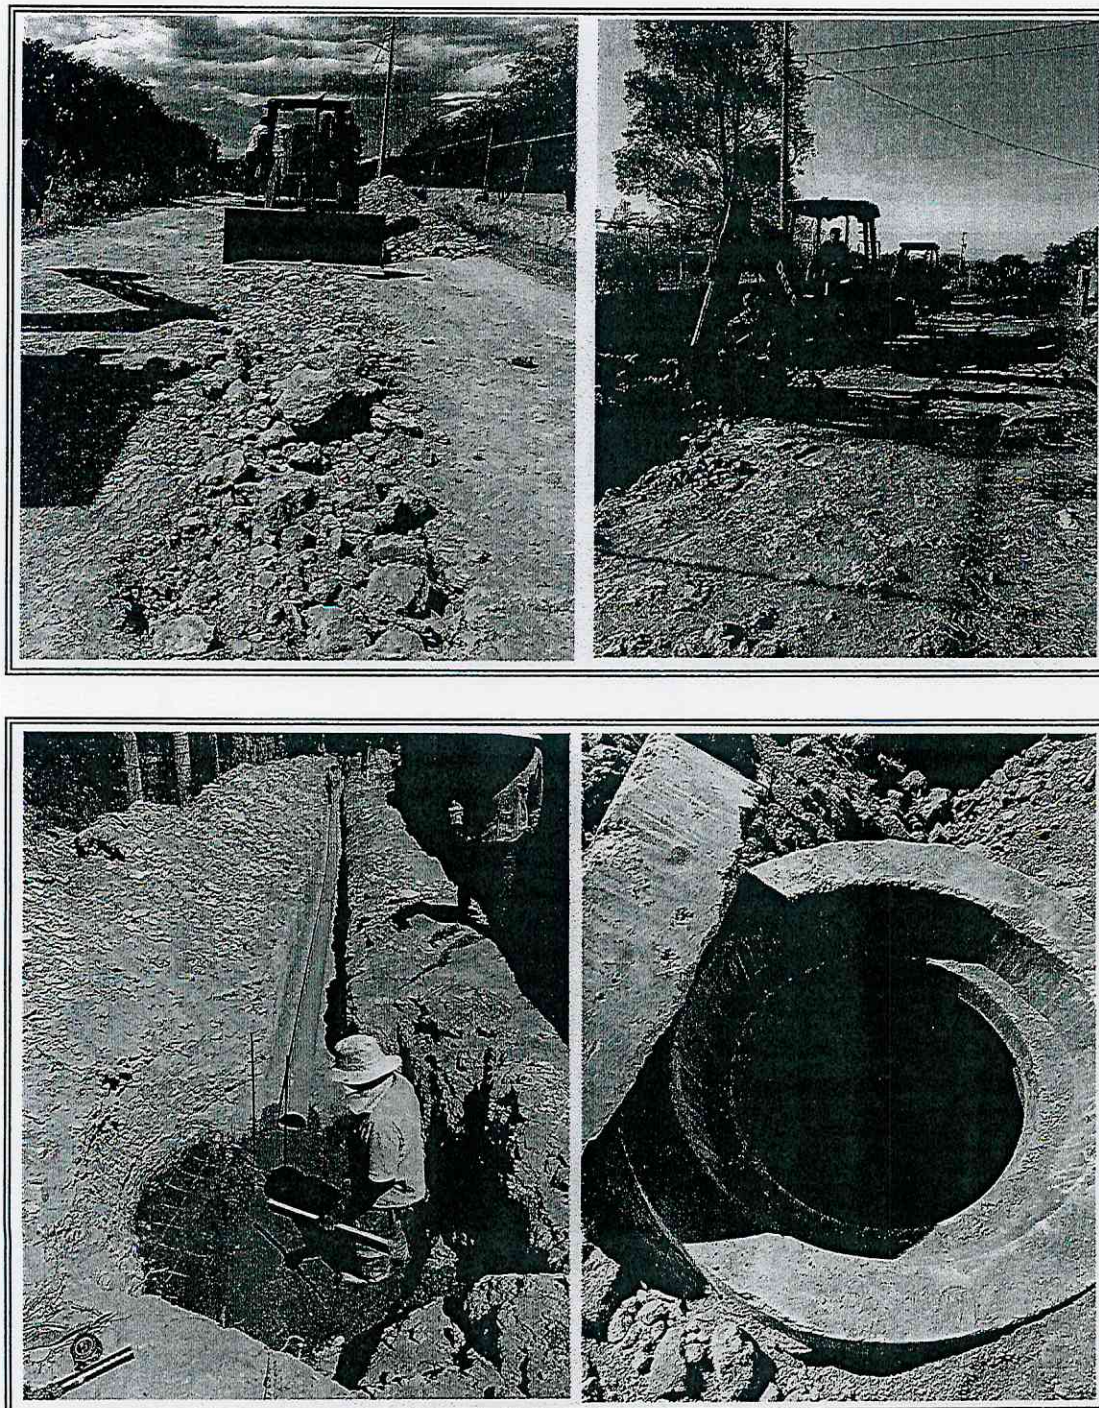

AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES SAN FELICIANO, SAN JOSE, LA UNIDAD, SANTA FE, SAN PEDRO Y SAN PABLO DE LA COLONIA LOS HUESOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA, ZACATECAS

OBRA:

LOCALIDAD:

PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO

FECHA

PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

100%

COLONIA LOS HUESOS, CABECERA MUNICIPAL

10-abr-23 TERMINO

10-jun-23

viernes, 7 de julio de 2023

000206

BITÁCORA DE OBRA.

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LA LUZ, COLONIA NIEVES, VILLA GARCIA, ZACATECAS

Nota 1: Se da el inicio la obra con el trazo con equipo topográfico para verificación de longitudes y elevaciones, se establecieron bancos de nivel y se determinó el trazo de la red al centro de las calles, delimitando el ancho de las zanjas y ubicación de pozos de visita.

Nota 2: Se inician trabajos de excavación con maquinaria tanto en material tipo B como en material tipo C, ya que preponderantemente se encontró material rocoso en casi todos los tramos, siendo necesaria el empleo de martillo hidráulico, y a su vez se realizan los trabajos de carga con máquina y acarreo en camión.

Nota 3: Se suministra el total la tubería de pvc, y se continua con la excavación y arrastre de material.

Nota 4: Se revisa la colocación de la plantilla de tepetate en tramos excavados, y se inicia a tender el tubo, y el relleno de las zanjas, para evitar posibles accidentes.

Nota 5: Se continua con la colocación del tubo y se inicia la construcción de los pozos de visita, y se les instala el brocal y tapa.

Nota 6: Inicia la construcción de descargas domiciliarias, y a la vez se repararon las tomas que interferían con la trayectoria de la red y descargas, y se finaliza con la conexión de tuberías.

Nota 7: Se da por terminados los trabajos.



000207



**OPERADO
FISM**

VILLA GARCIA, ZACATECAS A 07 DE JUNIO DEL 2023

MANIFESTACION DE TERMINO DE OBRA



EN RELACION AL CONTRATO NO. **MVG-10-04-2023**, RELATIVO A LA OBRA **AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES SAN FELICIANO, SAN JOSE, LA UNIDAD, SANTA FE, SAN PEDRO Y SAN PABLO DE LA COLONIA LOS HUESOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCÍA, ZACATECAS**, HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL DIA 07 DE JUNIO DEL 2023 SE FINALIZAN LOS TRABAJOS DE DICHOS CONTRATOS.

SIN MAS POR EL MOMENTO, NOS PERMITIMOS ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

GERENTE GENERAL



000208
