



II AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!

¡YA ES HORA DE CREER EN TI!
ESPERANZA
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL
Y COMBATE A LA POBREZA



INFORME MENSUAL DE ESTADO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES

MAYO 2020



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!

¡YA ES HORA DE CREER EN TI!
ESPERANZA
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL
Y COMBATE A LA POBREZA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA.
OFICIO No. P-2020/23/06-0184
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

DIP. RUBEN RIOS URIBE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
LXV LEGISLATURA DEL ESTADO
XALAPA, VERACRUZ.
P R E S E N T E.

El que suscribe **C. Ing. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional de Gutiérrez Zamora, Ver.;** por medio del presente me dirijo a usted para hacer de conocimiento que en cumplimiento a lo que establece el artículo 30 de la *Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*, así como *Las Reglas de Carácter General para el cumplimiento de la Presentación de Información Municipal a través de Medios Electrónicos* al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz; Remito a usted el **Estado de Obra Pública correspondiente al mes de Mayo 2020**, así como el acta de cabildo donde fueron aprobados.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Gutiérrez Zamora, Ver.; a Martes 23 de Junio de 2020.
A T E N T A M E N T E


ING. WILMAN MONJE MORALES.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE GUTIÉRREZ ZAMORA.





DEPENDENCIA: PRESIDENCIA.
OFICIO No. P-2020/23/06-0185
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

MTRA. DELIA GONZÁLEZ COBOS
AUDITOR GENERAL TITULAR DEL ORGANO
DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO.
P R E S E N T E.

El que suscribe **C. Ing. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional de Gutiérrez Zamora, Ver.;** por medio del presente me dirijo a usted para hacer de conocimiento que en cumplimiento a lo que establece el artículo 30 de la *Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*, así como *Las Reglas de Carácter General para el cumplimiento de la Presentación de Información Municipal a través de Medios Electrónicos* al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz; Remito a usted el **Estado de Obra Pública correspondiente al mes de Mayo 2020**, así como el acta de cabildo donde fueron aprobados.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Gutiérrez Zamora, Ver.; a Martes 23 de Junio de 2020.
ATENTAMENTE



ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE GUTIÉRREZ ZAMORA.
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021



ACTA NÚMERO **28** **SESIÓN ORDINARIA** DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
GUTIÉRREZ ZAMORA, VERACRUZ

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO efectuada por el Honorable Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz, a las **NUEVE horas** del **QUINCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE**, de conformidad con lo que disponen los Artículos 36, Fracción I, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz-Llave.- Preside el C. Wilman Monje Morales Presidente Municipal, con quórum integrado por los ciudadanos: C. Rosa María Ortega González, Síndica Única; C. Gonzalo Quiñones López Regidor Primero, Francisco Hatzel Gómez Ochoa Regidor Tercero, Rosalía García Guerrero Regidora Cuarta. El C. Presidente Municipal, C. Wilman Monje Morales, declara abierta la Sesión, acto seguido, el secretario del H. ayuntamiento, procede a pasar lista de asistencia, declarando quórum legal. Inmediatamente da lectura al Orden del Día, misma que a la letra dice: -----


PRESIDENTE MUNICIPAL


SÍNDICA ÚNICA


REGIDOR PRIMERO

1.- LISTA DE ASISTENCIA. -----

2.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -----

3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----

REGIDORA SEGUNDA

4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS **ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020**.-----


REGIDOR TERCERO

5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS **ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020**; DE LOS REPORTES DE LOS FONDOS DEL FISM DF 2020; FORTAMUN DF 2020; CAPUFE 2019; RECURSOS FISCALES 2020; SEGUIMIENTO CAPUFE 2019; EMPRESTITO FISMDF; FISMDF 2016 (SENTENCIA); FORTAFIN 2016 (SENTENCIA); INGRESOS MUNICIPALES POR BURSATILIZACIÓN 2016 (SENTENCIA); FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2015 (SENTENCIA); FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2016 (SENTENCIA).-----


REGIDORA CUARTA


SECRETARIO AYUNTAMIENTO

6.- ASUNTOS GENERALES. -----

Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, C. WILMAN MONJE MORALES, pregunta al Cuerpo Edilicio si están de acuerdo en aprobar el Orden del Día. - ACUERDO **APROBADO POR MAYORÍA**. -----

CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA APROBADO Y AGOTADOS LOS PUNTOS 1, 2 y 3 SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO.-----



4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020. -----

En uso de la voz la C. Kitzia Eunice Juárez Salazar, Tesorera Municipal, informa al cabildo los Estados Financieros del mes de mayo de 2020, acorde a lo establecido en el artículo 45 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre, mismos que fueron preparados por la Tesorería Municipal, en términos del artículo 72 fracción XIII de la misma Ley. En uso de la voz el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al cabildo si son de aprobarse los estados financieros correspondientes al mes de mayo del año 2020. -----

El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO. – Se aprueban los Estados Financieros correspondientes al mes de mayo del año 2020. APROBADO POR MAYORÍA. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. -----

5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020; DE LOS REPORTES DE LOS FONDOS DEL FISM DF 2020; FORTAMUN DF 2020; CAPUFE 2019; RECURSOS FISCALES 2020; SEGUIMIENTO CAPUFE 2019; EMPRESTITO FISDMF; FISDMF 2016 (SENTENCIA); FORTAFIN 2016 (SENTENCIA); INGRESOS MUNICIPALES POR BURSATILIZACIÓN 2016 (SENTENCIA); FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2015 (SENTENCIA); FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2016 (SENTENCIA). -----

En uso de la voz el C. Rodolfo Gutiérrez Lechuga, Director de Obras Públicas; informa al cabildo los Estados de Obra Pública del mes de mayo de 2020, acorde a lo establecido en el artículo 73 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre; y presenta los reportes de los fondos y en los relativos a los FONDOS DEL FISM DF 2020; FORTAMUN DF 2020; CAPUFE 2019; RECURSOS FISCALES 2020; SEGUIMIENTO CAPUFE 2019; EMPRESTITO FISDMF; FISDMF 2016 (SENTENCIA); FORTAFIN 2016 (SENTENCIA); INGRESOS MUNICIPALES POR BURSATILIZACIÓN 2016 (SENTENCIA); FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2015 (SENTENCIA); FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2016 (SENTENCIA). En uso de la voz el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al cabildo si son de aprobarse los estados de Obra correspondientes al mes de mayo del año 2020; FONDOS DEL FISM DF 2020; FORTAMUN DF 2020; CAPUFE 2019; RECURSOS FISCALES 2020; SEGUIMIENTO CAPUFE 2019; EMPRESTITO FISDMF; FISDMF 2016 (SENTENCIA); FORTAFIN 2016 (SENTENCIA);


PRESIDENTE
MUNICIPAL


SÍNDICA
ÚNICA


REGIDOR
PRIMERO

REGIDORA
SEGUNDA


REGIDOR
TERCERO


REGIDORA
CUARTA


SECRETARIO DE
AYUNTAMIENTO



INGRESOS MUNICIPALES POR BURSATILIZACIÓN 2016 (SENTENCIA); FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2015 (SENTENCIA); FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2016 (SENTENCIA). -----

El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO. - Se aprueban los Estados de Obra Pública correspondientes al mes de **mayo** del año **2020**, de los reportes de los fondos de los FONDOS DEL FISM DF 2020; FORTAMUN DF 2020; CAPUFE 2019; RECURSOS FISCALES 2020; SEGUIMIENTO CAPUFE 2019; EMPRESTITO FISDMF; FISDMF 2016 (SENTENCIA); FORTAFIN 2016 (SENTENCIA); INGRESOS MUNICIPALES POR BURSATILIZACIÓN 2016 (SENTENCIA); FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2015 (SENTENCIA); FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2016 (SENTENCIA). **APROBADO POR MAYORÍA.** COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. -----

6.- ASUNTOS GENERALES. -----

No hubo asuntos generales. -----

Posterior a ello, el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal, en los términos que marca la Ley, en uso de la voz, hace del conocimiento de los miembros del cabildo que se agotaron los asuntos del orden del día de esta **Vigésima Octava Sesión Ordinaria** del H. Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz. -----

7.- CLAUSURA. -----

Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS **NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS**, DEL DÍA **QUINCE DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA QUE FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS CIUDADANOS EDILES QUE EN ELLA INTERVINIERON ANTE EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, QUE AUTORIZA Y DA FE. REMÍTASE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA AL H. CONGRESO DEL ESTADO. -----

ALCALDESA
UNICA

REGIDOR
PRIMERO

REGIDORA
SEGUNDA

REGIDOR
TERCERO

REGIDORA
CUARTA

SECRETARIO H.
AYUNTAMIENTO

c.
WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
SÍNDICA

[Firma]

C. _____
ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICA ÚNICA

Ausencia temporal por acuerdo de
cabildo tomado el 05/05/20 en acta
No. 21 extraordinaria a solicitud
escrita; con fundamento en el Art.
24 de Ley Orgánica del Municipio
Libre para el Estado de Veracruz.

C. _____
SILVIANA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
REGIDORA SEGUNDA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
REGIDORA CUARTA
**REGIDURIA
CUARTA**

[Firma]

ROSA MARÍA GARCÍA GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
PRESIDENTE MUNICIPAL
**BRILLA CON FUERZA !
REGIDURIA PRIMERA**

[Firma]

GONZALO QUIÑONES LOPEZ
REGIDOR PRIMERO

--	--

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
**BRILLA CON FUERZA !
REGIDURIA TERCERA**

[Firma]

FRANCISCO HATZEL COMEZ OCHOA
REGIDOR TERCERO

--	--

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
SECRETARÍA

[Firma]

JORGE CHENA BATRES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/58693

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690001	REHABILITACIÓN DE CALLE MARGARITAS ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y JACARANDAS DE LA COLONIA RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA	No	No	No	No

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/58693



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2016 - 2021
**OBRAS
PÚBLICAS**

SELLO DIGITAL:

nofJ8V/nH+4MSiufPgX4BarFNUJ3JoZOIMADThAuuAJQswcTPS8ghzhuoB/ioUOERCdQVkyRQoTjDugrLvdT3O0uais2kVVTqoeGFtwzvK8QE0uyFJw2/g8fU3wRTrTnGha3azJT6/ggO6ffN+WZ6MunZyDFpm5BoU/VNf/tFn0=

Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/59206

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690101	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS LOMAS CHICAS LA VEGA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS CHICAS	No	No	No	No
2020300690102	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS LOMAS CHICAS - EL RÍO	No	No	No	No
2020300690103	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS ANCLON ARENAL - AL RÍO	No	No	No	No
2020300690104	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS CACAHUATAL EL RÍO EN LA LOCALIDAD CACAHUATAL	No	No	No	No
2020300690108	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PREPARATORIA, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN AULAS "ENRIQUE C. REBSAMEN", CLAVE: 30SBC2127H, COL. RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA	No	No	No	No
2020300690110	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES BELEN ARBONA ENTRE CALLES ACCESO Y PROF. MARCIANO CAMARILLO ALARCON, CALLE DR. ALFONSO ARMESTO GARCES ENTRE CALLES BELEN ARBONA HDZ. Y HÉROES DE LA BATALLA DEL 26 DE MARZO, EN LA COLONIA CUAUHTLAN	Sí	Sí	Sí	No
2020300690111	AMPLIACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE COAHUILA ENTRE CALLES OAXACA Y CHIAPAS, EN COLONIA AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO Y FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS	No	No	No	No
2020300690115	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DR. ALFONSO ARMESTO GARCES ENTRE CALLE BELEN ARBONA HERNÁNDEZ Y CALLE HÉROES DE LA BATALLA DEL 26 DE MARZO, COLONIA CUAUHTLAN	No	No	No	No

Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/59206

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690116	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SECCIÓN DE CALLES: NOGAL ENTRE EUCALIPTO Y PALMAS, PINO ENTRE EUCALIPTO Y ROBLE, PRIVADA NOGAL ENTRE CALLES CAOBA Y EUCALIPTO, CALLE CAOBA ENTRE PRIVADA NOGAL Y JACARANDAS, EN LA COLONIA ANCLON Y ARENAL	No	No	No	No
2020300690117	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RURAL TRAMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA - ENTRONQUE EJIDO MARIO HERNÁNDEZ POSADAS DEL KM 0+300 AL 0 + 883.	No	No	No	No
2020300690118	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RURAL ENTRONQUE EJIDO MARIO HERNÁNDEZ POSADAS A ENTRONQUE PAGUAS DE ARROYO GRANDE DEL KM 0+884 AL 0 + 1+410	No	No	No	No
2020300690119	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RURAL LOMAS CHICAS VALENZUELA DEL KM 0+300 AL 0 + 855	No	No	No	No
2020300690121	REHABILITACIÓN DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y SACRIFICIOS, COLONIA CENTRO	No	No	No	No
2020300690122	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE CALLE DE LA RIBERA Y GUTIERREZ ZAMORA, COLONIA CENTRO	Sí	No	No	No
2020300690123	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE SACRIFICIOS Y CALLE MINA, CERRO DE LA CRUZ	Sí	No	Sí	No
2020300690124	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLEJÓN DE LA CRUZ ENTRE CALLES 2 DE ABRIL Y CALLE SACRIFICIOS	Sí	No	Sí	No




SELLO DIGITAL:

NRoev0rDDnoB95ByydLd/KknN/ztqhOsdAl53LM4AI14Fa5oejfUKH5qDQxt3v4AJFkqQyhvaa/o8yfkmpEjhzSFeHSIUw3nEsj9z/NLk28PSAOI9QMny1Re8au9i0ImZcQTwmC853b8TRD7o+FspJN30HfID04Bib7qsmIU56E=



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/59206

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690125	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CUITLAHUAC ESQUINA CON VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA CUAHUTEMOC	No	No	No	No
2020300690127	REHABILITACIÓN DE CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE LA RIVERA Y CERRO DE LA BANDERA	Sí	No	No	No
2020300690128	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COLONIA LOS ÁNGELES, MODELO Y SALIDA A EL GIRASOL-LOMA LINDA	No	No	No	No
2020300690129	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO Y 12 DE DICIEMBRE COLONIA PRIMERO DE MAYO Y FIDEL HERRERA BELTRAN	No	No	No	No



SELLO DIGITAL:

NRoev0rDDnoB95ByydLd/KknN/ztqhOsdAl53LM4AI14Fa5oejfUKHSqDQxt3v4AjFkqQyhvaa/o8yflmPEjhz5FeHSIUw3nEsj9z/NLk28PSAOI9QMny1Re8au9i0ImZcQTwmC853b8TRD7o+FspJN30HfID04Bib7qsmIU56E=



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/58704

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690216	REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA	No	No	No	No
2020300690217	MEJORAMIENTO DE GUARNICIONES APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA EN CALLES DE LA CABECERA	No	No	No	No
2020300690218	MEJORAMIENTO DE CENTROS CULTURALES Y/O ARTÍSTICO "CASA DE LA CULTURA GUTIERREZ ZAMORA"	No	No	No	No

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/58704



SELLO DIGITAL:

ccFjpZVGYsvMY54q2bLLuMD2dN2xu+3TlyAuLILNV7xc+OkhloqTXhH8FD6srap6TvbNArz2UgxdL4IEPGZb25qACoF5z/a9JZs3YcZ633bIYhHknwhxEjNhJTAY24WfWCsxoZ8RlpFx/8s3xRQqJ1h1hoRJM1NH7aNXvahJ3lO=



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/58691

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2019300690451	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL CAMINO RURAL EL CEPILLO - BARRILES KM 0+000 AL KM 0+583.	No	No	No	No
2019300690457	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL BARRILES- CORONADO KM 0+000 AL 0+583	No	No	No	No

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/58691



SELLO DIGITAL:


jo/lyZWpNLP0rQwLMOMGQb3qNyAJEUODNrhVJy9zpFHArBKccVb/IVo7PfwkRmkOgCEIPnx1QIKaMpybe1saAxvZ27uKNf8Ndp6FAcDXgUc/E9R35plbILOG6g0MLo8AlekKgui+NZijM/QhTLauxy/E3gMobZxyGHhju37rcZI=



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/58692

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690452	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MÉXICO Y PERÚ ENTRE CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO Y ENTRE CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA FIDEL HERRERA	No	No	No	No

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/58692



SELLO DIGITAL:

H7x9gr6+d5/1/3sDNmQNM CwmZ5Kxi2VeT1Pf9ZbcPnpjEz2TbfRh8zlEockZNKjuB2c6MorYdwGyk0nEtzZUD45x3+7dRZMduLE5cfWZQh+ObWwiOnjeufKBnMYN/6paGXUN3IVEjwc2/klmJ9ru7sUK4eTEYbisbwFuaL6ZtA=

Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/59128

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690500	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL COL. ANCLON Y ARENAL FRENTE A CENTRAL DE ABASTOS	Sí	No	Sí	No
2020300690501	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 1 Y 7 ENTRE CALLES 2 Y 4, CALLE 4 ENTRE CALLES 1 Y 5, EN LA LOCALIDAD DE RENACIMIENTO	Sí	Sí	Sí	No
2020300690502	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BELEN ARBONA HERNÁNDEZ ENTRE ACCESO Y CALLE PROF. MARCIANO CAMARILLO ALARCON , COLONIA CUAUHTLAN	Sí	Sí	Sí	No
2020300690503	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES 1,3 Y 7 ENTRE CALLES 2 Y 4, CALLE 4 ENTRE CALLES 3 Y 5 DE LA LOCALIDAD DE RENACIMIENTO	Sí	No	Sí	No
2020300690504	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE SIMÓN BOLÍVAR Y MELCHOR OCAMPO DEL KM 0+000 AL 0+ 353 EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL VALENZUELA	No	No	No	No
2020300690505	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, CLAVE: 30DPR5104-U COLONIA ASOCIACIÓN CIVIL PRIMERO DE MAYO	Sí	No	Sí	No
2020300690506	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL "DR. ALEJANDRO CERISOLA", CLAVE: 30EST0001A, COLONIA PROVIDENCIA	Sí	No	Sí	No

Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/59128

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690507	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA CLAVE: 30DPV1603-O, LOCALIDAD RENACIMIENTO	Sí	No	Sí	No
2020300690508	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA ADALBERTO TEJEDA CLAVE: 30ETH0259-T EN LA LOCALIDAD IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	Sí	No	Sí	No
2020300690509	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO", CLAVE 30DES0033B, COLONIA PROVIDENCIA	No	No	No	No



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/58729

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690600	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RURAL EL CEPILLO-BARRILES DEL KM 1+145 AL 1+713	No	No	No	No
2020300690601	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN AGEB 0096, COLONIA CUAUHEMOC Y SAN	No	No	No	No
2020300690602	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN AGEB 109, COLONIA LOS ÁNGELES, DEL CARMEN, HERNÁNDEZ OCHOA Y MURILLO VIDAL	No	No	No	No
2020300690603	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN AGEB 0151, COLONIA HIDALGO, ANCLON Y	No	No	No	No
2020300690604	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN AGEB 0185, COLONIA CUAUHTLAN	No	No	No	No
2020300690605	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN AGEB 019A, COLONIA FIDEL HERRERA Y AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO.	No	No	No	No
2020300690606	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN AGEB 0202, COLONIA PRIMERO DE MAYO.	No	No	No	No
2020300690607	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN AGEB 0217, COLONIA FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS Y GUADALUPE	No	No	No	No
2020300690608	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CARRILLO PUERTO SANTA	No	No	No	No
2020300690609	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LOMAS DE ARENA	No	No	No	No
2020300690610	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LOMAS CHICAS	No	No	No	No
2020300690611	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD RAFAEL VALENZUELA	No	No	No	No

SELLO DIGITAL:

pzmavFZgeJYbsHQzwzkuMysGS72Cck3li+OyuCXrdvImGYGEJWfomiXdq+kGH969KVAIVxXRSNPo+czxNFRuycpwJQbHQDIrIvXrY4SGkTiNucc7Hy8g3MxtgJf80/xDO2pc+070uW+YXzal9sKwtxAKGqUgzRRoBrb912IYszQ=



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/58729

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690612	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD IGNACIO MANUEL	No	No	No	No
2020300690613	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA.	No	No	No	No
2020300690614	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EJIDO SOTO Y GAMA.	No	No	No	No
2020300690615	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PAGUAS DE ARROYO GRANDE	No	No	No	No
2020300690616	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PAGUAS DE CORONADO	No	No	No	No

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/58729



SELLO DIGITAL:

pzmavFZgeJYbsHQzwzkuMysGS72Ckk3li+OyuCXrdvImGYGEJWfomIXdq+kGH969KVAIVxXRSNPo+czxNFRuycpwJQbHQDIrlvXrY4SGkTiNucc7Hy8g3Mxtglf80/xDO2pc+070uW+YXzal9sKwtXAKGqUgzRRoBrb912IYszQ=



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/58895

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690700	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RURAL LOMAS CHICAS CORONADO DEL KM 0+584 AL 0+927	No	No	No	No

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/58895



SELLO DIGITAL:

roY3MBPc&Jn+DrTC72IJVwaduAY9cRt9n48Dxhh/hEJXitL4A8/SAJ5Au7MV6n4ybWQkIGGRfc5QC96S7qKKU5E6177/HS+OX6hqqOrulyIZdAHM6NSKLiNhLbPBYvdmnChbTXAZB7Hpt1LPpn+tdZ61lwpUdeFJRi4shXEQh0=



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/58705

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690800	CONSTRUCCIÓN DE FORO CÍVICO EN CERRO DE LA BANDERA	No	No	No	No

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/58705

SELLO DIGITAL:

Jo2NnPva0f4RBu4IJBftA/nNuBS4Iq7gTkUNv4brQU2qEqvhO0gp0dROf/s3BEzc6k7cYIyPWdSr0FWaEpuCzS4r6FMR/sZeNyLQS4/Y2YoqbTmBjpeG9EXN7Wr3hwBCxeA6+t8yUXQfoYEC2EtWStBwHcujz2wCXOJCLTmAqU8=



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/58890

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690850	REHABILITACIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA Y PLAZOLETA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DE LA CRUZ	Sí	No	Sí	No

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/58890

SELLO DIGITAL:

UbHHXLaHsz23RDCvdg4vWUyaE/kUBjm1QhiK7/eyh+2os+gdKdQZydtEb4JW1SRuELutSatWyZ+RLrb0tgQ9zumqwm0Kjzmi6XMzgeB3p9n1Z4lk6UBLYVi4j9Pd8jbgSLr26TVDjkCeUMMwpcQJmR4na1UKLGHVHnTh9k5LTds=



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/59213

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690900	REHABILITACIÓN DE CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE ABASOLO Y CERRO DE LA BANDERA	No	No	No	No

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/59213

SELLO DIGITAL:

oGy7xXWfBcqX7jiquwtuPQGr5z/D1T3ibzWQeZQefdQKUYFcCc6NAOsheVN4WS9Kxa1SjkNTYtcrGpvrWzj3LG0NnfMvkGcBDpmjFxxUgH2Nh3ywEiCUD5ko37Xxk+t7WsHQ4DPaMQfbgKp/kzOU4mWE65egKyVrz7XeaY0AxKog=



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690110	Periodo:	MAYO	Número de estimación:	2.00
Descripción:	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES BELEN ARBONA ENTRE CALLES ACCESO Y PROF. MARCIANO CAMARILLO ALARCON, CALLE DR. ALFONSO ARMESTO			Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA
				Fecha de revisión:	23/06/2020



FOTO


Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:




NORBERTO JUAREZ MEJIA
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis




H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio: GUTIÉRREZ ZAMORA **Localidad:** GUTIÉRREZ ZAMORA **Ejercicio fiscal:** EJERCICIO 2020
No. de obra: 2020300690110 **Periodo:** MAYO **Número de estimación:** 2.00
Descripción: AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES BELEN ARBONA ENTRE CALLES ACCESO Y **Fuente de Financiamiento:** FONDO DE APORTACIONES PA
Fecha de revisión: 23/06/2020

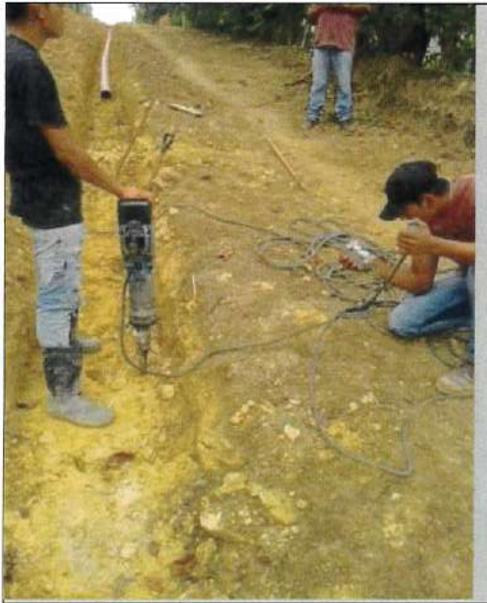

Concepto de obra ejecutado:



Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.

NORBERTO JUAREZ MEJIA

Supervisor de Obra Responsable
INGENIERO
Profesión

- c.c.p.
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis





H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	<u>GUTIÉRREZ ZAMORA</u>	Localidad:	<u>GUTIÉRREZ ZAMORA</u>	Ejercicio fiscal:	<u>EJERCICIO 2020</u>
No. de obra:	<u>2020300690122</u>	Periodo:	<u>MAYO</u>	Número de estimación:	<u>1.00</u>
Descripción:	<u>REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE CALLE DE LA RIBERA Y GUTIERREZ ZAMORA, COLONIA CENTRO</u>			Fuente de financiamiento:	<u>FONDO DE APORTACIONES PARA</u>
				Fecha de revisión:	<u>23/06/2020</u>



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:




NORBERTO JUAREZ MEJIA
Supervisor de obra Responsable
 INGENIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690123	Periodo:	MAYO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE SACRIFICIOS Y CALLE MINA, CERRO DE LA CRUZ			Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA
				Fecha de revisión:	25/06/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.



FRANCISCO GUILLERMO MEDINA BENAVIDES
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio: GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad: GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2020
No. de obra: 2020300690124	Periodo: MAYO	Número de estimación: 1
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLEJÓN DE LA CRUZ ENTRE CALLES 2 DE ABRIL Y CALLE SACRIFICIOS		Fuente de financiamiento: SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
		Fecha de revisión: 23/06/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:



LUIS JAVIER ORÓSTICO LÓPEZ
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690127	Periodo:	MAYO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE LA RIVERA Y CERRO DE LA BANDERA			Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA
				Fecha de revisión:	25/06/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.



ALFREDO MORENO NERI

Supervisor de obra Responsable

INGENIERO

Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690500	Periodo:	MAYO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL COL. ANCLON Y ARENAL FRENTE A CENTRAL DE ABASTOS			Fuente de financiamiento:	EMPRÉSTITO FISDMF
				Fecha de revisión:	25/06/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.



[Handwritten Signature]
ALFREDO MORENO NERI
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis

**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.****REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)****DATOS GENERALES**

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	NUEVO RENACIMIENTO 2000	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690501	Periodo:	MAYO	Número de estimación:	1
Descripción:	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 1 Y 7 ENTRE CALLES 2 Y 4, CALLE 4 ENTRE CALLES 1 Y 5, EN LA LOCALIDAD DE RENACIMIENTO			Fuente de financiamiento:	EMPRÉSTITO FISMDF
				Fecha de revisión:	23/06/2020

**FOTO**Concepto de obra
ejecutado:**FOTO**Concepto de
obra ejecutado:**Observaciones:**

NORBERTO JUAREZ MEJIA
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	NUEVO RENACIMIENTO 2000	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690501	Periodo:	MAYO	Número de estimación:	1
Descripción:	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 1 Y 7 ENTRE CALLES 2 Y 4, CALLE 4			Fuente de Financiamiento:	EMPRÉSTITO FISMDF
				Fecha de revisión:	23/06/2020



Concepto de obra ejecutado:



Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

NORBERTO JUAREZ MEJIA

Supervisor de Obra Responsable

INGENNIERO

Profesión

- c.c.p.
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	<u>GUTIÉRREZ ZAMORA</u>	Localidad:	<u>GUTIÉRREZ ZAMORA</u>	Ejercicio fiscal:	<u>EJERCICIO 2020</u>
No. de obra:	<u>2020300690502</u>	Periodo:	<u>MAYO</u>	Número de estimación:	<u>1</u>
Descripción:	<u>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BELEN ARBONA HERNÁNDEZ ENTRE ACCESO Y CALLE PROF. MARCIANO CAMARILLO ALARCON ,</u>			Fuente de financiamiento:	<u>EMPRÉSTITO FISDMF</u>
				Fecha de revisión:	<u>19/06/2020</u>



FOTO

Concepto de obra ejecutado:




FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

TERMINADO




 FRANCISCO GUILLERMO MEDINA BENAVIDES
Supervisor de obra Responsable
 INGENIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis




H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.


REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690502	Periodo:	MAYO	Número de estimación:	1
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BELEN ARBONA			Fuente de Financiamiento:	EMPRÉSTITO FISDMDF
				Fecha de revisión:	19/06/2020

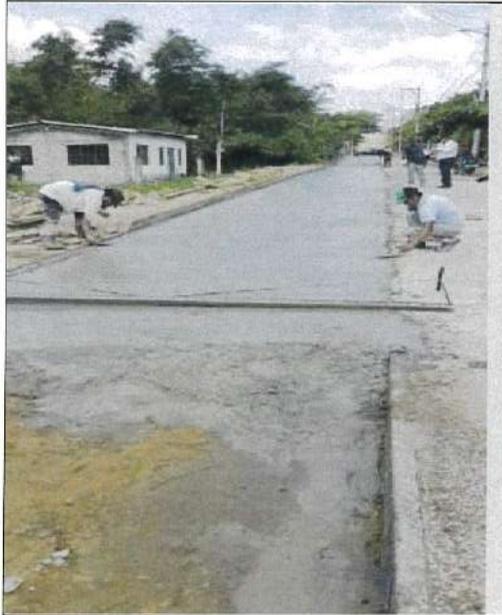

Concepto de obra ejecutado:

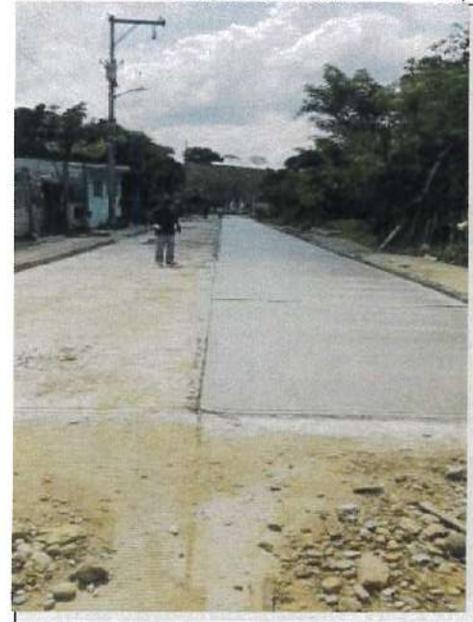

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

TERMINO

FRANCISCO GUILLERMO MEDINA BENAVIDES

Supervisor de Obra Responsable
INGENIERO
Profesión

- c.c.p.
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	NUEVO RENACIMIENTO 2000	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690503	Periodo:	MAYO	Número de estimación:	1
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES 1,3 Y 7 ENTRE CALLES 2 Y 4, CALLE 4 ENTRE CALLES 3 Y 5 DE LA LOCALIDAD DE RENACIMIENTO			Fuente de financiamiento:	EMPRÉSTITO FIS MDF
				Fecha de revisión:	19/06/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

TERMINO



LUIS JAVIER ORÓSTICO LÓPEZ
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis




H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690505	Periodo:	MAYO	Número de estimación:	1
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, CLAVE: 30DPR5104-U COLONIA			Fuente de financiamiento:	EMPRÉSTITO FISDMF
				Fecha de revisión:	19/06/2020

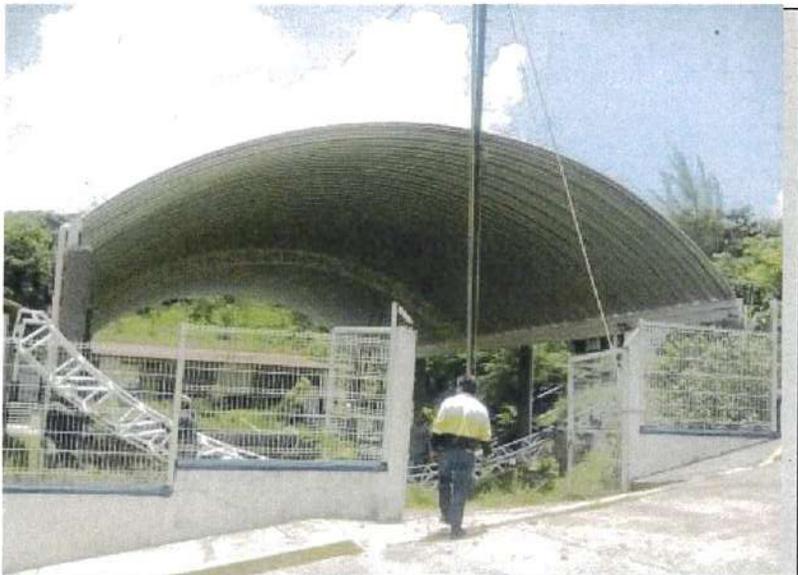

FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

TERMINO



NORBERTO JUAREZ MEJÍA
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690506	Periodo:	MAYO	Número de estimación:	1
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL "DR. ALEJANDRO CERISOLA", CLAVE:			Fuente de financiamiento:	EMPRÉSTITO FISMDF
				Fecha de revisión:	19/06/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

TERMINO



FRANCISCO GUILLERMO MEDINA BENAVIDES
Supervisor de obra Responsable

INGENNIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis

**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.****REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)****DATOS GENERALES**

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	NUEVO RENACIMIENTO 2000	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690507	Periodo:	MAYO	Número de estimación:	1
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA CLAVE: 30DPV1603-O, LOCALIDAD			Fuente de financiamiento:	EMPRÉSTITO FISMDF
				Fecha de revisión:	19/06/2020

**FOTO**Concepto de obra
ejecutado:**FOTO**Concepto de
obra ejecutado:**Observaciones:**

TERMINO



LUIS JAVIER ORÓSTICO LÓPEZ
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO

Profesión del Supervisor

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	M. ALTAMIRANO (PLAN DE ALTA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690508	Periodo:	MAYO	Número de estimación:	1
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA ADALBERTO TEJEDA CLAVE: 30ETH0259-T EN LA LOCALIDAD IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO			Fuente de financiamiento:	EMPRÉSTITO FISMDF
				Fecha de revisión:	19/06/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:




FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.





ALFREDO MORENO NERI
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis

**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.****REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)****DATOS GENERALES**

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690850	Periodo:	MAYO	Número de estimación:	1
Descripción:	REHABILITACIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA Y PLAZOLETA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DE LA CRUZ			Fuente de financiamiento:	FONDO PARA ENTIDADES FEDER/
				Fecha de revisión:	23/06/2020

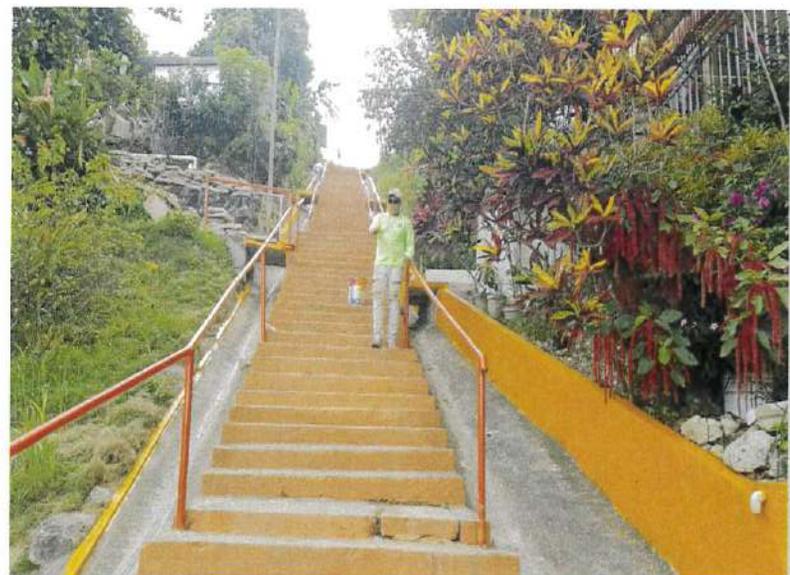**FOTO**Concepto de obra
ejecutado:**FOTO**Concepto de
obra ejecutado:**Observaciones:**

TERMINADO



NORBERTO JUAREZ MEJIA
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2020

FECHA DE ELABORACION: 25/06/2020
MES QUE SE REALIZA: MAYO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: GUTIERREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES BELEN ARBONA ENTRE CALLES ACCESO Y PROF. MARCIANO CAMARILLO ALARCON, CALLE DR. ALFONSO ARMESTO GARCES ENTRE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA: 2020300690110	

ANTECEDENTES:										
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	NO	X						
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:										
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGE:	0185	GRADO DE REZAGO SOCIAL:						
	URBANA	X		MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	X	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI	NO	X	TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:					
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	NO	X	DIRECTA	X	COMPLEMENTARIA	RESTRINGIDA		
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA										
LATITUD	20.435863000	LONGITUD	-97.090031000							

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS; EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M., DE PROFUNDIDAD; TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA TUBERÍAS, INCLUYE: APISONADO Y ACOSTILLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS; EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M., DE PROFUNDIDAD; TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA TUBERÍAS, INCLUYE: APISONADO Y ACOSTILLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACION	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ESTIMACIÓN DO	\$99,568.97	2	\$99,568.97	21	\$100,000.00	\$0.00	\$431.03	\$0.00	\$99,568.97
ESTIMACIÓN UNO	\$398,275.86	1	\$398,275.86	2	\$400,000.00	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00	\$398,275.86
TOTALES	\$497,844.83		\$497,844.83		\$500,000.00	\$0.00	\$2,155.17	\$0.00	\$497,844.83

MONTO AUTORIZADO:	\$500,000.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$500,000.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE X NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	CAEV	
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE X NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	CAEV	
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:		EXISTE X
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	

NO. DE CONTRATO:	MGZ-FISM2020/0110/OP-003	FECHA:	10/02/2020
CONTRATISTA:	JAIME PEREZ HERNANDEZ		
RFC:	PEHJ851030T71		
MONTO CONTRATADO:	\$500,000.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRAMADA	REAL
		11/02/2020	11/02/2020
	TÉRMINO	30/03/2020	11/03/2020
	DÍAS	49	30
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

B) REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$100,000.00	12/05/2020
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$500,000.00	12/05/2020
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	80	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	80	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	80	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$43,103.45	\$50,000.00	
AFIANZADORA:	RTA, S.A DE C.V., GRUPO RTA, S.A DE C.V., GRUPO		
No. DE FIANZA:	3900-03026-0	3900-03042-1	
FECHA:	10/02/2020	11/03/2020	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE IMPORTE/PERIODO	FECHA
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$500,000.00	C/IVA	

OBSERVACIONES:

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA
DIRECTOR DE OBRAS

NORBERTO JUÁREZ MEJÍA
SUPERVISOR

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2020

FECHA DE ELABORACION:	25/06/2020
MES QUE SE REPORTA	MAYO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: GUTIERREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE SACRIFICIOS Y CALLE MINA, CERRO DE LA CRUZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA: 2020300690123	

ANTECEDENTES:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	
TIPO DE ZONA: RURAL <input type="checkbox"/> URBANA <input checked="" type="checkbox"/>	CLAVE AGE: N/A
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
MUY ALTO	ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO <input checked="" type="checkbox"/>
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:	
DIRECTA	COMPLEMENTARIA <input checked="" type="checkbox"/> RESTRINGIDA
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	
LATITUD 20.455464000	LONGITUD -97.084645000

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
SOMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA ROTULADO EN LONA DE POLICLORURO DE VINILO (P.C.V.) DE 6MM. DE ESPESOR, MEDIDAS 3.00 X 2.00 M. FIJADO EN BASTIDOR DE MADERA, ROTULACION DE ACUERDO AL CROQUIS TIPO; TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJE Y REFERENCIAS. INCLUIVE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
SOMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA ROTULADO EN LONA DE POLICLORURO DE VINILO (P.C.V.) DE 6MM. DE ESPESOR, MEDIDAS 3.00 X 2.00 M. FIJADO EN BASTIDOR DE MADERA, ROTULACION DE ACUERDO AL CROQUIS TIPO; TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJE Y REFERENCIAS. INCLUIVE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACION	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ESTIMACION UNIC	\$796,551.72	1	\$796,551.72	3	\$800,000.00	\$0.00	\$3,448.28	\$0.00	\$796,551.72
TOTALES	\$796,551.72		\$796,551.72		\$800,000.00	\$0.00	\$3,448.28	\$0.00	\$796,551.72

MONTO AUTORIZADO:	\$800,000.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$800,000.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/>	NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/>	NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/>	NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:		
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/> INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS <input type="checkbox"/> LICITACIÓN PÚBLICA <input checked="" type="checkbox"/>	

NO. DE CONTRATO:	MGZ-FISM2020/0123/OP-010	FECHA:	17/04/2020
CONTRATISTA:	JESUS RAMOS BARRERA		
RFC:	RABJ8706264W7		
MONTO CONTRATADO:	\$800,000.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRAMADA	REAL
		03/08/2020	20/04/2020
	TÉRMINO	30/09/2020	09/05/2020
	DÍAS	59	20
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

B) REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$800,000.00	12/05/2020
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$800,000.00	12/05/2020
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	50	100	100	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	50	100	100	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	50	100	100	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	\$68,965.52	VICIOS OCULTOS	\$80,000.00
MONTO AFIANZADO:					
AFIANZADORA:		RTA, S.A DE C.V., GRUPO RTA, S.A DE C.V., GRUPO			
No. DE FIANZA:		3320-04268-1	3900-04091-0		
FECHA:		17/04/2020	09/05/2020		
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA	
	PLAZO		INICIAL	FINAL	
	NO APLICA				
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$800,000.00		C/IVA	

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA
DIRECTOR DE OBRAS

FRANCISCO GUILLERMO MEDINA BENAVIDE
SUPERVISOR

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

FECHA DE ELABORACIÓN:	24/06/2020
MES QUE SE REPORTA	MAYO

EJERCICIO 2020

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIÉRREZ ZAMORA	LOCALIDAD: GUTIÉRREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLEJON DE LA CRUZ ENTRE CALLES 2 DE ABRIL Y CALLE SACRIFICIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA: 2020300690124	

ANTECEDENTES:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	
TIPO DE ZONA: RURAL <input type="checkbox"/> URBANA <input checked="" type="checkbox"/>	CLAVE AGE: N/A
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
MUY ALTO <input type="checkbox"/>	ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BAJO <input type="checkbox"/> MUY BAJO <input checked="" type="checkbox"/>
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:	
DIRECTA <input type="checkbox"/>	COMPLEMENTARIA <input checked="" type="checkbox"/> RESTRINGIDA <input type="checkbox"/>
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	
LATITUD: 20.457173000	LONGITUD: -97.085608000

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
EXCAVACIONES, PLANTILLA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO, CIMBRADO, VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRADO Y RELLENO.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
EXCAVACIONES, PLANTILLA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO, CIMBRADO, VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRADO Y RELLENO.

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ESTIMACIÓN DO	\$165,889.86	2	\$165,889.86	4	\$166,608.00	\$0.00	\$718.14	\$0.00	\$165,889.86
ESTIMACIÓN UNO	\$232,386.00	1	\$232,386.00	1	\$233,392.00	\$0.00	\$1,006.00	\$0.00	\$232,386.00
TOTALES	\$398,275.86		\$398,275.86		\$400,000.00	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00	\$398,275.86

MONTO AUTORIZADO:	\$400,000.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$400,000.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/>	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/>	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/>	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:		
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/> INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS <input type="checkbox"/> LICITACIÓN PÚBLICA <input checked="" type="checkbox"/>	EXISTE <input type="checkbox"/>

NO. DE CONTRATO:	MGZ-FISM2020/0124/OP-009	FECHA:	20/03/2020
CONTRATISTA:	JESUS RAMOS BARRERA		
RFC:	RABJ8706264W7		
MONTO CONTRATADO:	\$400,000.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	03/08/2020	23/03/2020
	TÉRMINO	30/10/2020	21/04/2020
	DÍAS	62	30
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

B) REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$166,608.00	12/05/2020
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$400,000.00	12/05/2020
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	40	100	100	100	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	40	100	100	100	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	40	100	100	100	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$34,482.76	\$40,000.00	
AFIANZADORA:	RTA, S.A DE C.V., GRUPO RTA, S.A DE C.V., GRUPO		
No. DE FIANZA:	3900-03027-8	3900-03028-4	
FECHA:	20/03/2020	21/04/2020	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO		INICIAL
			FINAL
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$400,000.00	C/IVA	

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA DIRECTOR DE OBRAS
LUIS JAVIER OROSTICO LOPEZ SUPERVISOR

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

FECHA DE ELABORACION:
25/06/2020
MES QUE SE REPORTA
MAYO

EJERCICIO 2020

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIÉRREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	GUTIÉRREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL COL. ANCLON Y ARENAL FRENTE A CENTRAL DE ABASTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	EMPRÉSTITO FISMDF	No. DE OBRA:	2020300690500		

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	NO	X	ANTECEDENTES:	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:					GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
TIPO DE ZONA:	RURAL URBANA	CLAVE AGEB:	0151	MUY ALTO	ALTO	MEDIO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	X	SI	NO	BAJO	MUY BAJO	X
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	NO	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:		
				DIRECTA	X	COMPLEMENTARIA
						RESTRINGIDA
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA						
LATITUD	20.439215000	LONGITUD	-97.087383000			

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
SUBMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA ROTODADO EN LONA DE POLICLORURO DE VINILO (P.C.V.) DE 6MM. DE ESPESOR, MEDIDAS 3.00 X 2.00 M. FIJADO EN BASTIDOR DE MADERA, ROTULACION DE ACUERDO AL CROQUIS TIPO; TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS- EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO C DE

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
SUBMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA ROTODADO EN LONA DE POLICLORURO DE VINILO (P.C.V.) DE 6MM. DE ESPESOR, MEDIDAS 3.00 X 2.00 M. FIJADO EN BASTIDOR DE MADERA, ROTULACION DE ACUERDO AL CROQUIS TIPO; TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS- EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO C DE

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	APORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ESTIMACIÓN UNIC	\$337,538.79	1	\$337,538.79	2	\$339,000.00	\$0.00	\$1,461.21	\$0.00	\$337,538.79
TOTALES	\$337,538.79		\$337,538.79		\$339,000.00	\$0.00	\$1,461.21	\$0.00	\$337,538.79

MONTO AUTORIZADO:	\$339,000.00	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$339,000.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA			
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			X
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	MGZ-EMP2020/0500/OP-001	FECHA:	31/03/2020
CONTRATISTA:	JESUS RAMOS BARRERA		
RFC:	RABJ8706264W7		
MONTO CONTRATADO:	\$339,000.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/04/2020	
	TÉRMINO	27/04/2020	
DÍAS	97	27	
	APLICA	NO APLICA	X
ANTICIPO:	MONTO:	PORCENTAJE:	
	FECHA DE PAGO:		

B) REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$339,000.00	27/04/2020
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$339,000.00	27/04/2020
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$29,224.14	\$33,900.00	
AFIANZADORA:	RTA, S.A DE C.V., GRUPO RTA, S.A DE C.V., GRUPO		
No. DE FIANZA:	3320-04249-1	3320-04251-1	
FECHA:	31/03/2020	27/04/2020	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO		FECHA
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$339,000.00	C/IVA	

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA
DIRECTOR DE OBRAS

ALFREDO MORENO NERI
SUPERVISOR

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2020

FECHA DE ELABORACIÓN: 25/06/2020
MES QUE SE REPORTA MAYO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: NUEVO RENACIMIENTO 2000	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 1 Y 7 ENTRE CALLES 2 Y 4, CALLE 4 ENTRE CALLES 1 Y 5, EN LA LOCALIDAD DE RENACIMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: EMPRÉSTITO FISIMDF	No. DE OBRA: 2020300690501	

ANTECEDENTES:		
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	NO X
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		
TIPO DE ZONA:	RURAL X	URBANA
CLAVE AGE:	N/A	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	NO X
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI	NO X
GRADO DE REZAGO SOCIAL:		
MUY ALTO	ALTO	MEDIO
		BAJO X
		MUY BAJO
TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:		
DIRECTA	X	COMPLEMENTARIA
		RESTRINGIDA
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		
LATITUD	20.437113000	LONGITUD -97.075033000

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS; EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M., DE PROFUNDIDAD; TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA TUBERÍAS, INCLUYE: APISONADO Y ACOSTILLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS; EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M., DE PROFUNDIDAD; TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA TUBERÍAS, INCLUYE: APISONADO Y ACOSTILLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ESTIMACIÓN UNIC	\$298,706.90	1	\$298,706.90	6	\$300,000.00	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	\$298,706.90
TOTALES	\$298,706.90		\$298,706.90		\$300,000.00	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	\$298,706.90

MONTO AUTORIZADO:	\$300,000.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$300,000.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE X	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	CAEV	NO APLICA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE X	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	CAEV	NO APLICA
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:		NO APLICA X
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X
	LICITACIÓN PÚBLICA	

NO. DE CONTRATO:	MGZ-EMP2020/0501/OP-002	FECHA:	31/03/2020
CONTRATISTA:	MARIA ISABEL LEAL TOMAS		
RFC:	LET1951227LA9		
MONTO CONTRATADO:	\$300,000.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRAMADA	REAL
	TÉRMINO	26/03/2020	01/04/2020
	DÍAS	30/06/2020	27/04/2020
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

B) REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$300,000.00	27/04/2020
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$300,000.00	27/04/2020
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		\$25,862.07	\$30,000.00
AFIANZADORA:	RTA, S.A DE C.V., GRUPO RTA, S.A DE C.V., GRUPO		
No. DE FIANZA:		3320-04262-0	3900-04088-2
FECHA:		31/03/2020	27/04/2020
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO		INICIAL FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$300,000.00	C/IVA

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA
DIRECTOR DE OBRAS

NORBERTO JUÁREZ MEJÍA
SUPERVISOR

FORMATO 11



**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

FECHA DE ELABORACIÓN:
24/06/2020
MES QUE SE REPORTA
MAYO

EJERCICIO 2020

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: GUTIERREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BELEN ARBONA HERNÁNDEZ ENTRE ACCESO Y CALLE PROF. MARCIANO CAMARILLO ALARCON, COLONIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: EMPRÉSTITO FISMDF	No. DE OBRA: 2020300690502	

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	ANTECEDENTES:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:				GRADO DE REZAGO SOCIAL:		
TIPO DE ZONA:	RURAL <input type="checkbox"/>	URBANA <input checked="" type="checkbox"/>	CLAVE AGE:	0185	MUY ALTO <input type="checkbox"/>	ALTO <input type="checkbox"/>
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA				TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:		
LATITUD	20.436874000	LONGITUD	-97.090057000	DIRECTA <input type="checkbox"/>	COMPLEMENTARIA <input type="checkbox"/>	RESTRINGIDA <input checked="" type="checkbox"/>

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
SOMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA ROTULADO EN LONA DE POLICLORURO DE VINILO (P.C.V.) DE 6MM. DE ESPESOR, MEDIDAS 3.00 X 2.00 M. TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS; EXCAVACIÓN EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIA CON EQUIPO MECÁNICO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
SOMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA ROTULADO EN LONA DE POLICLORURO DE VINILO (P.C.V.) DE 6MM. DE ESPESOR, MEDIDAS 3.00 X 2.00 M. TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS; EXCAVACIÓN EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIA CON EQUIPO MECÁNICO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
FINANCIACIÓN UNO	\$396,551.72	2	\$396,551.72	6 PARCIAL 1	\$800,000.00	\$400,000.00	\$3,448.28	\$0.00	\$396,551.72
ANTICIPO	\$400,000.00	1	\$400,000.00	3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
TOTALES	\$796,551.72		\$796,551.72		\$800,000.00	\$400,000.00	\$3,448.28	\$0.00	\$796,551.72

MONTO AUTORIZADO:	\$800,000.00	C/IVA	
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$800,000.00	C/IVA	
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/>	NO EXISTE <input type="checkbox"/>	NO APLICA <input type="checkbox"/>
DEPENDENCIA QUE VALIDA:			X
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/>	NO EXISTE <input type="checkbox"/>	NO APLICA <input type="checkbox"/>
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:			X
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE <input type="checkbox"/>	NO EXISTE <input type="checkbox"/>	NO APLICA <input type="checkbox"/>
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:			X
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/>	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS <input type="checkbox"/>	LICITACIÓN PÚBLICA <input checked="" type="checkbox"/>

NO. DE CONTRATO:	MGZ-EMP2020/0502/OP-003	FECHA:	31/03/2020
CONTRATISTA:	JAIR DE JESUS HERNANDEZ ESPINOSA		
RFC:	HEEJ9108254Q2		
MONTO CONTRATADO:	\$800,000.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRAMADA	REAL
	26/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
	TÉRMINO	30/06/2020	30/04/2020
	DÍAS	97	30
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA <input type="checkbox"/>
	MONTO:	\$400,000.00	PORCENTAJE: 50.00
	FECHA DE PAGO:	01/04/2020	

B) REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$400,000.00	27/04/2020
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$800,000.00	27/04/2020
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$400,000.00	\$68,965.52	\$80,000.00
AFIANZADORA:	RTA, S.A DE C.V., GRUPO	RTA, S.A DE C.V., GRUPO	RTA, S.A DE C.V., GRUPO
No. DE FIANZA:	3320-04218-2	3320-04220-2	3900-04021-3
FECHA:	01/04/2020	01/04/2020	27/04/2020
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO		INICIAL
	NO APLICA		FINAL
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$800,000.00	C/IVA	

OBSERVACIONES:

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA DIRECTOR DE OBRAS
RANCISCO GUTIERREZ MEDINA BENAVID SUPERVISOR

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2020

FECHA DE ELABORACION:	24/06/2020
MES QUE SE REPORTA	MAYO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	NUEVO RENACIMIENTO 2000	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES 1,3 Y 7 ENTRE CALLES 2 Y 4, CALLE 4 ENTRE CALLES 3 Y 5 DE LA LOCALIDAD DE RENACIMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	EMPRÉSTITO FISMDF	No. DE OBRA:	2020300690503		

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		SI	NO	X	ANTECEDENTES:	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:					GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
TIPO DE ZONA:	RURAL X URBANA	CLAVE AGE:	N/A	MUY ALTO	ALTO	MEDIO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI	NO	BAJO	X	MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	NO	TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:		
				DIRECTA	COMPLEMENTARIA	X
						RESTRINGIDA
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA						
LATITUD	20.436815000	LONGITUD	-97.076056000			

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
SOMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA ROTULADO EN LONA DE POLICLORURO DE VINILO (P.C.V.) DE 6MM. DE ESPESOR, MEDIDAS 3.00 X 2.00 M. TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS; EXCAVACIÓN EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIA CON EQUIPO MECÁNICO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
SOMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA ROTULADO EN LONA DE POLICLORURO DE VINILO (P.C.V.) DE 6MM. DE ESPESOR, MEDIDAS 3.00 X 2.00 M. TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS; EXCAVACIÓN EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIA CON EQUIPO MECÁNICO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS				IMPORTE NETO	
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACION	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR		CARGOS ADICIONALES
ESTIMACIÓN UNO	\$1,239,224.14	2	\$1,239,224.14	RP1	\$2,500,000.00	\$1,250,000.00	\$10,775.86	\$0.00	\$1,239,224.14
ANTICIPO	\$1,250,000.00	1	\$1,250,000.00	D516F76977	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00
TOTALES	\$2,489,224.14		\$2,489,224.14		\$2,500,000.00	\$1,250,000.00	\$10,775.86	\$0.00	\$2,489,224.14

MONTO AUTORIZADO:	\$2,500,000.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$2,500,000.00	C/IVA
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE X NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	CAEV	
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE X NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	CAEV	
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:		EXISTE
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	X

NO. DE CONTRATO:	MGZ-EMP2020/0503/OP-004	FECHA:	31/03/2020
CONTRATISTA:	RICANO HUIDOBRO CONSTRUCCIONES SA DE CV		
RFC:	RHC0411269Q3		
MONTO CONTRATADO:	\$2,500,000.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRAMADA	REAL
	26/03/2020	01/04/2020	
	TÉRMINO	30/06/2020	28/04/2020
	DÍAS	97	28
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$1,250,000.00	PORCENTAJE: 50.00
	FECHA DE PAGO:		

B) REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$1,250,000.00	28/04/2020
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$2,500,000.00	28/04/2020
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$1,250,000.00	\$215,517.24	\$250,000.00
AFIANZADORA:	RTA, S.A DE C.V., GRUPO RTA, S.A DE C.V., GRUPO RTA, S.A DE C.V., GRUPO		
No. DE FIANZA:	3900-03036-2	3900-03037-5	3900-04070-1
FECHA:	31/03/2020	31/03/2020	28/04/2020
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO		INICIAL FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$2,500,000.00	C/IVA	

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA
DIRECTOR DE OBRAS

LUIS JAVIER PROSTICO LÓPEZ
SUPERVISOR

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2020

FECHA DE ELABORACION: 24/06/2020
MES QUE SE REPORTA MAYO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: GUTIERREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE: 30DPR5104-U COLONIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: EMPRESTITO FISIMDF	No. DE OBRA: 2020300690505	

ANTECEDENTES:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	MUY ALTO	ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO <input checked="" type="checkbox"/>
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:	
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA <input checked="" type="checkbox"/>	CLAVE AGE: 019A	DIRECTA	X COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA			
LATITUD 20.44390000	LONGITUD -97.096699000		

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA SUPERFICIES MENORES A 300 M2; DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS DE 12 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS; EXCAVACION A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL SECO TIPO II. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO; RELLENO EN ZANJAS

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA SUPERFICIES MENORES A 300 M2; DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS DE 12 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS; EXCAVACION A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL SECO TIPO II. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO; RELLENO EN ZANJAS

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACION	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ESTIMACION UNO	\$495,689.66	2	\$495,689.66	109-P1	\$1,000,000.00	\$500,000.00	\$4,310.34	\$0.00	\$495,689.66
ANTICIPO	\$500,000.00	1	\$500,000.00	A-52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
TOTALES	\$995,689.66		\$995,689.66		\$1,000,000.00	\$500,000.00	\$4,310.34	\$0.00	\$995,689.66

MONTO AUTORIZADO:	\$1,000,000.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$1,000,000.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:		EXISTE <input checked="" type="checkbox"/>
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/> INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS <input checked="" type="checkbox"/> LICITACIÓN PÚBLICA <input type="checkbox"/>	

NO. DE CONTRATO:	MGZ-EMP2020/0505/OP-006	FECHA:	31/03/2020
CONTRATISTA:	ERENDIRA YULIANI PEREZ LUNA		
RFC:	PELE720728616		
MONTO CONTRATADO:	\$1,000,000.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRAMADA	REAL
	26/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
	TÉRMINO	30/06/2020	28/04/2020
	DÍAS	97	28
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA <input type="checkbox"/>
	MONTO:	\$500,000.00	PORCENTAJE: 50.00
	FECHA DE PAGO:	01/04/2020	

B) REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$1,000,000.00	28/04/2020
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$1,000,000.00	28/04/2020
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	100	1000	100	100	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$500,000.00	\$86,206.90	\$100,000.00
AFIANZADORA:	RTA, S.A DE C.V., GRUPO RTA, S.A DE C.V., GRUPO RTA, S.A DE C.V., GRUPO		
No. DE FIANZA:	3900-03032-0	3900-03033-7	3900-03034-5
FECHA:	31/03/2020	31/03/2020	28/04/2020
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO		INICIAL FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$1,000,000.00		C/IVA

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA
DIRECTOR DE OBRAS

NORBERTO JUÁREZ MEJIA
SUPERVISOR

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2020

FECHA DE ELABORACION: 24/06/2020
MES QUE SE REPORTA MAYO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: GUTIERREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL "DR. ALEJANDRO CERISOLA", CLAVE: 30EST0001A.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: EMPRÉSTITO FISMDF	No. DE OBRA: 2020300690506	

ANTECEDENTES:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	MUY ALTO	ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO <input checked="" type="checkbox"/>
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:	
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA <input checked="" type="checkbox"/>	CLAVE AGE: N/A	DIRECTA	X COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: <input checked="" type="checkbox"/>	SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: <input checked="" type="checkbox"/>		
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA			
LATITUD 20.464780000	LONGITUD -97.083746000		

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA SUPERFICIES MENORES A 300 M2; DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS DE 12 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS; EXCAVACION A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL SECO TIPO II. INCLUYE: ASFIC DE TALUDES Y FONDO; RELLENO EN ZANJAS.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA SUPERFICIES MENORES A 300 M2; DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS DE 12 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS; EXCAVACION A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL SECO TIPO II. INCLUYE: ASFIC DE TALUDES Y FONDO; RELLENO EN ZANJAS.

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
STIMACIÓN UNO	\$495,689.66	2	\$495,689.66	F19-P1	\$1,000,000.00	\$500,000.00	\$4,310.34	\$0.00	\$495,689.66
ANTICIPO	\$500,000.00	1	\$500,000.00	A1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
TOTALES	\$995,689.66		\$995,689.66		\$1,000,000.00	\$500,000.00	\$4,310.34	\$0.00	\$995,689.66

MONTO AUTORIZADO:	\$1,000,000.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$1,000,000.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/>	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/>	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/>	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:		
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/> INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS <input checked="" type="checkbox"/> LICITACIÓN PÚBLICA <input type="checkbox"/>	EXISTE <input type="checkbox"/>

NO. DE CONTRATO:	MGZ-EMP2020/0506/OP-007	FECHA:	31/03/2020
CONTRATISTA:	JAIME PEREZ HERNANDEZ		
RFC:	PEHJ851030T71		
MONTO CONTRATADO:	\$1,000,000.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRAMADA	REAL
		26/03/2020	01/04/2020
	TÉRMINO	30/06/2020	28/04/2020
	DÍAS	97	28
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA <input type="checkbox"/>
	MONTO:	\$500,000.00	PORCENTAJE: 50.00
	FECHA DE PAGO:	01/04/2020	

B) REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$1,000,000.00	28/04/2020
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$1,000,000.00	28/04/2020
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$500,000.00	\$86,206.90	\$100,000.00
AFIANZADORA:	RTA, S.A DE C.V., GRUPO RTA, S.A DE C.V., GRUPO RTA, S.A DE C.V., GRUPO		
No. DE FIANZA:	3320-04216-3	3320-04217-0	3320-04218-1
FECHA:	31/03/2020	31/03/2020	28/04/2020
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO		INICIAL FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$1,000,000.00	C/IVA	

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA
DIRECTOR DE OBRAS

JANISCO GUILERMO MEDINA BENAVIDE
SUPERVISOR

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2020

FECHA DE ELABORACION: 24/06/2020
MES QUE SE REPORTA MAYO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: NUEVO RENACIMIENTO 2000	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA CLAVE: 30DPV1603-O, LOCALIDAD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: EMPRÉSTITO FISIMDF	No. DE OBRA: 2020300690507	

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	NO	X
ANTECEDENTES:				
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:				
TIPO DE ZONA:	RURAL X	CLAVE AGE:	N/A	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	URBANA	SI	NO	X
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	NO	X
GRADO DE REZAGO SOCIAL:				
	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO X
				MUY BAJO
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:				
	DIRECTA	X	COMPLEMENTARIA	RESTRINGIDA
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA				
LATITUD	20.435986000	LONGITUD	-97.070465000	

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS; DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE DE 10 CM DE ESPESOR; PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 KG/CM2., AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO ESCORILLADO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6.6 /10-10; EXCAVACIÓN A

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS; DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE DE 10 CM DE ESPESOR; PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 KG/CM2., AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO ESCORILLADO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6.6 /10-10; EXCAVACIÓN A

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	FACTURAS		IMPORTE NETO
		No.	MONTO						5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	
ESTIMACIÓN UNIC	\$495,689.66	2	\$495,689.66	5 PARCIAL	\$1,000,000.00		\$1,000,000.00	\$500,000.00	\$4,310.34	\$0.00	\$495,689.66
ANTICIPO	\$500,000.00	1	\$500,000.00	A1	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
TOTALES	\$995,689.66		\$995,689.66		\$1,000,000.00		\$1,000,000.00	\$500,000.00	\$4,310.34	\$0.00	\$995,689.66

MONTO AUTORIZADO:	\$1,000,000.00	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$1,000,000.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	LICITACIÓN PÚBLICA	EXISTE

NO. DE CONTRATO:	MGZ-EMP2020/0507/OP-008	FECHA:	31/03/2020
CONTRATISTA:	MARIA ISABEL LEAL TOMAS		
RFC:	LET1951227LA9		
MONTO CONTRATADO:	\$1,000,000.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRAMADA	REAL
	TÉRMINO	26/03/2020	01/04/2020
	DÍAS	30/06/2020	27/04/2020
		97	27
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$500,000.00	PORCENTAJE: 50.00
FECHA DE PAGO:	01/04/2020		

B) REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$500,000.00	27/04/2020
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$1,000,000.00	27/04/2020
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$500,000.00	\$86,206.90	\$100,000.00
AFIANZADORA:	RTA, S.A DE C.V., GRUPO RTA, S.A DE C.V., GRUPO RTA, S.A DE C.V., GRUPO		
No. DE FIANZA:	3320-04230-1	3320-04232-1	3900-04067-1
FECHA:	31/03/2020	31/03/2020	27/04/2020
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO		INICIAL FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$1,000,000.00	C/IVA	

OBSERVACIONES:

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA
DIRECTOR DE OBRAS

LUIS JAVIER OBOSTICO LÓPEZ
SUPERVISOR

*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

FECHA DE ELABORACIÓN:
24/06/2020
MES QUE SE REPORTA
MAYO

EJERCICIO 2020

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIÉRREZ ZAMORA	LOCALIDAD: IGNACIO M. ALTAMIRANO (PLAN DE ALTAMIRANO)	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA ADALBERTO TEJEDA CLAVE: 30ETH0259-T EN LA LOCALIDAD IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: EMPRÉSTITO FISIMDF	No. DE OBRA: 2020300690508	

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	NO	X
ANTECEDENTES:				
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:				
TIPO DE ZONA:	RURAL X URBANA	CLAVE AGE:	N/A	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI	NO	X
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	NO	X
GRADO DE REZAGO SOCIAL:				
	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO X MUY BAJO
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:				
	DIRECTA	X	COMPLEMENTARIA	RESTRINGIDA
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA				
LATITUD	20.385901000	LONGITUD	-97.133531000	

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS; EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO; PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F/C=100 KG/CM² AGREGADO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS; EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO; PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F/C=100 KG/CM² AGREGADO

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ESTIMACIÓN UNO	\$437,283.79	1	\$437,283.79	110	\$439,176.80	\$0.00	\$1,893.00	\$0.00	\$437,283.79
TOTALES	\$437,283.79		\$437,283.79		\$439,176.80	\$0.00	\$1,893.00	\$0.00	\$437,283.79

MONTO AUTORIZADO:	\$439,176.80	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$439,176.80	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE X NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	SEV	
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:		EXISTE
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	X

NO. DE CONTRATO:	MGZ-EMP2020/0508/OP-009	FECHA:	31/03/2020
CONTRATISTA:	ERENDIRA YULIANI PEREZ LUNA		
RFC:	PELE720728616		
MONTO CONTRATADO:	\$439,176.80	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRAMADA	REAL
	26/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
	TÉRMINO	30/06/2020	28/04/2020
	DÍAS	97	28
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

B) REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$439,176.11	28/04/2020
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$439,176.11	28/04/2020
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$37,860.07	\$43,917.68	
AFIANZADORA:	RTA, S.A DE C.V., GRUPO RTA, S.A DE C.V., GRUPO		
No. DE FIANZA:	3320-04241-3	3320-04244-3	
FECHA:	31/03/2020	28/04/2020	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO		INICIAL FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$439,176.80	C/IVA	

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA
DIRECTOR DE OBRAS

ALFREDO MORENO NERI
SUPERVISOR

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2020

FECHA DE ELABORACIÓN: 23/06/2020
MES QUE SE REPORTA MAYO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: GUTIERREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE INDEPENDENCIA Y PLAZOLETA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DE LA CRUZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS	No. DE OBRA: 2020300690850	

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		ANTECEDENTES:	
SI	NO	X	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:			
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA	CLAVE AGE: N/A	GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	NO	X
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO:	SI	NO	X
TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:			
DIRECTA		COMPLEMENTARIA	X
		RESTRINGIDA	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA			
LATITUD	20.455887000	LONGITUD	-97.084785000

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO; EXCAVACIÓN EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIA CON EQUIPO MECÁNICO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.; CARGA CON MAQUINARIA (CARGADOR FRONTAL CAT 950 SOBRE NEUMÁTICOS) DE LOS MATERIALES ALMACENADOS. ACARREO EN CAMIÓN 1ER

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO; EXCAVACIÓN EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIA CON EQUIPO MECÁNICO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.; CARGA CON MAQUINARIA (CARGADOR FRONTAL CAT 950 SOBRE NEUMÁTICOS) DE LOS MATERIALES ALMACENADOS. ACARREO EN CAMIÓN 1ER

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACION	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ESTIMACIÓN UNIC	\$309,646.17	2	\$309,646.17	PARCIAL 1	\$624,677.50	\$312,338.74	\$2,692.58	\$0.00	\$309,646.17
ANTICIPO	\$312,338.75	1	\$312,338.75	23AE1D3440	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,338.76
TOTALES	\$621,984.92		\$621,984.92		\$624,677.50	\$312,338.74	\$2,692.58	\$0.00	\$621,984.93

MONTO AUTORIZADO:	\$624,677.50	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$624,677.50	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	LICITACIÓN PÚBLICA	EXISTE

NO. DE CONTRATO:	MGZ-RHIDROT/2020/0850/OP-001	FECHA:	14/03/2020
CONTRATISTA:	RICAÑO HUIDOBRO CONSTRUCCIONES SA DE CV		
RFC:	RHC0411269Q3		
MONTO CONTRATADO:	\$624,677.50	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRAMADA	REAL
	TÉRMINO*	17/03/2020	16/03/2020
	DÍAS	15/04/2020	14/04/2020
	DÍAS	30	30
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$312,338.76	PORCENTAJE: 50.00
	FECHA DE PAGO:	17/03/2020	

B) REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$624,667.50	20/04/2020
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$624,667.50	20/04/2020
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	50	100	100	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	50	100	100	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	50	100	100	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$312,338.76	\$53,851.51	\$62,467.75
AFIANZADORA:	RTA, S.A DE C.V., GRUPO RTA, S.A DE C.V., GRUPO RTA, S.A DE C.V., GRUPO		
No. DE FIANZA:	3900-03024-5	3900-03025-4	3900-04015-2
FECHA:	14/03/2020	14/03/2020	14/04/2020
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO	INICIAL	FINAL
NO APLICA			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$624,677.50	C/IVA	

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA
DIRECTOR DE OBRAS

NORBERTO JUÁREZ MEJÍA
SUPERVISOR

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /58705

**C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/06/2020 03:44:42 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/06/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	MAYO
Fuente de financiamiento:	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2015 (SENTENCIA)
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

Jo2NnPvA0f4RBu4IJBfTA/nNuBS4Iq7gTkUNv4brQU2qEqvhO0gp0dROf/s3BEzc6k7cYIyPWdSr0FWaEpuCzS4r6FMR/sZeNyLQS4/Y2YoqbTmBjpeG9EXN7Wr3hwBCxeA6+t8yUXQfoYEC2EtWStBwHcujz2wCXQJCLTmAqU8=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /58692

**C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/06/2020 03:35:16 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/06/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	MAYO
Fuente de financiamiento:	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 2019
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

H7x9gr6+d5/1/3sDNmQNMCMwZ5Kxi2VeT1Pf9ZbcPnpjEz2TbfRh8zIEockZnKjuB2c6MorYdwGyk0nEtzZU
D45x3+7dRZMduLE5cfWZQh+ObWwiOnjeufKBnMYN/6paGXUN3IVEjwc2/kltmJ9ru7sUK4eTEYbisbwFuaL
6ZtA=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /58693

**C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/06/2020 03:48:23 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/06/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	MAYO
Fuente de financiamiento:	RECURSOS FISCALES
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

nofJ8V/nH+4MSiufPgX4BarFNUJ3JoZOIMADThAuuAJQswcTPS8ghzhuoB/ioUOERCdQVkyRQoTjDugrLv
dT3O0uais2kVVTqoeGFtwzvK8QE0uyFJw2/g8fU3wRTTrTnGha3azJT6/ggO6ffN+WZ6MunZyDFpm5BoU/V
Nf/tFn0=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /58729

**C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/06/2020 03:42:01 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/06/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	MAYO
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2016 (SENTENCIA)
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

pzmavFZgeJYbsHQzwwkuMysGS72Ckk3li+OyuCXrdvImGYGEJWfomIXdq+kGH969KVAIVxXRSNPo+czxNFRuycpwJQbHQDIrlvXrY4SGkTiNucc7Hy8g3MxtgJf80/xDO2pc+070uW+YXzal9sKwtxAKGqUgzRRoBrb912IYszQ=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /59213

**C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/06/2020 03:47:04 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/06/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	MAYO
Fuente de financiamiento:	INGRESOS MUNICIPALES POR BURSATILIZACIÓN 2016 (SENTENCIA)
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

oGy7xXWfBcqX7jiqwtuPQGr5z/D1T3ibzWQeZQefdQKUYFcCc6NAOsheVN4WS9Kxa1SjkNTYtrcgPvrWzj3LG0NnfMvkGcBDpmjFxxUgH2Nh3ywEiCUD5ko37Xxk+t7WsHQ4DPaMQfbgKp/kzOU4mWE65egKyVrz7XeaY0AxKog=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /58704

**C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/06/2020 03:39:30 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/06/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	MAYO
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

ccFjpZVGYSvMY54q2bLLuMD2dN2xu+3TlyAuLILNV7xc+OkhloqTXhH8FD6srap6TvbNArz2UgxdL4IEPGZ
b25qACoF5z/a9JZs3YcZ633blYhHknwhxEjNhJTAY24WfWCsxoZ8RlpFx/8s3xRQqJ1h1hoRJM1NH7aNxva
hJ3l0=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /58895

**C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/06/2020 03:43:15 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/06/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	MAYO
Fuente de financiamiento:	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 (SENTENCIA)
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

roY3MBPc8Jn+DrTC72IJVwaduAY9cRt9n48Dxhh/hEJXItL4A8/SAJ5Au7MV6n4ybWQkIGGRfc5QC96S7q
KKU5E6177/HS+OX6hqqQrulylZdAHM6NSKLiNhLbPBYvdmnChbTXAZB7Hpt1LPpn+tdZ61lwpUdeFJRi4s
hXEQh0=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /58691

**C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/06/2020 03:49:13 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/06/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	MAYO
Fuente de financiamiento:	SEGUIMIENTO CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 2019
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

jo/lyZWpNLP0rQwLMOMGQb3qNyAJEUODNrhVJy9zpFHArBKccVb/IVo7PfwkRmkOgCEIPnx1QIKaMpybe1saAxvZ27uKNf8Ndp6FAcDXgUc/E9R35plblL0G6g0MLo8AleKkgui+NZIjM/QhTLauxy/E3gMobZxyGHju37rcZI=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /59128

**C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/06/2020 03:37:53 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/06/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	MAYO
Fuente de financiamiento:	EMPRÉSTITO FISMDF
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

Wo2fibCvtUwDrAhgaYrGonW+eSOS5ZtZmTQX0A73+GPZQVyYeX3rPPNtitg1YFzOG4EYBr3f7aYZawYN
Sn8Bhc8+i68yht5nG54Pc9vd4rBUs63AtY856bP/5ibFTe/9Q33eBgmqF7xm3aEzNVMgDg2BuTd6Oorsi8O
WREAdba8=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /58890

**C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/06/2020 03:46:03 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/06/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	MAYO
Fuente de financiamiento:	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2016 (SENTENCIA)
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

UbHHXLaHzs23RDCvdg4vWUyaE/kUBjm1QhiK7/eyh+2os+gdKdQZydtEb4JW1SRuELutSatWyZ+RLrb0tg
Q9zumqwm0Kjzmi6XMzgeB3p9n1Z4lk6UBLYVi4j9Pd8jbgSLr26TVDjKCeUMMwpcQJmR4na1UKLGHVHn
Th9k5LTds=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /59206

**C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/06/2020 03:41:00 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/06/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	MAYO
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

NRoev0rDDnoB95ByydLd/KknN/ztqhOsdAI53LM4AI14Fa5oejfUkHSqDQxt3v4AjFkqQyhvaa/o8yfkmpEjhzS
FeHSIUw3nEsj9z/NLk28PSAOI9QMny1Re8au9i0ImZcQTwmC853b8TRD7o+FspJN30HfID04Bib7qsmIU56
E=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA
PRESENTE

ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS
INTEGRACIÓN DEL ESTADO MENSUAL DE OBRA PÚBLICA

PERIODO: JUNIO

FECHA DE RECEPCIÓN: 17/06/2020 AL 30/06/2020

DOCUMENTO ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO	RECEPCIÓN	
		FECHA	HORA
OP1. OFICIO DE REMISIÓN.	PDF	25/06/2020	16:01:53
OP2. ACTA DE SESIÓN DE CABILDO.	PDF	25/06/2020	16:02:39
OP3. RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES.	PDF	25/06/2020	16:03:03
OP4. REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (FORMATO 9).	PDF	25/06/2020	16:04:59
OP5. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO (FORMATO 11).	PDF	25/06/2020	16:05:32
OP6. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. (FORMATO...	PDF	-	-
OP7. PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE OBRAS Y ACCIONES.	PDF	25/06/2020	16:29:43
OP12. MODIFICACIÓN A LA PROPUESTA DE INVERSIÓN (FORMATO 02).	PDF	25/06/2020	16:38:19

El presente documento se emite en el caso de Estados Financieros y Estados de Obra Pública mensuales de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para las demás se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. No exime de solicitudes, se reciben documentos con reserva de Ley, este recibo no implica validación de la información.
