



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!

¡YA ES HORA DE CREER EN TI!
ESPERANZA
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL
Y COMBATE A LA POBREZA



INFORME MENSUAL DE ESTADO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES

SEPTIEMBRE 2018



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA.
OFICIO No. P-2018/17/10-0569
ASUNTO: REPORTE MES DE
SEPTIEMBRE.

DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SÁINZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
LXIV LEGISLATURA DEL ESTADO
XALAPA, VERACRUZ.
P R E S E N T E :

El que suscribe **C. Ing. Wilman Monje Morales**, Presidente Municipal Constitucional de Gutiérrez Zamora, Ver.; por medio del presente me dirijo a usted para hacer de conocimiento que en cumplimiento a lo que establece el artículo 30 de la *Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*, así como *Las Reglas de Carácter General para el cumplimiento de la Presentación de Información Municipal a través de Medios Electrónicos* al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz; remito a Usted el **Estado de Obra Pública correspondiente al mes de Septiembre 2018**, generado en el sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), así como el acta de cabildo donde fueron aprobados.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos y quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Gutiérrez Zamora, Ver.; a Miércoles 17 de Octubre de 2018.

A T E N T A M E N T E


ING. WILMAN MONJE MORALES.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA.
OFICIO No. P-2018/17/10-0570
ASUNTO: REPORTE MES DE
SEPTIEMBRE.

C.P.C LORENZO ANTONIO PORTILLA VÁSQUEZ
AUDITOR GENERAL TITULAR DEL ORGANO
DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO.
PRESENTE:

El que suscribe **C. Ing. Wilman Monje Morales**, Presidente Municipal Constitucional de Gutiérrez Zamora, Ver.; por medio del presente me dirijo a usted para hacer de conocimiento que en cumplimiento a lo que establece el artículo 30 de la *Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*, así como *Las Reglas de Carácter General para el cumplimiento de la Presentación de Información Municipal a través de Medios Electrónicos* al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz; remito a Usted el **Estado de Obra Pública correspondiente al mes de Septiembre 2018**, generado en el sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), así como el acta de cabildo donde fueron aprobados.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos y quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Gutiérrez Zamora, Ver.; a Miércoles 17 de Octubre de 2018.

ATENTAMENTE


ING. WILMAN MONJE MORALES.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL





ACTA NUMERO 58 SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
GUTIÉRREZ ZAMORA, VERACRUZ

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO efectuada por el Honorable Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz, a las NUEVE horas del QUINCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, de conformidad con lo que disponen los Artículos 36, Fracción I, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz-Llave.- Preside el C. Wilman Monje Morales Presidente Municipal, con quórum integrado por los ciudadanos: C. Rosa María Ortega González, Sindica Única; C. Gonzalo Quiñones López Regidor Primero, Silvana Rodríguez Martínez Regidora Segunda, Francisco Hatzel Gómez Ochoa Regidor Tercero, Rosalía García Guerrero Regidora Cuarta. El C. Presidente Municipal, C. Wilman Monje Morales, declara abierta la Sesión, acto seguido, el secretario del H. ayuntamiento, procede a pasar lista de asistencia, declarando quórum legal. Inmediatamente da lectura al Orden del Día, misma que a la letra dice: -----

PRESIDENTE
MUNICIPAL

SINDICA ÚNICA

REGIDOR
PRIMERO

REGIDORA
SEGUNDA

REGIDOR
TERCERO

REGIDORA
CUARTA

SECRETARIO
AYUNTAMIENTO

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA. -----
- 2.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -----
- 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----
- 4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.-----
- 5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018; DE LOS REPORTES DE LOS FONDOS DEL FISM DF 2018, FORTAMUN DF 2018, INTERESES FISM 2017, PRODERE 2018, FORTAFIN 2018, CAPUFE 2017, CAPUFE 2018. -----
- 6.- ASUNTOS GENERALES. -----

Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, C. WILMAN MONJE MORALES, pregunta al Cuerpo Edificio si están de acuerdo en aprobar el Orden del Día. - ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. -----


CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA APROBADO Y AGOTADOS LOS PUNTOS 1, 2 y 3 SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO. -----

4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.-----



En uso de la voz la C. Kitzia Eunice Juárez Salazar, Tesorera Municipal, informa al cabildo los Estados Financieros del mes de septiembre de 2018; acorde a lo establecido en el artículo 45 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre, mismos que fueron preparados por la Tesorería Municipal, en términos del artículo 72 fracción XIII de la misma Ley. En uso de la voz el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al cabildo si son de aprobarse los estados financieros correspondientes al mes de septiembre del año 2018.-----

El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO. - Se aprueban los Estados Financieros correspondientes al mes de septiembre del año 2018. APROBADO POR UNANIMIDAD. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.-----


PRESIDENTE
MUNICIPAL


SÍNDICA ÚNICA

5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018; DE LOS REPORTES DE LOS FONDOS DEL FISM DF 2018, FORTAMUN DF 2018, INTERESES FISM 2017, PRODERE 2018, FORTAFIN 2018, CAPUFE 2017, CAPUFE 2018. -----

En uso de la voz el C. Arq. Antonio Ríos Pérez, Director de Obras Públicas; informa al cabildo los Estados de Obra Pública del mes de septiembre de 2018, acorde a lo establecido en el artículo 73 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre; y presenta los reportes de los fondos del FISM DF 2018, FORTAMUN DF 2018, INTERESES FISM 2017, PRODERE 2018, FORTAFIN 2018, CAPUFE 2017, CAPUFE 2018. En uso de la voz el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al cabildo si son de aprobarse los estados de Obra correspondientes al mes de septiembre del año 2018; de los reportes de los fondos del FISM DF 2018, FORTAMUN DF 2018, INTERESES FISM 2017, PRODERE 2018, FORTAFIN 2018, CAPUFE 2017, CAPUFE 2018. El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO. - Se aprueban los Estados de Obra Pública correspondientes al mes de septiembre del año 2018, de los reportes de los fondos del FISM DF 2018, FORTAMUN DF 2018, INTERESES FISM 2017, PRODERE 2018, FORTAFIN 2018, CAPUFE 2017, CAPUFE 2018. APROBADO POR UNANIMIDAD. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.-----


REGIDOR
PRIMERO


REGIDORA
SEGUNDA


REGIDOR
TERCERO


REGIDORA
CUARTA


SECRETARIO DE
AYUNTAMIENTO

6.- ASUNTOS GENERALES. -----

No hubo asuntos generales.-----

Posterior a ello, el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal, en los términos que marca la Ley, en uso de la voz, hace del conocimiento de los miembros del cabildo que se agotaron los asuntos del orden del día de esta Quincuagésima octava sesión ordinaria del H. Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz.-----

7.- CLAUSURA. -----

Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS, DEL DÍA QUINCE DE



OCTUBRE, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA QUE FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS CIUDADANOS EDILES QUE EN ELLA INTERVINIERON ANTE EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, QUE AUTORIZA Y DA FE. REMÍTASE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA AL H. CONGRESO DEL ESTADO. -----

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
¡BRILLA CON FUERZA!



C. 
WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
PRESIDENCIA




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
¡BRILLA CON FUERZA!
SINDICATURA




ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICA ÚNICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
¡BRILLA CON FUERZA!
REGIDURIA PRIMERA

C. 


GONZALO QUIÑONES LÓPEZ
REGIDOR PRIMERO



C. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
¡BRILLA CON FUERZA!
REGIDURIA SEGUNDA

SILVIANA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
REGIDORA SEGUNDA



C. 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
¡BRILLA CON FUERZA!
REGIDURIA TERCERA

FRANCISCO HATZEL GÓMEZ OCHOA
REGIDOR TERCERO



C. 
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
REGIDURIA
CUARTA

ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA

C. 



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021

JORGE CHENA BATRES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/40486

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690301	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL "INFRAESTRUCTURA VIAL" EN LA CABECERA MUNICIPAL	Sí	Sí	Sí	No

EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/40486



SELLO DIGITAL:

h0HstHLOTlwEpb+TR3wPWdHIVdvtIK/LQQKIz4wqOv4Z0V12RMFD5Mg3CljXwrc54RgKDpcEqYdNgMRQcGBbIZ/neO+/6whFu24fnVA81SjgE0cvx13okFPMEMBI8++9Q9KJ+hcPaTKiq5PLZY+ejwWA3p+8JHxfFrmciV8TY74=



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/40486

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	16/10/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/10/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	SEPTIEMBRE
Fuente de financiamiento:	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

h0HsIHLOTlwEpb+TR3wPWdHiVdvtIK/
LQQKlz4wqOv4Z0V12RMFD5Mg3CljXwrc54RgKDpcEqYdNgMRQcGBblZ/neO+/
6whFu24fnVA81SjgE0cvxl3okFPMEMBI8++9Q9KJ+hcPaTKiq5PL2Y+ejwWA3p+8JHxfFnmciv8TY74=



"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/40487

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690302	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE MUNICIPAL EN COLONIA CUAHUTÉMOC, EN CABECERA MUNICIPAL	Sí	Sí	Sí	No

EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/40487



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
**OBRAS
PÚBLICAS**

SELLO DIGITAL:

crp/an9fd+pCtpUqhm/+hi99LmpTp++D7id9lj0Ult2miqyd0vKMxyF7Y1r8y8xTZGjCR/YeCk2hCwjf8oYchy8o53Kw/OUxzqIDmLnnB5VGedGoh6FfsK7foFLeUaBJNOn0VGgRZUXtp7H3jv2m79me2UQu0auGqt3NQZ+iQs=



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/40487

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
PRESENTE.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	16/10/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/10/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	SEPTIEMBRE
Fuente de financiamiento:	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

crp/an9fd+pCtpUqhm/+hi99LmpTp++D7id9lj0Ult2miqyd0vKMxYf7Y1r8y8xTZGjCR/
YeCk2hCwjf8oYchy8o53Kw/
OUxzqiDmLnnB5VGedGoh6FfsK7foFLeUaBJNOn0VGgRZUXTp7H3jv2m79me2UQu0auGqt3NQfZ+iQs=



"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/40881

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690101	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA DE LA RIBERA ENTRE PUENTE TECOLUTLA Y PUERTO CABALLERO	No	No	No	No
2018300690102	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO CORONADO - LOMAS CHICAS	No	No	Sí	No
2018300690103	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRILES - EL CEPILLO	No	No	Sí	No
2018300690104	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRILES - SAN ANTONIO CORONADO	No	No	Sí	No
2018300690105	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: RAFAEL VALENZUELA-LOMAS CHICAS	No	No	Sí	No
2018300690106	REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO EN CALLES NIÑOS HÉROES, EMILIANO ZAPATA Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL EJIDO SOTO Y GAMA	No	No	No	No
2018300690107	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE: 30DPR5104U COL. ASOCIACIÓN CIVIL.	No	No	Sí	No
2018300690110	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 109, COLONIAS DEL CARMEN, MURILLO VIDAL, HERNÁNDEZ OCHOA	Sí	Sí	Sí	No
2018300690112	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 202, COLONIAS PRIMERO DE MAYO, AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO Y FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS	No	No	Sí	No
2018300690113	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 185, COLONIA CUAUHTLAN	Sí	Sí	Sí	No
2018300690114	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 019A, COLONIAS EL PORVENIR, ASOCIACIÓN CIVIL PRIMERO DE MAYO Y AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO.	No	No	Sí	No



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
**OBRAS
PÚBLICAS**

SELLO DIGITAL:

UACogknmR4Vq4kjc6oQFvmjtNn/edp15JSLZ5qXlzJjUfCUCmKJT1FitlCYejDlae7QeoShOVdmlP5xY9mr1/qkdRgJBLDvngoORcC5WrJ2Ri9wVVR46LfaQOY0ww3Q71QxaxRMZhT+e2JbNYJ5JLZTjvLVQqkdZUU3yskhPUvA=



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/40881

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690116	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 217, COLONIAS FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, LUIS DONALDO COLOSIO Y GUADALUPE	Sí	Sí	Sí	No
2018300690108	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL ENRIQUE RODRIGUEZ CANO CLAVE: 30DPR0616M, LOCALIDAD EL COCO	No	No	Sí	No
2018300690109	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE DR. ALEJANDRO CERISOLA EN CABECERA MUNICIPAL.	No	No	No	No
2018300690124	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD LOMAS CHICAS	No	No	Sí	No
2018300690125	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD LOMAS DE ARENA	No	No	No	No
2018300690126	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD CARRILLO PUERTO SANTA ROSA	No	No	No	No
2018300690127	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL VALENZUELA	No	No	No	No
2018300690128	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	No	No	No	No
2018300690129	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL CEPILLO	Sí	Sí	Sí	No
2018300690130	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MACARENA ARRAZOLA	Sí	Sí	Sí	No
2018300690131	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA	Sí	Sí	Sí	No
2018300690132	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PAGUAS DE CORONADO	No	No	No	No



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2010 - 2021
**OBRAS
PUBLICAS**

SELLO DIGITAL:

UACogknmR4Vq4kjc6oQFvmjtNn/edp15JSLZ5qXlZjUfCUcmKJT1FitiCYejDlae7QeoShOVdmlP5xY9mr1/qkdRgJBLDvngoOrC5WwR2RI9wVR46LfaQOY0ww3Q71QxaxRMZhT+e2JbNYJ5JLZTjvLVQqkdZUU3yskhPUvA=



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/40881

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	23/10/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/10/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	SEPTIEMBRE
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

UACogknmR4Vq4kjc6oQFvmjtNn/edp15JSLZ5qXlzJjUfCUcmKJT1FitlCYejDlae7QeoShOVdmIP5xY9mr1/qkdRgJBLDvngoORcC5WrJ2RI9wVR46LFaqOY0ww3Q71QxaxRMZhT+e2JbNYJ5JLZTjvLVQqkdZUU3yskhPUvA=



"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/40940

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690225	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES Y OBRAS DE ACCESO EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, GALERAS DE LA FERIA Y LIENZO CHARRO.	No	No	Sí	No
2018300690226	REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL	No	No	No	No
2018300690232	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL	No	No	No	No

EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/40940



EL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
**OBRAS
PÚBLICAS**

SELLO DIGITAL:

PE1Kjp2uRNQwh/n0c9rTskbcIHMN6SrKIWZwpydwxN/N97ycYVx5OHb20I81rv50AuZiKlgTcNg+q7FNFe5H4qbnuJM3QcFTQD1NSPe1utiuhCof3lCjln/pMW6Mh2l/Ti6SHvlhw8iNGYpZuEmTEtHxAO1DFFA7rJSh+05Hwg=



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/40940

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	23/10/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/10/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	SEPTIEMBRE
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

PE1Kjp2uRNQwh/n0c9rTskbciHMN6SrKIWZWpydwxN/
N97ycYVx5OHb20181rv50AuZIKgTcNg+q7FNFe5H4qbnuJM3QcFTQD1NSPe1utiuhCof3ICjln/pMW6Mh2I/
Tl6SHvlhw8iNGYpZuEmTEtHxAO1DFfA7rJSht+05Hwg=



AL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2010 - 2021
**OBRAS
PUBLICAS**

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/41401

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690033	REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO "STA. ROSA"	No	No	Sí	No
2018300690042	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO LOMAS CHICAS A RAFAEL VALENZUELA DEL KM 0+000 AL KM 0+180	No	No	Sí	No
2018300690040	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RAFAEL VALENZUELA A IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, DEL KM 0+669 AL KM 1+334	No	No	Sí	No
2018300690043	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO LOMAS CHICAS A RAFAEL VALENZUELA DEL KM 0+775 AL KM 0+903	No	No	Sí	No

EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/41401



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRAS
PÚBLICAS

SELLO DIGITAL:

ThSeqW+WhlptChy/OSETFOTtWdHaFPBYB182u/XMntiaOBAhyVRr9WeY1Jx6U6pBgLajHYQEoGLX9bNRa+C7zJlpvp3tEpMcVIISFaGmd5zkRnbpqtJmGH/WaqclEQt1T4znMXy8kp8GOEYvI96QgM4I99UR/y3te8luYI4M4Uk=



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/41401

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/10/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/10/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	SEPTIEMBRE
Fuente de financiamiento:	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 2017
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

ThSeqW+WhlptChy/O5ETFOTiWdHaFPBYB182u/
XMntiaOBAhyVRr9WeY1Jx6U6pBgLajHYQEoGLX9bNRa+C7zJlpvp3tEpMcVIISFaGmd5zkRnbpqtJmGH/
WaqclEQt1T4znMXy8kp8GOEyvI96QgM4I99UR/y3te8luYI4M4Uk=



"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/41526

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690401	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - ENTRONQUE PAGUAS DE CORONADO DEL KM 0+000 AL KM 1+400	Sí	Sí	Sí	No
2018300690403	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE "B" ENTRE CALLE 2 Y LIMITE DE COLONIA FIDEL HERRERA, EN COLONIA ASOCIACIÓN CIVIL	No	No	No	No
2018300690404	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN SECCIÓN DE CALLES MELCHOR OCAMPO ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE MELCHOR OCAMPO Y JUVENTINO ROSAS, JUVENTINO ROSAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA ALLENDE EN LA LOCALIDAD RAFAEL	No	No	No	No
2018300690402	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: ARROYO GRANDE - LA GALEANA DEL KM 0+000 AL KM 2+000	Sí	Sí	Sí	No
2018300690405	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MÉXICO ENTRE CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO Y CALLE PERU Y PERU ENTRE CALLE MÉXICO Y GUYANA EN LA COLONIA FIDEL HERRERA	No	No	No	No
2018300690406	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMO: RICARDO FLORES MAGON- LAS BOMBAS	No	No	No	No
2018300690407	REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS CON PASAMANOS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES RICARDO FLORES MAGON Y FRANCISCO I. MADERO EN COLONIA REVOLUCIÓN	No	No	No	No



SELLO DIGITAL:

F9GGbt2RraXFILNY2RLO9kCC9TOEJfkc01FV1MTQ0hEYRrvEr6T1kwbJGMM5g1qNvQwtBB2jeQbHeaRN3Ef5dHy75C2gNAyEkUvInh4xDOO869n8eMrXIZq3+EH4/z1UfDSFrdLVX1/Sx4Fsmiz91xkc+dT5plqQCMU9tLI3I0=



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/41526

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690408	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CONSTITUCIÓN, ENTRE AVENIDA DOS DE ABRIL Y CINCO DE FEBRERO EN EL CERRO DE LOS PINOS, CABECERA MUNICIPAL	No	No	No	No
2018300690409	REHABILITACIÓN CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN CALLES: NIÑOS HÉROES, EMILIANO ZAPATA, GENERAL LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO DEL EJIDO SOTO Y GAMA	Sí	Sí	Sí	No
2018300690410	REHABILITACIÓN CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN CALLES AVENIDA MORELOS, AVENIDA HIDALGO, EMILIANO ZAPATA, JUVENTINO ROSAS DE LOCALIDAD RAFAEL VALENZUELA	Sí	Sí	Sí	No
2018300690411	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: ANCLON Y ARENAL BARRILES	No	No	No	No
2018300690412	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS ENTRE "EL FALSO Y CEMENTERIO DE SANTA ROSA" DEL KM 0+000 AL KM 1+460	No	No	No	No
2018300690414	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR MODELOS EFICIENTES TIPO CITI 55-305V EN CABECERA MUNICIPAL	Sí	Sí	Sí	No
2018300690415	REHABILITACIÓN DE PARQUE IGNACIO MUÑOZ ZAPOTAL CONSISTENTE EN: JARDINERAS, QUIOSCO, ANDADORES Y ALUMBRADO PÚBLICO	No	No	No	No
2018300690413	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLEJÓN CINCO DE MAYO, CERRO DE LA CRUZ EN CABECERA MUNICIPAL	No	No	No	No
2018300690416	REHABILITACIÓN DE PARQUE COL. FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS CONSISTENTE: JARDINERAS, ANDADORES, COLOCACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CANAL PLUVIAL Y ALUMBRADO PÚBLICO	No	No	No	No



SELLO DIGITAL:

F9GGBt2RraXFILNY2RLO9kCC9TOEJfKfCO1FV1MTQ0hEYRrvEr6T1kWbJGMM5g1qNvQwtB82jeQbHeaRN3EfSdHy75C2gNAyEkUvInh4xDOO869n8eMrXIZq3+EH4/z1UfDSFrdLVX1/Sx4Fsmiz91xkc+dT5plqQCMU9tLI310=



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/41526

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690417	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: ENTRONQUE A CAMINO A PALO BLANCO - A LA LOCALIDAD MARIO HERNÁNDEZ POSADAS DEL KM 0+000 AL KM 3+200	No	No	No	No
2018300690418	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN TRAMO: UNIVERSIDAD-ENTRONQUE A CAMINO PAGUAS DE ARROYO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 2+820	No	No	No	No

EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/41526



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
**OBRAS
PÚBLICAS**

SELLO DIGITAL:

F9GGBt2RraXFILNY2RLO9kCC9TOEJfkfCO1FV1MTQ0hEYRrvEr6T1kWbJGMM5g1qNvQwtBB2jeQbHeaRN3EFsDHy7SC2gNAyEkUv/Nh4xDOO869n8eMrXIZq3+EH4/z1UfDSFrdLVX1/Sx4Fsmiz91xkc+dT5plqQCMU9tLI310=



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/41526

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/10/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/10/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	SEPTIEMBRE
Fuente de financiamiento:	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

F9GGBt2RraXFILNY2RLO9kCC9TOEJfkfCO1FV1MTQ0hEYRrvEr6T1kWbJGMM5g1qNvQwtBB2jeQbHearR
N3EfSdHy7SC2gNAyEkUvInh4xDOO869n8eMrXIZq3+EH4/z1UfDSFrLVX1/
Sx4Fsmiz91xkc+dT5plqQCMU9tLI3I0=



"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/41565

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690050	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO EN SECCIONES AISLADOS "BACHEO", EN LA CABECERA MUNICIPAL.	No	No	No	Sí

EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/41565



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRAS
PÚBLICAS

SELLO DIGITAL:

REKvwpwq27W34Y6KdLO/11rWYisZv4idVDjDbc3q5MReR0olvEUWSO8o5hfrizO31A2TFmNRyHLQC4eep3OZ626/24Rm6Lawaq9jsNCrxPJHfJcG392Gi43g/14fAXWCJlzg1pC/azUd1an2vrhG0WQtV4HL2CDCuDBMfcjucg=



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/41565

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/10/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/10/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	SEPTIEMBRE
Fuente de financiamiento:	INTERESES FISMDF 2017
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

REKvwpwq27W34Y6KdLO/
11rWYisZv4idVDjDbc3q5MReR0oIvEUWSO8oShfrizO31A2TFmNRyHLQC4eep3OZ626/
24Rm6Lawaq9jsNCrxPJHFjCg392Gi43g/14fAXWCJlZg1pC/azlJd1an2vrhG0WQIV4HL2CDCuDBMfcjucg=



"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690301.00	Periodo:	SEPTIEMBRE	Número de estimación:	2.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL			Fuente de Financiamiento:	CTOS DE DESARROLLO REG
				Fecha de revisión:	15/10/2018



FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:
GUARNICIONES Y BANQUETAS



FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:
BANQUETAS

Observaciones:

Empty box for observations.



Ing. Alfredo Moreno Neri
INGENIERO
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfs



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690301.00	Periodo:	SEPTIEMBRE	Número de estimación:	2.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL "INFRAESTRUCTURA VIAL" EN LA CABECERA MUNICIPAL			Fuente de financiamiento:	CTOS DE DESARROLLO REC
				Fecha de revisión:	15/10/2018



FOTO
BANQUETAS

Concepto de obra ejecutado:




FOTO
GUARNICIONES Y BANQUETAS

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:




 Ing. Alfredo Moreno Neri
 INGENIERO
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690302.00	Periodo:	SEPTIEMBRE	Número de estimación:	2.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE MUNICIPAL EN COLONIA CUAHUTÉMOC, EN CABECERA		Fuente de Financiamiento:	ALECIMIEMTO FINANCIERO	
			Fecha de revisión:	15/10/2018	



FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:
MUROS



FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:
APLANADOS

Observaciones:



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-10
OBRAS
PÚBLICAS

Ing. Alfredo Moreno Neri
INGENIERO
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690302.00	Periodo:	SEPTIEMBRE	Número de estimación:	2.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE MUNICIPAL EN COLONIA CUAHUTÉMOC, EN CABECERA MUNICIPAL			Fuente de financiamiento:	RECIMIENTO FINANCIERO
				Fecha de revisión:	15/10/2018



FOTO

CIMBRAS Y HABILITADO DE ACEROS

Concepto de obra ejecutado:




FOTO

APLANADOS INTERIORES

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.


 Ing. Alfredo Moreno Neri
 INGENIERO
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690110.00	Periodo:	SEPTIEMBRE	Número de estimación:	1.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 109, COLONIAS DEL CARMEN,			Fuente de Financiamiento:	OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	15/10/2018



FOTO (12)
Concepto de obra ejecutado:
proceso



FOTO (13)
Concepto de obra ejecutado:
terminado

Observaciones:

Empty box for observations.



Ing. Rodolfo Gutiérrez Lechuga
Ingeniero
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690113.00	Periodo:	SEPTIEMBRE	Número de estimación:	2.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 185, COLONIA CUAUHTLAN			Fuente de Financiamiento:	OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	15/10/2018



FOTO (12)
Concepto de obra ejecutado:



FOTO (13)
Concepto de obra ejecutado:
acabados

Observaciones:

Empty box for observations.



AYUNTAMIENTO
CONDOMINIO
MUNICIPAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
VERACRUZ
2018
01-13
PÚBLICAS

Ing. Rodolfo Gutierrez Lechuga
Ingeniero
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	EL CEPILLO	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690129.00	Periodo:	SEPTIEMBRE	Número de estimación:	1.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL CEPILLO			Fuente de Financiamiento:	MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	15/10/2018



FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:
muros



FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:
acabados

Observaciones:

Empty box for observations.



Ing. Alfredo Moreno Neri
Ingeniero
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio: GUTIÉRREZ ZAMORA Localidad: MACARENA ARRAZOLA Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2018
 No. de obra: 2018300690130.00 Periodo: SEPTIEMBRE Número de estimación: 1.00
 Descripción: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MACARENA ARRAZOLA Fuente de Financiamiento: OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
 Fecha de revisión: 15/10/2018



FOTO (12)
 Concepto de obra ejecutado:
 muros

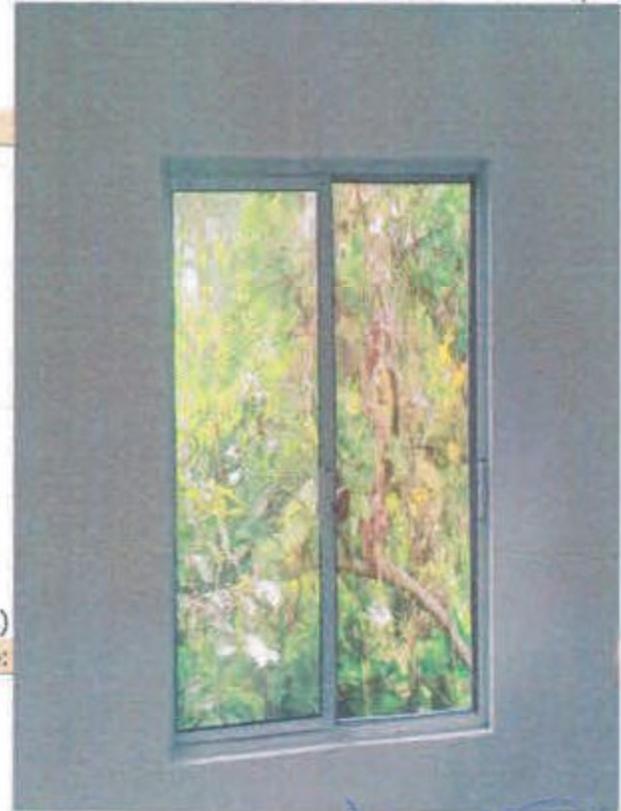


FOTO (13)
 Concepto de obra ejecutado:
 acabados

Observaciones:



Ing. Alfredo Moreno Neri
 Ingeniero
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	HERMENEGILDO GALEANA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690131.00	Periodo:	SEPTIEMBRE	Número de estimación:	1.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO			Fuente de Financiamiento:	OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	15/10/2018



FOTO (12)
Concepto de obra ejecutado:
Ddesplantes

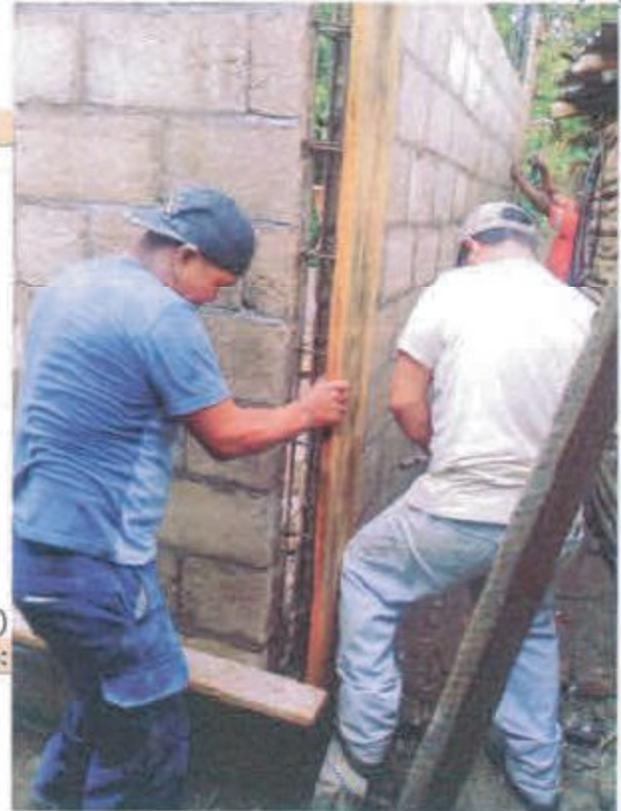


FOTO (13)
Concepto de obra ejecutado:
Muros

Obervaciones:

Empty box for observations.



Ing. Alfredo Moreno Neri
Ingeniero
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690116.00	Periodo:	SEPTIEMBRE	Número de estimación:	1.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 217, COLONIAS FERNANDO		Fuente de Financiamiento:	SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS	
			Fecha de revisión:	15/10/2018	



FOTO (12)
Concepto de obra ejecutado:
Muros



FOTO (13)
Concepto de obra ejecutado:
Estructuras

Observaciones:



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
OBRAS
PÚBLICAS

Ing. Rodolfo Gutiérrez Lechuga
Ingeniero
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690110.00	Periodo:	SEPTIEMBRE	Número de estimación:	1.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 109, COLONIAS DEL CARMEN, MURILLO VIDAL, HERNÁNDEZ OCHOA			Fuente de financiamiento:	OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	15/10/2018



FOTO

muros

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

muros

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

proceso



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
OBRAS
PÚBLICAS

Ing. Rodolfo Gutiérrez Lechuga

Ingeniero

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690113.00	Periodo:	SEPTIEMBRE	Número de estimación:	2.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 185, COLONIA CUAUHTLAN			Fuente de financiamiento:	MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	15/10/2018



FOTO

Muros

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Muros

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-10-15
OBRAS PÚBLICAS

Ing. Rodolfo Gutierrez Lechuga

Ingeniero

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio: GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad: EL CEPILLO	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2018
No. de obra: 2018300690129.00	Periodo: SEPTIEMBRE	Número de estimación: 1.00
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL CEPILLO		Fuente de financiamiento: OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
		Fecha de revisión: 15/10/2018



FOTO

muros

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

firmes de concreto

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.



(Handwritten signature)
 Ing. Alfredo Moreno Neri
 Ingeniero
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	HERMENEGILDO GALEANA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690131.00	Periodo:	SEPTIEMBRE	Número de estimación:	1.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA			Fuente de financiamiento:	OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	15/10/2018



FOTO

Concepto de obra
ejecutado:

muros



FOTO

Concepto de
obra ejecutado:

muros

Observaciones:



Ing. Alfredo Moreno Neri
Ingeniero
Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.****REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)****DATOS GENERALES**

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690116.00	Periodo:	SEPTIEMBRE	Número de estimación:	1.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 217, COLONIAS FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, LUIS DONALDO COLOSIO Y GUADALUPE			Fuente de financiamiento:	OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	15/10/2018



FOTO
Desplantes

Concepto de obra
ejecutado:



FOTO
Muros

Concepto de
obra ejecutado:

Observaciones:

Ing. Rodolfo Gutiérrez Lechuga
Ingeniero
Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.****REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)****DATOS GENERALES**

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	MACARENA ARRAZOLA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690130.00	Periodo:	SEPTIEMBRE	Número de estimación:	1.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MACARENA ARRAZOLA			Fuente de financiamiento:	MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	15/10/2018

**FOTO**

armados

Concepto de obra
ejecutado:**FOTO**

acabados

Concepto de
obra ejecutado:**Observaciones:**

Ing. Alfredo Moreno Neri
Ingeniero
Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	M. ALTAMIRANO (PLAN DE ALTA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690401.00	Periodo:	SEPTIEMBRE	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - ENTRONQUE PAGUAS DE CORONADO DEL KM 0+000			Fuente de financiamiento:	MINOS Y PUENTES FEDERAL
				Fecha de revisión:	15/10/2018



FOTO

Concepto de obra
ejecutado:

FOTO

Concepto de
obra ejecutado:

Observaciones:



Ing. Alfredo Moreno Neri

Ingeniero

Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	M. ALTAMIRANO (PLAN DE ALT.)	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690401.00	Periodo:	SEPTIEMBRE	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO:		Fuente de Financiamiento:	MINOS Y PUENTES FEDERAL	
			Fecha de revisión:	15/10/2018	

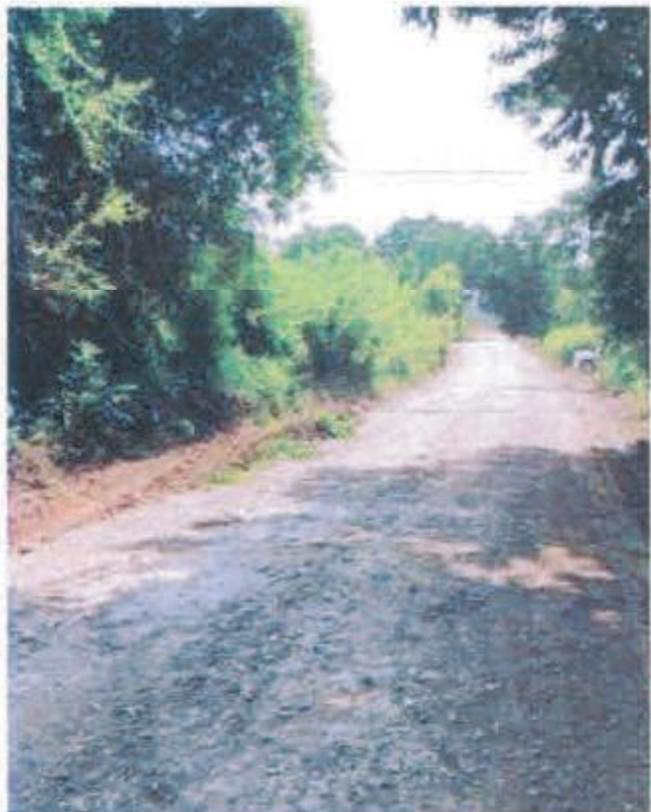


FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:

afines



FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:

afines

Observaciones:

Empty box for observations.



Ing. Alfredo Moreno Neri
Ingeniero
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	ARROYO GRANDE	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690402.00	Periodo:	SEPTIEMBRE	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO:			Fuente de Financiamiento:	MINOS Y PUENTES FEDERAL
				Fecha de revisión:	15/10/2018



FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:
Acamellonado-Mezclado



FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:
Tendido-Nivelado

Obervaciones:

Empty box for observations.



Ing. Alfredo Moreno Neri

Ingeniero

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	ARROYO GRANDE	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690402.00	Periodo:	SEPTIEMBRE	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: ARROYO GRANDE - LA GALEANA DEL KM 0+000 AL KM 2+000			Fuente de financiamiento:	MINOS Y PUENTES FEDERAL
				Fecha de revisión:	15/10/2018



FOTO
terracerias



FOTO
compactados

Concepto de obra
ejecutado:

Concepto de
obra ejecutado:

Observaciones:



Ing. Alfredo Moreno Neri
Ingeniero
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	EJIDO SOTO Y GAMA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690409.00	Periodo:	SEPTIEMBRE	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN CALLES: NIÑOS HÉROES, EMILIANO ZAPATA, GENERAL LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO DEL			Fuente de financiamiento:	MINOS Y PUENTES FEDERAL
				Fecha de revisión:	15/10/2018



FOTO
Aplicación de agua



FOTO
compactado

Concepto de obra ejecutado:

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:



Ing. Leonel Rodríguez Ríos
Ingeniero
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	EJIDO SOTO Y GAMA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690409.00	Periodo:	SEPTIEMBRE	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN CALLES; NIÑOS HÉROES,		Fuente de Financiamiento: MINOS Y PUENTES FEDERAL		
				Fecha de revisión:	15/10/2018



FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:

p



FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:



Ing. Leonel Rodríguez Ríos

Ingeniero

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	RAFAEL VALENZUELA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690410.00	Periodo:	SEPTIEMBRE	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN CALLES AVENIDA MORELOS, AVENIDA HIDALGO, EMILIANO ZAPATA, JUVENTINO ROSAS DE LOCALIDAD RAFAEL			Fuente de financiamiento:	MINOS Y PUENTES FEDERALES
				Fecha de revisión:	15/10/2018



FOTO
Retiro de escombros



FOTO
Nivelado

Concepto de obra ejecutado:

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:



Ing. Norberto Juárez Mejía
Ingeniero

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfls



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	RAFAEL VALENZUELA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690410.00	Periodo:	SEPTIEMBRE	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN CALLES AVENIDA MORELOS,			Fuente de Financiamiento:	MINOS Y PUENTES FEDERAL
				Fecha de revisión:	15/10/2018



FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:

Tendido



FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:

Nivelado

Observaciones:

Empty box for observations.



Ing. Norberto Juárez Mejía
 Ingeniero
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690414.00	Periodo:	SEPTIEMBRE	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR		Fuente de Financiamiento:	MINOS Y PUENTES FEDERAL	
			Fecha de revisión:	15/10/2018	

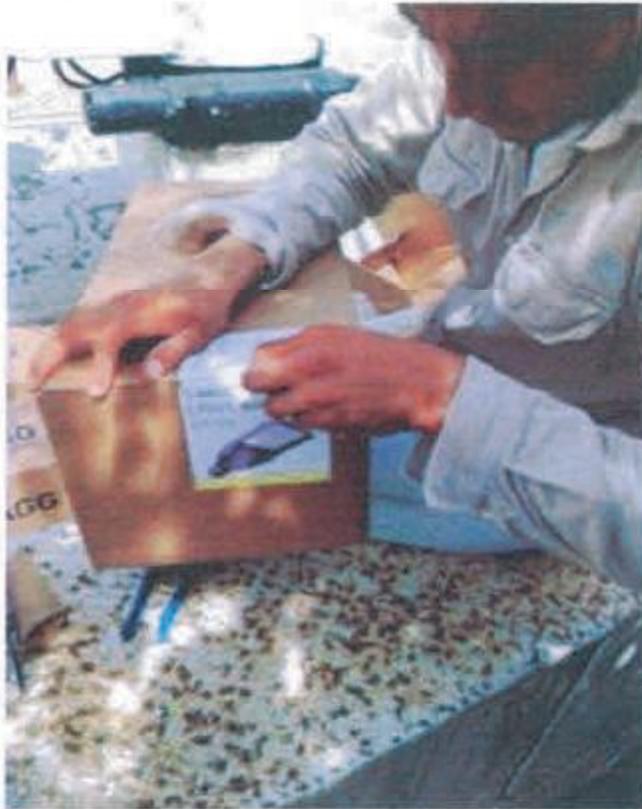


FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:
luminaria



FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:
colocación

Observaciones:

Empty box for observations.



Ing. Norberto Juárez Mejía
Ingeniero
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690414.00	Periodo:	SEPTIEMBRE	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR MODELOS EFICIENTES TIPO CTTI 55-305V EN CABECERA MUNICIPAL			Fuente de financiamiento:	MINOS Y PUENTES FEDERAL
				Fecha de revisión:	15/10/2018



FOTO

Luminarias - colocaciones



FOTO

Luminaria

Concepto de obra
ejecutado:Concepto de
obra ejecutado:

Observaciones:



Ing. Norberto Juárez Mejía
Ingeniero
Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

FECHA DE ELABORACION:
15/10/2018
MES QUE SE REPORTA
SEPTIEMBRE

EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA LOCALIDAD: GUTIERREZ ZAMORA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROYECTOS DE DESARROLLO No. DE OBRA: 2018300690301 "INFRAESTRUCTURA VIAL" EN LA CABECERA MUNICIPAL

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: TIPO DE ZONA: RURAL URBANA CLAVE AGE: N/A

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI X NO

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA: LATITUD 20.446698209 LONGITUD -97.092630985

GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA INDIRECTA COMPLEMENTARIA

PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
CONCRETO EN BANQUETAS Y GUARNICIONES

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACIÓN DOS	\$264,728.02	3	\$264,728.02	5	\$534,060.00	\$267,030.00	\$2,301.98	\$0.00	\$264,728.02
ESTIMACIÓN UN	\$1,058,912.07	2	\$1,058,912.07	3	\$2,136,240.00	\$1,068,120.00	\$9,207.93	\$0.00	\$1,058,912.07
ANTICIPO	\$1,335,150.00	1	\$1,335,150.00	2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,335,150.00
TOTALES	\$2,658,790.09		\$2,658,790.09		\$2,670,300.00	\$1,335,150.00	\$11,509.91	\$0.00	\$2,658,790.09

MONTO AUTORIZADO: \$2,670,300.00 C/IVA

MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$2,670,300.00 C/IVA

VALIDACIÓN DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA

DEPENDENCIA QUE VALIDA: EXISTE NO EXISTE NO APLICA

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA

DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: EXISTE

TIPO DE LICITACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA

NO. DE CONTRATO: GTZ-LR 12-PRODERE/2018 30 069 03 FECHA: 19/06/2018

CONTRATISTA: MATEO GÓMEZ GUERRA

MONTO CONTRATADO: \$2,670,300.00 C/IVA

PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO 01/04/2018 REAL 25/06/2018
TÉRMINO 15/12/2018
DÍAS 259 0

ANTICIPO: APLICA X NO APLICA MONTO: \$1,335,150.00 PORCENTAJE: 50.00
FECHA DE PAGO: 19/06/2018

REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$264,728.02	13/08/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$2,670,300.00	13/08/2018
FINQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	10	50	100	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	10	50	100	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	10	50	100	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIERREZ ZAMORA, VER. 2010 - 2021 OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO:

MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
PLAZO		INICIAL FINAL	
NO APLICA			

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: \$2,670,300.00 C/IVA

Arg. ANTONIO RIOS PEREZ DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Alfredo Moreno Neri SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

FECHA DE ELABORACIÓN:
15/08/2018
MES QUE SE REPORTA
SEPTIEMBRE

EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	GUTIERREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE ALBERGUE MUNICIPAL EN COLONIA CUAHUTEMOC, EN CABECERA MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE FORTALECIMIENT	No. DE OBRA:	2018300690302		

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:			
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGE:	N/A	MUY ALTO	ACTO
	URBANA			MEDIO	BAJO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI	X	NO	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			
LATITUD	20.4630360210349	LONGITUD	-97.0833351052974	DIRECTA	INDIRECTA
				COMPLEMENTARIA	X
				PROYECTO ESPECIAL	SI
				CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	NO
					X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS PARA ZAPATAS, DADOS Y CADENAS DE DESPLANTE, MUROS, HABILITADO DE ACERO PARA LOSAS Y CONCRETO, ACABADOS Y PINTURA,

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS PARA ZAPATAS, DADOS Y CADENAS DE DESPLANTE, MUROS

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACIÓN DO:	\$233,118.80	3	\$233,118.80	5	\$470,291.84	\$235,145.92	\$2,027.12	\$0.00	\$233,118.80
ESTIMACIÓN UN:	\$1,161,500.00	2	\$1,161,500.00	2	\$2,343,200.00	\$1,171,600.00	\$10,100.00	\$0.00	\$1,161,500.00
ANTICIPO	\$1,450,000.00	1	\$1,450,000.00	1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450,000.00
TOTALES	\$2,844,618.80		\$2,844,618.80		\$2,813,491.84	\$1,406,745.92	\$12,127.12	\$0.00	\$2,844,618.80

MONTO AUTORIZADO:	\$2,900,000.00	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$2,900,000.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA			EXISTE
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			X
	licitación pública			

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$233,118.80	11/09/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$2,844,618.80	11/09/2018
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	10	45	85	90	100	0	0
REAL	0	0	0	0	0	10	80	85	90	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	10	80	85	90	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO. DE CONTRATO:	GTZ-LR 13-FORTAFIN/2018 30 069 03	FECHA:	19/06/2018
CONTRATISTA:	MIGUEL ANGEL LIMA ESCAMILLA		
MONTO CONTRATADO:	\$2,900,000.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	02/04/2018	25/06/2018
	TÉRMINO	15/12/2018	
	DÍAS	90	0
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$1,450,000.00	PORCENTAJE: 50.00
	FECHA DE PAGO:		20/06/2018

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$1,450,000.00	\$250,000.00	
AFIANZADORA:	Fianzas Monterrey S.A DE Fianzas Monterrey S.A DE		
No. de FIANZA:	1947510	1947512	
FECHA:	19/06/2018	19/06/2018	
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$2,900,000.00	C/IVA	

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja



Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Alfredo Moreno Neri
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:	16/04/2018
MES QUE SE REPORTA	SEPTIEMBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	LOMAS CHICAS	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO CORONADO - LOMAS CHICAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2018300690102		

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		SI	X	NO						
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:								
TIPO DE ZONA:	RURAL X	CLAVE AGEB:	N/A	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	X	BAJO	MUY BAJO	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	X	NO	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:						
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI	X	NO	DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA				X
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA				PROYECTO ESPECIAL	Cuenta con Opinión Favorable	SI	NO			X
LATITUD	20.4261151964354	LONGITUD	-97.1408994396636							

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO CORONADO - LOMAS CHICAS
---	--

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:	RASTREO Y CUNETEO, EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE BANCO DE SABANA Y DE RIO, ESCARIFICADO Y ACAMELLONADO, TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO DE SUPERFICIE, COMPACTADO.
---	--

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACIÓN UNIC	\$384,159.48	3	\$384,159.48	55	\$775,000.00	\$387,500.00	\$3,340.52	\$0.00	\$384,159.48
ANTICIPO	\$387,500.00	2	\$387,500.00	30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,500.00
TOTALES	\$771,659.48		\$771,659.48		\$775,000.00	\$387,500.00	\$3,340.52	\$0.00	\$771,659.48

MONTO AUTORIZADO:	\$775,000.00	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$775,000.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA			EXISTE
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			X
	LICITACIÓN PÚBLICA			

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$775,000.00	09/04/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$775,000.00	09/04/2018
FINIQUITO:	\$384,159.48	09/04/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	06/04/2018

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO. DE CONTRATO:	ICO-AR 002-FISM DF/2018 30 069 011	FECHA:	02/03/2018
CONTRATISTA:	ISRAEL SALAZAR ESPINOSA		
MONTO CONTRATADO:	\$775,000.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRAMADA	REAL
		01/02/2018	05/03/2018
	TÉRMINO	15/12/2018	30/03/2018
	DÍAS	25	25
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$387,500.00	PORCENTAJE: 50.00
	FECHA DE PAGO:	13/03/2018	

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$387,500.00	\$66,810.35	\$66,810.00
AFIANZADORA:	FIRTA, S.A de C.V. Grupo Firta, S.A de C.V. Grupo Firta, S.A de C.V. Grupo Firta		
No. DE FIANZA:	3900-02488-4	3900-02489-5	3900-02495-8
FECHA:	01/03/2018	01/03/2018	05/04/2018
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$775,000.00	C/IVA	

OBSERVACIONES:	TERMINADA
----------------	-----------

*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GOBIERNO LOCAL
2018-2021
OBRAS
PÚBLICAS

AVG. ANTONIO RÍOS PÉREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ING. LEONEL RODRÍGUEZ RÍOS
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:	16/04/2018
MES QUE SE REPORTA	SEPTIEMBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	SAN ANTONIO CORONADO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRILES - SAN ANTONIO CORONADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	IFONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2018300690104		

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO							
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:									
TIPO DE ZONA:	RURAL	X									
	URBANA										
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	CLAVE										
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	AGEB:	SI	X	NO							
		SI	X	NO							
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:									
LATITUD	20.44126017385370	DIRECTA			INDIRECTA			COMPLEMENTARIA			X
LONGITUD	-97.13408624159720	PROYECTO ESPECIAL			CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE			SI			X
								NO			

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRILES - SAN ANTONIO CORONADO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

RASTREO Y CUNETEO, EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE BANCO DE SABANA Y DE RIO, ESCARIFICADO Y ACAMELLONADO, TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO DE SUPERFICIE, COMPACTADO.

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	\$ MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACIÓN UNIC	\$198,275.86	3	\$198,275.86	57	\$400,000.00	\$200,000.00	\$1,724.14	\$0.00	\$198,275.86
ANTICIPO	\$200,000.00	2	\$200,000.00	28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
TOTALES	\$398,275.86		\$398,275.86		\$400,000.00	\$200,000.00	\$1,724.14	\$0.00	\$398,275.86

MONTO AUTORIZADO:	\$400,000.00	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$400,000.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X		
	licitación pública			

NO. DE CONTRATO:	CO-AD 004-FISM DF/2018 30 069 011	FECHA:	02/03/2018
CONTRATISTA:	ISRAEL SALAZAR ESPINOSA		
MONTO CONTRATADO:	\$400,000.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/02/2018	05/03/2018
	TÉRMINO	15/12/2018	30/03/2018
	DÍAS	25	25
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$200,000.00	PORCENTAJE: 50.00
	FECHA DE PAGO:	13/03/2018	

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$198,275.86	09/04/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$400,000.00	09/04/2018
FINIQUITO:	\$198,275.86	09/04/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	06/04/2018

AVANCE	AVANCE FÍSICO REAL											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TERMINADO

*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$200,000.00	\$34,482.76	\$34,482.76
AFIANZADORA:	Fierfa, S.A de C.V. Grupo Fierfa, S.A de C.V. Grupo Fierfa, S.A de C.V. Grupo Fierfa		
No. DE FIANZA:	3900-02484-0	3900-02485-5	3900-02494-7
FECHA:	02/03/2018	02/03/2018	05/04/2018
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$400,000.00		C/IVA

Arq. ANTONIO RÍOS PÉREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ING. LEONEL RIVERA RÍOS
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

FECHA DE ELABORACIÓN:
15/06/2018
MES QUE SE REPORTA
SEPTIEMBRE

EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	RAFAEL VALENZUELA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: RAFAEL VALENZUELA-LOMAS CHICAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2018300690105		

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		SI	X	NO	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:			
TIPO DE ZONA:	RURAL X	CLAVE AGE:	N/A	MUY ALTO	ALTO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI X	NO		MEDIO	BAJO X
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI X	NO		MUY BAJO	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			
LATITUD	20.4120989487176	PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI	NO
LONGITUD	-97.1405879681418			NO	X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
CONFORMACIÓN, ESCARIFICADO, CUNETEO, ACARREO DE MATERIAL DE BANCO, TENDIDO DE MATERIAL MEZCLADO, NIVELADO Y CONFORMADO, COMPACTADO CON AGUA EN PIPA

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR.	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ANTICIPO	\$237,500.00	2	\$237,500.00	27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,500.00
ESTIMACION	\$235,452.59	003	\$235,452.59	58	\$475,000.00	\$237,500.00	\$2,047.41	\$0.00	\$235,452.59
TOTALES	\$472,952.59		\$472,952.59		\$475,000.00	\$237,500.00	\$2,047.41	\$0.00	\$472,952.59

MONTO AUTORIZADO:	\$475,000.00	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$475,000.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		X	
	licitación pública			

NO. DE CONTRATO:	ICO-AD 005-FISM DF/2018 30 069 011	FECHA:	02/03/2018
CONTRATISTA:	ISABEL SALAZAR ESPINOSA		
MONTO CONTRATADO:	\$475,000.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/02/2018	05/03/2018
	TÉRMINO	15/12/2018	30/03/2018
	DÍAS	25	25
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$237,500.00	PORCENTAJE: 50.00
	FECHA DE PAGO:	13/03/2018	

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$235,452.59	09/04/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$475,000.00	09/04/2018
FINIQUITO:	\$235,452.59	09/04/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	06/04/2018

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TERMINADO

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$237,500.00	\$40,948.28	\$47,500.00
AFIANZADORA:	rta, S.A de C.V. Grupo Fierla, S.A de C.V. Grupo Fierla, S.A de C.V. Grupo Fierla		
No. DE FIANZA:	3900-02486-4	3900-02487-7	3900-02496-3
FECHA:	01/03/2018	01/03/2018	05/04/2018
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$475,000.00		C/IVA

Arq. ANTONIO RÍOS PÉREZ DIRECTOR DE OBRAS

ING. NORBERTO JUÁREZ MEJÍA SUPERVISOR

FORMATO 11



*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:	15/06/2018
MES QUE SE REPORTA	SEPTIEMBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIÉRREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	GUTIÉRREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE: 300PRS104U COL. ASOCIACIÓN CIVIL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2018300690107		

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO						
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:								
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGE:	019A	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	X	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI	X	NO						
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO						
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:								
LATITUD	20.44371521458910	LONGITUD	-97.09670803761770	PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI	NO	X	

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR
---	-------------------------

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:	DESPLANTE DE ESTRUCTURA, COLUMNAS, ESTRUCTURA PARA TECHADO, BARRA DE COCINA Y MOBILIARIO
---	--

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACIÓN DO:	\$167,362.15	2	\$167,362.15	186	\$168,086.66	\$0.00	\$724.51	\$0.00	\$167,362.15
ESTIMACIÓN UN:	\$181,129.24	1	\$181,129.24	182	\$181,913.35	\$0.00	\$784.11	\$0.00	\$181,129.24
TOTALES	\$348,491.39		\$348,491.39		\$350,000.01	\$0.00	\$1,508.62	\$0.00	\$348,491.39

MONTO AUTORIZADO:	\$350,000.00	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$350,000.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		X	
	LICITACIÓN PÚBLICA			

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$167,362.00	31/05/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$350,000.00	31/05/2018
FINIQUITO:	\$167,362.15	31/05/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	22/06/2018

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	25	50	100	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	50	100	100	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	50	100	100	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO. DE CONTRATO:	IGTZ-AD 10-FISMDF/2018 30 069 01/	FECHA:	13/04/2018
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA DE ALBA EN EL GOLFO S.A DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$350,000.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/02/2018	16/04/2018
	TÉRMINO	15/12/2018	31/05/2018
	DÍAS	70	46
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		
	FECHA DE PAGO:		

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$30,172.41	\$35,000.00	
AFIANZADORA:	Fianzas Monterrey S.A DE Fianzas Monterrey S.A DE		
No. DE FIANZA:	1904088	1910277	
FECHA:	13/04/2018	31/05/2018	
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO	INICIAL	FINAL
NO APLICA			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$350,000.00	C/IVA	

OBSERVACIONES:

TERMINADO

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



Arq. ANTONIO RÍOS PÉREZ
DIRECTOR DE OBRAS

Arq. JAIME GUADALUPE CASTILLO
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:	15/06/2018
MES QUE SE REPORTA	SEPTIEMBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	EL COCO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL ENRIQUE RODRIGUEZ CANO CLAVE: 300PR0616M. LOCALIDAD EL COCO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2018300690108		

ANTECEDENTES:												
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:			SI	X	NO							
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:					GRADO DE REZAGO SOCIAL:							
TIPO DE ZONA:	RURAL	X	URBANA		CLAVE AGE:	N/A	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	X	BAJO	MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	X	NO		TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:							
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI	X	NO		DIRECTA	X	INDIRECTA		COMPLEMENTARIA			
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA					PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI	NO	X			
LATITUD	20.4537854771260		LONGITUD	-97.14243579725180								

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR
---	-------------------------

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:	DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS, HABILITADO DE ESTRUCTURA PARA TECHADO, BARRA PARA COCINA Y MESAS.
---	---

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACIÓN DOS	\$117,865.15	2	\$117,865.15	184	\$118,375.39	\$0.00	\$510.24	\$0.00	\$117,865.15
ESTIMACIÓN UNO	\$131,057.27	1	\$131,057.27	180	\$131,624.62	\$0.00	\$567.35	\$0.00	\$131,057.27
TOTALES	\$248,922.42		\$248,922.42		\$250,000.01	\$0.00	\$1,077.59	\$0.00	\$248,922.42

MONTO AUTORIZADO:	\$250,000.00	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$250,000.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		X	
	licitación pública			

NO. DE CONTRATO:	1GTZ-AD 11-FISMDF/2018 30 069 010	FECHA:	13/06/2018
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA DE ALBA EN EL GOLFO S.A DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$250,000.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRAMADA	REAL
		01/02/2018	16/04/2018
	TÉRMINO	15/12/2018	31/05/2018
	DÍAS	70	46
ANTICIPO:	APLICA MONTO:	NO APLICA	X
	FECHA DE PAGO:		PORCENTAJE:

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$117,865.15	31/05/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$250,000.00	31/05/2018
FINIQUITO:	\$17,865.15	31/05/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	21/06/2018

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	25	50	100	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	50	100	100	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	50	100	100	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:	TERMINADO
----------------	-----------

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRAS
PUBLICAS

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$21,551.72	\$25,000.00	
AFIANZADORA:	Fianzas Monterrey S.A DE Fianzas Monterrey S.A DE		
No. de FIANZA:	1904096	1910279	
FECHA:	13/04/2018	31/05/2018	
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	NO APLICA		
		INICIAL	FINAL
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$250,000.00	C/IVA	

Arg. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ARC. JAIME GUADALUPE CASTILLO
BERNABE
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:	15/10/2018
MES QUE SE REPORTA	SEPTIEMBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	GUTIERREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 109, COLONIAS DEL CARMEN, MURILLO VIDAL, HERNANDEZ OCHOA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2018300690110		

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:					
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGEB:	0109	GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
	URBANA X			MUY ALTO	ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO X
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI X NO	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI X NO	DIRECTA X	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI NO X
LATITUD	20.4490348601629	LONGITUD	-97.0912911066215		

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS PARA DADOS, CASTILLOS, MUROS, PUERTAS Y VENTANAS, LOSA DE CONCRETO ARMADO, APLANADOS EN MUROS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, PINTURA EN MUROS.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS PARA DADOS, CASTILLOS, MUROS, PUERTAS Y VENTANAS, LOSA DE CONCRETO ARMADO, APLANADOS EN MUROS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, PINTURA EN MUROS.

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	\$ MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACIÓN DO	\$176,137.50	2	\$176,137.50	39	\$176,900.00	\$0.00	\$762.50	\$0.00	\$176,137.50
ESTIMACIÓN UNK	\$216,319.15	1	\$216,319.15	34	\$217,255.60	\$0.00	\$936.45	\$0.00	\$216,319.15
TOTALES	\$392,456.65		\$392,456.65		\$394,155.60	\$0.00	\$1,698.95	\$0.00	\$392,456.65

MONTO AUTORIZADO:	\$434,511.20	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$434,511.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA X	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA X	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	EXISTE X

NO. DE CONTRATO:	IGTZ-AD 13-FISM DF/2018 30 069 01	FECHA:	13/07/2018
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RUZAMU S.A DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$0.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRAMADA	REAL
		01/02/2018	15/07/2018
	TÉRMINO	15/12/2018	13/09/2018
	DÍAS	318	60
ANTICIPO:	APLICA MONTO: FECHA DE PAGO:	NO APLICA	X
		PORCENTAJE:	

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$176,137.50	11/09/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$395,155.60	11/09/2018
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO		VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:		\$37,457.86		\$37,457.00	
AFIANZADORA:		Fianzas Dorama S.A.		Fianzas Dorama S.A.	
No. DE FIANZA:		1008859		1008871	
FECHA:		13/07/2018		13/09/2017	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA	
	PLAZO		INICIAL	FINAL	
NO APLICA					
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$434,511.00		C/IVA	

*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Rodolfo Gutiérrez Lechuga
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

FECHA DE ELABORACION:
15/06/2018
MES QUE SE REPORTA
SEPTIEMBRE

EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA LOCALIDAD: GUTIERREZ ZAMORA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 202, COLONIAS PRIMERO DE MAYO, AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO Y FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES F No. DE OBRA: 2018300690112

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI NO

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL:

TIPO DE ZONA: RURAL URBANA X CLAVE AGEB: 0202 MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO X

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI NO TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI NO DIRECTA X INDIRECTA COMPLEMENTARIA

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA: LATITUD 20.44397841346260 LONGITUD -97.09325544927170 PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, CASTILLOS, MUROS, CONCRETO Y ACABADOS

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACIÓN DO:	\$830,316.93	2	\$830,316.93	A38	\$833,911.38	\$0.00	\$3,594.45	\$0.00	\$830,316.93
ESTIMACIÓN UN:	\$1,208,602.63	1	\$1,208,602.63	A33	\$1,213,834.00	\$0.00	\$5,232.05	\$0.00	\$1,208,602.63
TOTALES	\$2,038,919.56		\$2,038,919.56		\$2,047,745.38	\$0.00	\$8,826.50	\$0.00	\$2,038,919.56

MONTO AUTORIZADO: \$2,403,056.70 C/IVA

MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$2,403,056.00 C/IVA

VALIDACIÓN DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X

DEPENDENCIA QUE VALIDA:

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X

DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:

TIPO DE LICITACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA X

NO. DE CONTRATO: HGTZ-LR 11-FISM DF/2018 30 069 011 FECHA: 30/03/2018

CONTRATISTA: GRUPO CARDEÑA DE VERACRUZ S.A DE C.V.

MONTO CONTRATADO: \$2,403,056.70 C/IVA

PERIODO DE EJECUCIÓN:

PROGRAMADA	REAL
INICIO	01/02/2018 02/04/2018
TÉRMINO	15/12/2018 30/07/2018
DÍAS	120 120
APLICA	NO APLICA X
MONTO:	PORCENTAJE:
FECHA DE PAGO:	

REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$830,316.93	14/05/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$2,047,746.06	14/05/2018
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	25	50	75	100	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	25	50	75	100	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	25	50	75	100	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TIPO DE FIANZA: ANTIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS

MONTO AFIANZADO: \$207,160.06

AFIANZADORA: Afianzadora SOFIMEX S.A

No. DE FIANZA: 2197812

FECHA: 30/03/2018

	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
CONVENIO			
MODIFICATORIO:	MONTO	INICIAL FINAL	
	PLAZO		
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$2,403,056.00	C/IVA

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRAS
PÚBLICAS

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ING. ALFREDO MORENO NERI
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:	25/09/2018
MES QUE SE REPORTA	SEPTIEMBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	GUTIERREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 185, COLONIA CUAUHTLAN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2018300690113		

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:				
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGE:	D185	GRADO DE REZAGO SOCIAL:
	URBANA			MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI	X	NO
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:		
LATITUD	20.4382484096858	LONGITUD	-97.0925774317524	DIRECTA X INDIRECTA COMPLEMENTARIA
		PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X		

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS PARA DADOS, CASTILLOS, MUROS, PUERTAS Y VENTANAS, LOSA DE CONCRETO ARMADO, APLANADOS EN MUROS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, PINTURA EN MUROS.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS PARA DADOS, CASTILLOS, MUROS, PUERTAS Y VENTANAS, LOSA DE CONCRETO ARMADO, APLANADOS EN MUROS.

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACIÓN DO:	\$176,137.50	2	\$176,137.50	38	\$176,900.00	\$0.00	\$762.50	\$0.00	\$176,137.50
Estimación 1 Parc	\$216,319.15	1	\$216,319.15	35	\$217,255.60	\$0.00	\$936.45	\$0.00	\$216,319.15
TOTALES	\$392,456.65		\$392,456.65		\$394,155.60	\$0.00	\$1,698.95	\$0.00	\$392,456.65

MONTO AUTORIZADO:	\$434,511.20	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$434,511.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE X NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE X NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	EXISTE X

NO. DE CONTRATO:	IGTZ-AD 14-FISM DF/2018 30 069 011	FECHA:	13/07/2018
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RUZAMU S.A DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$434,511.20	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/02/2018	16/07/2018
	TÉRMINO	15/12/2018	
	DÍAS	118	0
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$176,137.50	11/09/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$394,155.60	11/09/2018
FINQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	25	80	100	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	25	80	100	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	25	80	100	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

Proceso

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$37,457.86	\$37,457.00	
AFIANZADORA:	Fianzas Dorama S.A.	Fianzas Dorama S.A.	
No. DE FIANZA:	1008862	10A37973	
FECHA:	13/07/2017	13/09/2018	
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO	INICIAL	FINAL
	PLAZO		
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$434,511.00	C/IVA	

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Rodolfo Gutiérrez Lechuga
SUPERVISOR

FORMATO II

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:
18/05/2018
MES QUE SE REPORTA
SEPTIEMBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	GUTIERREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 019A, COLONIAS EL PORVENIR, ASOCIACIÓN CIVIL PRIMERO DE MAYO Y AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2018300690114		

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		SI	X	NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:				
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGEB:	019A	GRADO DE REZAGO SOCIAL:
	URBANA			MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI	X	NO
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:				
	DIRECTA	X	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA				
LATITUD	20.4440167920299	LONGITUD	-97.0943831242306	PROYECTO ESPECIAL
				Cuenta con Opinión Favorable
				SI NO
				NO X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

DESPLANTES DE ESTRUCTURAS, MUROS, ACEROS DE REFUERZO Y CONCRETOS

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACION 2	\$826,126.10	2	\$826,126.10	A39	\$829,702.40	\$0.00	\$3,576.30	\$0.00	\$826,126.10
ESTIMACION 1	\$1,113,719.51	1	\$1,113,719.00	A33	\$1,118,540.81	\$0.00	\$4,821.30	\$0.00	\$1,113,719.51
TOTALES	\$1,939,845.61		\$1,939,845.10		\$1,948,243.21	\$0.00	\$8,397.60	\$0.00	\$1,939,845.61

MONTO AUTORIZADO:	\$2,242,852.92	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$2,242,852.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		X	
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	IGTZ-LR 10-FISM DF/2018 30 069 011	FECHA:	30/03/2018
CONTRATISTA:	GRUPO CARDEÑA DE VERACRUZ S.A DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$2,242,852.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/02/2018	02/04/2018
	TÉRMINO	15/11/2018	30/07/2018
	DÍAS	120	120
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$826,126.10	14/05/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$1,948,243.20	14/05/2018
FINQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE	AVANCE FÍSICO REAL											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	25	50	75	100	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	25	50	75	100	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	25	50	75	100	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TERMINADA

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$193,349.39		
AFIANZADORA:	Manzadora SOFIMEX S.A		
No. DE FIANZA:	2197812		
FECHA:	30/03/2018		
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:			C/IVA



Ing. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ING. ALFREDO MORENO NERI
SUPERVISOR

FORMATO 11

*En caso de require mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:	15/08/2018
MES QUE SE REPORTEA	SEPTIEMBRE

DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	LOMAS CHICAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2018300690124
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD LDMAS CHICAS	

ANTECEDENTES:			
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	X	NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
TIPO DE ZONA:	RURAL X URBANA	CLAVE AGE:	N/A
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI X NO	MUY ALTO	ALTO MEDIO X BAJO MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI X NO	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		DIRECTA X	INDIRECTA COMPLEMENTARIA
LATITUD	20.412526577	PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X
LONGITUD	-97.142740653		

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, HABILITADO DE ESTRUCTURAS PARA DADOS CASTILLO Y CADENAS, MUROS, PERFILES EN PUERTAS Y VENTANAS, CONCRETO EN PISOS Y LOSAS, PINTURA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS Y HABILITADO DE CASTILLOS Y CADENAS

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACIÓN 1	\$258,459.25	2	\$258,459.25	13	\$521,413.43	\$260,706.71	\$2,247.47	\$0.00	\$258,459.25
ANTICIPO	\$304,157.84	1	\$304,157.84	6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,157.84
TOTALES	\$562,617.09		\$562,617.09		\$521,413.43	\$260,706.71	\$2,247.47	\$0.00	\$562,617.09

MONTO AUTORIZADO:	\$608,315.68	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$608,315.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	EXISTE X

NO. DE CONTRATO:	IGTZ-LR 14-FISM DF/2018 30 069 012	FECHA:	04/06/2018
CONTRATISTA:	NOE MONTALVO VAZQUEZ		
MONTO CONTRATADO:	\$608,315.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/05/2018	07/06/2018
	TÉRMINO	15/12/2018	04/09/2018
	DÍAS	90	90
ANTICIPO:	APLICA X NO APLICA		
	MONTO:	\$304,157.84	PORCENTAJE: 50.00
	FECHA DE PAGO:	04/06/2018	

REPORTE		
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$258,459.25	FECHAS 08/06/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$562,617.00	08/06/2018
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	30	80	80	100	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	80	80	80	100	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	80	80	80	100	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$304,157.84 \$52,441.01 \$52,441.00
AFIANZADORA:	Fianzas Monterrey S.A Fianzas Monterrey S.A De Fianzas Dorama S.A
No. DE FIANZA:	1925010 1925012 1008891
FECHA:	04/06/2018 04/06/2018 04/09/2018
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE IMPORTE/PERIODO FECHA
	MONTO INICIAL FINAL
	PLAZO NO APLICA
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$608,315.00 C/IVA

OBSERVACIONES:

PROCESO

*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



Arg. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Rodolfo Gutiérrez Lechuga
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:	15/10/2018
MES QUE SE REPORTA	SEPTIEMBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: EL CÉPILLO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL CÉPILLO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA: 2018300690129	

ANTECEDENTES:				
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI X NO			
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:				
TIPO DE ZONA: RURAL X URBANA	CLAVE AGE: N/A			
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO	SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI X NO			
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA				
LATITUD: 20.417304495	LONGITUD: -97.127768461			
GRADO DE REZAGO SOCIAL:				
MUY ALTO	ALTO	MEDIO X	BAJO	MUY BAJO
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:				
DIRECTA X	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA		
PROYECTO ESPECIAL:				
CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI NO X			

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS PARA DADOS, CASTILLOS, MUROS, PUERTAS Y VENTANAS, LOSA DE CONCRETO ARMADO, APLANADOS EN MUROS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, PINTURA EN MUROS.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS PARA DADOS, CASTILLOS, MUROS, PUERTAS Y VENTANAS, LOSA DE CONCRETO ARMADO, APLANADOS EN MUROS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, PINTURA EN MUROS.

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACIÓN UNI	\$484,554.91	1	\$484,554.91	8	\$486,652.54	\$0.00	\$2,097.64	\$0.00	\$484,554.91
TOTALES	\$484,554.91		\$484,554.91		\$486,652.54	\$0.00	\$2,097.64	\$0.00	\$484,554.91

MONTO AUTORIZADO:	\$608,315.67	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$608,315.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	EXISTE X

NO. DE CONTRATO:	1GTZ-LR 25-FISM DF/2018 30 069 011	FECHA:	03/07/2018
CONTRATISTA:	PRODUCCIÓN GESTIÓN Y COMERCIO S.A DE C.V		
MONTO CONTRATADO:	\$608,315.67	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	05/07/2018	05/07/2018
	TÉRMINO	15/12/2018	02/09/2018
	DÍAS	163	60
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		
	FECHA DE PAGO:		PORCENTAJE:

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$484,554.91	06/08/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$484,554.00	06/08/2018
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	40	80	100	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	40	80	100	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO		VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:		\$52,441.01		\$52,441.01	
AFIANZADORA:		Fianzas Dorama, S.A.		Fianzas Dorama, S.A.	
No. DE FIANZA:		1008853		18A37983	
FECHA:		03/07/2018		02/09/2018	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA	
	PLAZO		INICIAL	FINAL	
	NO APLICA				
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$608,315.00		C/IVA	

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



Ing. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Alfredo Morano Neri
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:	15/10/2018
MES QUE SE REPORTA	SEPTIEMBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	MACARENA ARRAZOLA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MACARENA ARRAZOLA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES I	No. DE OBRA:	2018300690130		

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:					
TIPO DE ZONA:	RURAL X URBANA	CLAVE AGEB:	N/A	GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI X NO			MUY ALTO	ALTO
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO:	SI X NO			MEDIO X	BAJO
					MUY BAJO
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			
LATITUD	20.418954828	LONGITUD	-97.107058295	DIRECTA X	INDIRECTA
					COMPLEMENTARIA
				PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE
				SI	NO X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS PARA DADOS, CASTILLOS, MUROS, PUERTAS Y VENTANAS, LOSA DE CONCRETO ARMADO, APLANADOS EN MUROS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, PINTURA EN MUROS

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS PARA DADOS, CASTILLOS, MUROS, PUERTAS Y VENTANAS, LOSA DE CONCRETO ARMADO, APLANADOS EN MUROS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, PINTURA EN MUROS

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACIÓN UN	\$752,537.13	1	\$752,537.13	9	\$755,794.87	\$0.00	\$3,257.74	\$0.00	\$752,537.13
TOTALES	\$752,537.13		\$752,537.13		\$755,794.87	\$0.00	\$3,257.74	\$0.00	\$752,537.13

MONTO AUTORIZADO:	\$944,743.59	C/IVA	
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$944,743.00	C/IVA	
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:			
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:			EXISTE
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		X
	LICITACIÓN PÚBLICA		

NO. DE CONTRATO:	1GT2-LR 26-FISM DF/2018 30 069 011	FECHA:	03/07/2018
CONTRATISTA:	PRODUCCIÓN GESTIÓN Y COMERCIO S.A DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$944,743.59	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	05/07/2018	05/07/2018
	TERMINO	15/12/2018	02/09/2018
	DÍAS	163	60
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$752,537.13	06/08/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$752,537.00	08/08/2018
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	40	80	100	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	40	80	100	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	40	80	100	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$81,443.41	\$81,443.41	\$81,443.41
AFIANZADORA:	Fianzas Dorama S.A	Fianzas Dorama S.A	Fianzas Dorama S.A
No. de FIANZA:	1008854	18A37985	
FECHA:	03/07/2018	03/09/2018	
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$944,743.00		C/IVA

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Alfredo Moreno Neri
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:	15/10/2018
MES QUE SE REPORTA	SEPTIEMBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	HERMENEGILDO GALEANA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2018300690131		

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:			
TIPO DE ZONA:	RURAL X URBANA	CLAVE AGE:	N/A	MUY ALTO	ALTO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI X NO			MEDIO X	BAJO
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO:	SI X NO			MUY BAJO	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			
LATITUD	20.465052188	LONGITUD	-97.154894918	DIRECTA X	INDIRECTA
				COMPLEMENTARIA	
				PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:	EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS PARA DADOS, CASTILLOS, MUROS, PUERTAS Y VENTANAS, LOSA DE CONCRETO ARMADO, APLANADOS EN MUROS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, PINTURA EN MUROS.
---	---

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:	EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS PARA DADOS, CASTILLOS, MUROS, PUERTAS Y VENTANAS, LOSA DE CONCRETO ARMADO, APLANADOS EN MUROS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, PINTURA EN MUROS.
---	---

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACIÓN UN	\$752,537.13	1	\$752,537.13	10	\$755,794.87	\$0.00	\$3,257.74	\$0.00	\$752,537.13
TOTALES	\$752,537.13		\$752,537.13		\$755,794.87	\$0.00	\$3,257.74	\$0.00	\$752,537.13

MONTO AUTORIZADO:	\$944,743.59	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$944,743.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	EXISTE X

NO. DE CONTRATO:	1GTZ-LR 27-FISM DF/2018 30 069 011	FECHA:	03/07/2018
CONTRATISTA:	PRODUCCIÓN GESTIÓN Y COMERCIO S.A DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$944,743.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	05/07/2018	05/07/2018
	TÉRMINO	15/12/2018	02/09/2018
	DÍAS	163	60
ANTICIPO:	APLICA MONTO:	NO APLICA	X
	FECHA DE PAGO:	PORCENTAJE:	

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$752,537.13	06/08/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$752,537.00	06/08/2018
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	40	80	100	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	40	80	100	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	40	80	100	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:	
----------------	--

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$81,443.41	\$81,443.41	\$81,443.41
AFIANZADORA:	Fianzas Dorama S.A.	Fianzas Dorama S.A.	Fianzas Dorama S.A.
No. DE FIANZA:	1008856	18A37986	
FECHA:	03/07/2017	22/10/2018	
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO	INICIAL	FINAL
	PLAZO		
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$944,743.00	C/IVA	

Ing. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Alfredo Moreno Neri
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACION:	15/08/2018
MES QUE SE REPORTA	SEPTIEMBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	GUTIERREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACION DE INSTALACIONES Y OBRAS DE ACCESO EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, GALERAS DE LA FERIA Y LIENZO CHARRO.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2018300690225		

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		SI	X	NO					
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:							
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGE:	N/A	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	X
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	X	NO	TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:					
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI	X	NO	DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA			
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINION FAVORABLE		SI	NO		
LATITUD	20.46366928465880	LONGITUD	-97.083383385060			NO	X		

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE CONCRETO EN ANDADORES Y CANCHAS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y LUMINARIAS, PINTURA EN HERRERIAS

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

REHABILITACIÓN DE CONCRETO EN ANDADORES Y CANCHAS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y LUMINARIAS, PINTURA EN HERRERIAS

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACION UNI	\$297,297.00	1	\$297,297.00	01	\$298,584.00	\$0.00	\$1,287.00	\$0.00	\$297,297.00
TOTALES	\$297,297.00		\$297,297.00		\$298,584.00	\$0.00	\$1,287.00	\$0.00	\$297,297.00

MONTO AUTORIZADO:	\$503,533.23	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$503,533.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X		
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	Z-AD 08-FORTAMUNDF/2018 30 069	FECHA:	11/04/2018
CONTRATISTA:	MATEO GOMEZ GUERRA		
MONTO CONTRATADO:	\$503,533.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/01/2018	13/04/2018
	TÉRMINO	15/12/2018	12/05/2018
	DÍAS	349	30
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$297,297.00	11/05/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$297,297.00	11/05/2018
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE	AVANCE FISICO REAL											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	50	100	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	50	100	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	50	100	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

POR FINIQUITAR



TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		\$43,408.04	
AFIANZADORA:	Fianzas Monterrey S.A DE CV		
No. DE FIANZA:	1895289		
FECHA:	09/05/2018		
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA		
		\$503,533.00	C/IVA

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

Arq. Jaime Guadalupe Castillo Bernabé
SUPERVISOR

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
OBRAS PUBLICAS

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACION:
16/07/2018
MES QUE SE REPORTA
SEPTIEMBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA LOCALIDAD: CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CAMINOS Y PUENTES FEDER No. DE OBRA: 2018300690033 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO "STA. ROSA"

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI NO

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: **GRADO DE REZAGO SOCIAL:**

TIPO DE ZONA: RURAL URBANA CLAVE AGE: N/A MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO X MUY BAJO

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI NO **TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:**

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI NO DIRECTA INDIRECTA COMPLEMENTARIA

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA: LATITUD 20.420623399 LONGITUD -97.188314198 PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

BARRA PERIMETRAL Y GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

TERMINADA GRADAS Y MURO

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					IMPORTE DEVENGADO
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	
FINIQUITO	\$639,552.63	1	\$639,552.63	108	\$642,321.26	\$0.00	\$2,768.63	\$0.00	\$639,552.63
TOTALES	\$639,552.63		\$639,552.63		\$642,321.26	\$0.00	\$2,768.63	\$0.00	\$639,552.63

MONTO AUTORIZADO: \$642,321.26 C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$642,321.26 C/IVA

VALIDACIÓN DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA

DEPENDENCIA QUE VALIDA: EXISTE NO EXISTE NO APLICA

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA

DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: EXISTE

TIPO DE LICITACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA EXISTE
INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS X
LICITACIÓN PÚBLICA

NO. DE CONTRATO: CAPUFE-GTZ-IR-2017300690033 FECHA: 02/10/2017
CONTRATISTA: FELICIANA BARRIOS ZAleta

MONTO CONTRATADO: \$642,321.00 C/IVA

PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO PROGRAMADA REAL 01/01/2018 01/01/2018
TÉRMINO 15/12/2018 30/03/2018
DÍAS 89 89

ANTICIPO: APLICA NO APLICA
MONTO: PORCENTAJE: FECHA DE PAGO:

REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$642,321.00	30/03/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$642,321.00	30/03/2018
FINIQUITO:	\$642,321.00	30/03/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	26/11/2017

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TIPO DE FIANZA: ANTIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO: \$161,034.48 \$186,800.00
AFIANZADORA: Liberty Fianzas, S.A DE C.V. Liberty Fianzas, S.A DE C.V.
No. DE FIANZA: 1877846-0000 1891232-0000
FECHA: 02/10/2017 27/11/2017

CONVENIO MODIFICATORIO: MONTO EXISTE IMPORTE/PERIODO FECHA
PLAZO INICIAL FINAL
NO APLICA

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: \$642,321.26 C/IVA

OBSERVACIONES:

TERMINADA

*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

Arq. ANTONIO RÍOS PÉREZ ARQ. ANTONIO RÍOS PÉREZ
DIRECTOR DE OBRAS SUPERVISOR



FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:	16/07/2018
MES QUE SE REPORTA	SEPTIEMBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	RAFAEL VALENZUELA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO RAFAEL VALENZUELA A IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DEL KM 0+669 AL KM 1+334
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	CAMINOS Y PUENTES FEDER	No. DE OBRA:	2018300690040		

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO					
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:									
TIPO DE ZONA:	RURAL URBANA	CLAVE AGE:	N/A	GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI	X	NO					
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO					
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:							
LATITUD	20.400158176	LONGITUD	-97.126243084	DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA			X
				PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI	NO		X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:	PAGO DE PAVIMENTO OBRA CAPUFE 2017
---	------------------------------------

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:	PAVIMENTO EN CAMINO
---	---------------------

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
FINIQUITO	\$746,580.20	1	\$746,580.20	A 196	\$749,812.15	\$0.00	\$3,231.95	\$0.00	\$746,580.20
TOTALES	\$746,580.20		\$746,580.20		\$749,812.15	\$0.00	\$3,231.95	\$0.00	\$746,580.20

MONTO AUTORIZADO:	\$749,812.15	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$749,812.15	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X		
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	CAPUFE-GTZ-IR-2017300690040	FECHA:	09/10/2017
CONTRATISTA:	URIEL DEL ANGEL PÉREZ		
MONTO CONTRATADO:	\$749,812.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/01/2018	01/01/2018
	TÉRMINO	15/12/2018	30/03/2018
	DÍAS	89	89
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$749,812.00	28/03/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$749,812.00	28/03/2018
FINIQUITO:	\$749,812.00	28/03/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	13/12/2017

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:	TERMINADA
----------------	-----------

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:	\$323,275.86	\$375,000.00		
AFIANZADORA:	padora Insurgentes S.A Otadora Insurgentes S.A B			
No. DE FIANZA:	5652-02076-5	5652-02088-8		
FECHA:	09/10/2017	30/11/2017		
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	PLAZO		INICIAL	FINAL
	NO APLICA			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$749,812.15		C/IVA	

Arq. ANTONIO RÍOS PÉREZ DIRECTOR DE OBRAS
Arq. ANTONIO RÍOS PÉREZ SUPERVISOR



FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:	15/03/2018
MES QUE SE REPORTA	SEPTIEMBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	LOMAS CHICAS	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO LOMAS CHICAS A RAFAEL VALENZUELA DEL KM 0+000 AL KM 0+180
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	CAMINOS Y PUENTES FEDER	No. DE OBRA:	2018300690042		

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO					
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:									
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGE:	N/A	GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
	URBANA			MUY ALTO	ALTO	MEDIO	X	BAJO	MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI	X	NO	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:				
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO	DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA		X
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA:		PROYECTO ESPECIAL			CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI	NO	X
LATITUD	20.413178197	LONGITUD	-97.141518136						

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:	PAVIMENTO EN CAMINO OBAR DE 2017 CAPUFE PASIVOS
---	---

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:	CONCRETO EN CAMINO TERMINADO
---	------------------------------

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
FINIQUITO	\$975,896.16	1	\$975,896.16	99	\$980,120.82	\$0.00	\$4,224.66	\$0.00	\$975,896.16
TOTALES	\$975,896.16		\$975,896.16		\$980,120.82	\$0.00	\$4,224.66	\$0.00	\$975,896.16

MONTO AUTORIZADO:	\$980,120.82	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$980,120.82	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	LICITACIÓN PÚBLICA	EXISTE
				X

NO. DE CONTRATO:	CAPUFE-GTZ-IR-2017300690042	FECHA:	21/11/2017
CONTRATISTA:	PEDRO HERNÁNDEZ REYES		
MONTO CONTRATADO:	\$980,120.00		C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/01/2018	01/01/2018
	TÉRMINO	15/12/2018	30/03/2018
	DÍAS	89	89
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$980,120.00	30/03/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$980,120.00	30/03/2018
FINIQUITO:	\$980,120.00	30/03/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	21/12/2017

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:	TERMINADO
----------------	-----------

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$84,493.17	\$98,012.08	
AFIANZADORA:	Irta, S.A de C.V. Grupo Fiertra, S.A de C.V. Grupo Fiertra		
No. DE FIANZA:	3900-02431-4	3900-02459-2	
FECHA:	21/11/2017	20/12/2017	
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO	INICIAL	FINAL
	PLAZO		
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$980,120.82		C/IVA

*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

Arq. ANTONIO RÍOS PÉREZ DIRECTOR DE OBRAS
ARQ. ANTONIO RÍOS PÉREZ SUPERVISOR



FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:	16/07/2018
MES QUE SE REPORTA	SEPTIEMBRE

DATOS GENERALES	
MUNICIPIO: GUTIÉRREZ ZAMORA LOCALIDAD: RAFAEL VALENZUELA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO LOMAS CHICAS A RAFAEL VALENZUELA DEL KM 0+775 AL KM 0+903
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CAMINOS Y PUENTES FEDER No. DE OBRA: 2018300690043	

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO		ANTECEDENTES:	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA	CLAVE AGEB: N/A	MUY ALTO	ALTO MEDIO BAJO X MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO	SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI X NO	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		DIRECTA	INDIRECTA COMPLEMENTARIA X
LATITUD: 20.408985841	LONGITUD: -97.135090846	PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO OBRA 2017-PASIVOS CAPUFE

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

PAVIMENTO EN CAMINO TERMINADO

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
FINIQUITO	\$706,129.98	1	\$706,129.98	36	\$709,186.82	\$0.00	\$3,056.84	\$0.00	\$706,129.98
TOTALES	\$706,129.98		\$706,129.98		\$709,186.82	\$0.00	\$3,056.84	\$0.00	\$706,129.98

MONTO AUTORIZADO:	\$709,186.82	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$709,186.82	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	EXISTE X

NO. DE CONTRATO:	CAPUFE-GTZ-IR-2017300690043	FECHA:	21/11/2017
CONTRATISTA:	JOSE LUIS ESPINO HERNANDEZ		
MONTO CONTRATADO:	\$709,186.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/01/2018	01/01/2018
	TÉRMINO	15/12/2018	30/03/2018
	DÍAS	89	89
ANTICIPO:	APLICA MONTO: FECHA DE PAGO:	NO APLICA PORCENTAJE:	X

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$709,186.00	30/03/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$709,186.00	30/03/2018
FINIQUITO:	\$709,186.00	30/03/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	18/12/2017

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TERMINADO

*En caso de require mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$61,136.79	\$70,918.68	
AFIANZADORA:	rtta, S.A de C.V. Grupo Fianza, S.A de C.V. Grupo F		
No. DE FIANZA:	8035-00146-9	8035-00147-2	
FECHA:	21/11/2017	15/12/2017	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE IMPORTE/PERIODO	FECHA
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$709,186.82	C/IVA	

Arg. ANTONIO RÍOS PÉREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ARG. ANTONIO RÍOS PÉREZ
SUPERVISOR

OBRAS PÚBLICAS

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

FECHA DE ELABORACIÓN:
15/08/2018
MES QUE SE REPORTA
SEPTIEMBRE

EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA LOCALIDAD: IGNACIO M. ALTAMIRANO (PLAN DE ALTAMIRANO) DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - ENTRONQUE PAGUAS DE CORONADO DEL KM 0+000
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CAMINOS Y PUENTES FEDER No. DE OBRA: 2018300690401

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: **GRADO DE REZAGO SOCIAL:**

TIPO DE ZONA: RURAL CLAVE AGE: N/A MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO X MUY BAJO

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO **TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:**

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI X NO DIRECTA INDIRECTA COMPLEMENTARIA X

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA: LATITUD 20.385889257 LONGITUD -97.149765199 PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

CUNETEO, RASTREO DE SUPERFICIE, ESCARIFICADO, ACARREO DE MATERIAL DE BANCO, MEZCLA Y TENDIDO DE MATERIAL, COMPACTADO CON APLICACIÓN DE AGUA.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

CUNETEO, RASTREO DE SUPERFICIE, ESCARIFICADO, ACARREO DE MATERIAL DE BANCO, MEZCLA Y TENDIDO DE MATERIAL, COMPACTADO CON APLICACIÓN DE AGUA.

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMA UNICA	\$743,534.48	2	\$743,534.48	4	\$1,500,000.00	\$750,000.00	\$6,465.52	\$0.00	\$743,534.48
ANTICIPO	\$750,000.00	1	\$750,000.00	187	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00
TOTALES	\$1,493,534.48		\$1,493,534.48		\$1,500,000.00	\$750,000.00	\$6,465.52	\$0.00	\$1,493,534.48

MONTO AUTORIZADO: \$1,500,000.00 C/IVA

MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$1,500,000.00 C/IVA

VALIDACIÓN DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X

DEPENDENCIA QUE VALIDA: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X

DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: EXISTE

TIPO DE LICITACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA X

NO. DE CONTRATO: IGTZ-LR 17-CAPUFE/2018 30 069 040 FECHA: 18/07/2018

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DE ALBA EN EL GOLFO S.A DE C.V.

MONTO CONTRATADO: \$1,500,000.00 C/IVA

PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO 01/06/2018 PROGRAMADA REAL 23/07/2018

TÉRMINO 15/12/2018

DÍAS 45 0

ANTICIPO: APLICA X NO APLICA MONTO: \$750,000.00 PORCENTAJE: 50.00

FECHA DE PAGO: 18/07/2018

REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$743,534.48	31/07/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$1,500,000.00	31/07/2018
FINIQUITO:	\$743,534.48	31/07/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	10/08/2018

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES: TERMINADO

TIPO DE FIANZA: ANTIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS

MONTO AFIANZADO: \$750,000.00 \$129,310.35 \$150,000.00

AFIANZADORA: Fianzas Monterrey S.A DE Fianzas Monterrey S.A DE Fianzas Monterrey S.A DE

No. DE FIANZA: 1925024 1925028 1933803

FECHA: 18/07/2018 18/07/2018 28/08/2018

CONVENIO MODIFICATORIO: MONTO EXISTE IMPORTE/PERIODO FECHA

PLAZO INICIAL FINAL

NO APLICA

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: \$1,500,000.00 C/IVA

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Alfredo Moreno Neri
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACION:	15/08/2018
MES QUE SE REPORTA	SEPTIEMBRE

DATOS GENERALES	
MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA LOCALIDAD: ARROYO GRANDE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: ARROYO GRANDE - LA GALEANA DEL KM 0+000 AL KM 2+000
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CAMINOS Y PUENTES FEDER No. DE OBRA: 2018300690402	

ANTECEDENTES:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO	GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO X BAJO MUY BAJO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: TIPO DE ZONA: RURAL URBANA CLAVE AGEB: N/A	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA INDIRECTA COMPLEMENTARIA X
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO	PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI X NO	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	
LATITUD: 20.482303302	LONGITUD: -97.108957268

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
CUNETEJO, ESCARIFICADO, NIVELADO-CONFORMADO DE SUPERFICIE, ACARREOS DE MATERIALES DE BANCO, MEZCLADO Y TENDIDO DE MATERIALES DE REVESTIMIENTO, NIVELADO Y COMPACTADO EN CAPAS CON AGUA EN PIPA

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
CUNETEJO, ESCARIFICADO, NIVELADO-CONFORMADO DE SUPERFICIE, ACARREOS DE MATERIALES DE BANCO, MEZCLADO Y TENDIDO DE MATERIALES DE REVESTIMIENTO, NIVELADO Y COMPACTADO EN CAPAS CON AGUA EN PIPA

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIM 1	\$1,399,939.66	1	\$1,399,939.66	105	\$1,406,000.00	\$0.00	\$6,060.34	\$0.00	\$1,399,939.66
TOTALES	\$1,399,939.66		\$1,399,939.66		\$1,406,000.00	\$0.00	\$6,060.34	\$0.00	\$1,399,939.66

MONTO AUTORIZADO:	\$2,000,000.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$2,000,000.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	EXISTE X

NO. DE CONTRATO:	IGTZ-LR 18-CAPUFE/2018 30 069 040	FECHA:	25/07/2018
CONTRATISTA:	ISAAEL SALAZAR ESPINOSA		
MONTO CONTRATADO:	\$2,000,000.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/06/2018	30/07/2018
	TERMINO	15/12/2018	12/09/2018
	DÍAS	45	45
ANTICIPO:	APLICA MONTO: NO APLICA PORCENTAJE:	X	
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$1,399,939.66	09/08/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$1,399,939.00	09/08/2018
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	15	80	100	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	25	80	100	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	25	80	100	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		\$172,413.79	\$172,413.00
AFIANZADORA:		sta, S.A de C.V. Grupo Finta, S.A de C.V. Grupo F	
No. DE FIANZA:		3900-02633-0	3900-02745-0
FECHA:		25/07/2018	12/09/2018
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE IMPORTE/PERIODO	FECHA
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$2,000,000.00	C/IVA

OBSERVACIONES:
Proceso

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



EL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL
DE GUTIERREZ ZAMORA,
VER.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Arq. ANTONIO ROS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Alfredo Moreno Neri
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:
14/09/2018
MES QUE SE REPORTA
SEPTIEMBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	EJIDO SOTO Y GAMA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN CALLES: NIÑOS HEROES, EMILIANO ZAPATA, GENERAL LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO DEL EJIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	CAMINOS Y PUENTES FEDER	No. DE OBRA:	2018300690409		

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:

TIPO DE ZONA: RURAL URBANA

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI X NO

CLAVE AGE: N/A

GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO X BAJO MUY BAJO

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA INDIRECTA COMPLEMENTARIA X

PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA: LATITUD 20.42402338555510 LONGITUD -97.05209952026490

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

RASTREO Y CUNETEO DE CALLES, REVESTIMIENTO EN CALLES, ACARREOS DE MATERIALES, MEZCLADO TENDIDO, NIVELACIÓN, COMPACTADO CON AGUA EN PIPA.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

RASTREO Y CUNETEO DE CALLES, REVESTIMIENTO EN CALLES, ACARREOS DE MATERIALES, MEZCLADO TENDIDO, NIVELACIÓN, COMPACTADO CON AGUA EN PIPA.

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
MACIÓN 1 FINIQ	\$398,275.86	1	\$398,275.86	191	\$400,000.00	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00	\$398,275.86
TOTALES	\$398,275.86		\$398,275.86		\$400,000.00	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00	\$398,275.86

MONTO AUTORIZADO: \$400,000.00 C/IVA

MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$400,000.00 C/IVA

VALIDACIÓN DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X

DEPENDENCIA QUE VALIDA: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X

DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: EXISTE X

TIPO DE LICITACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA

NO. DE CONTRATO: BGTZ-AD 12-CAPUFE/2018 30 069 040 FECHA: 20/07/2018

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DE ALBA EN EL GOLFO S.A DE C.V.

MONTO CONTRATADO: \$400,000.00 C/IVA

PERIODO DE EJECUCIÓN:

	PROGRAMADA	REAL
INICIO	01/06/2018	24/07/2018
TÉRMINO	15/12/2018	09/08/2018
DÍAS	198	17
APLICA	NO APLICA	X
MONTO:		PORCENTAJE:
FECHA DE PAGO:		

ANTICIPO:

REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$398,275.86	09/08/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$398,275.00	09/08/2018
FINIQUITO:	\$398,275.00	09/08/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	13/08/2018

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	25	100	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	50	100	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	50	100	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS

MONTO AFIANZADO: \$34,482.76 \$40,000.00

AFIANZADORA: Fianzas Monterrey S.A DE Fianzas Monterrey S.A DE

No. DE FIANZA: 1933577 1934915

FECHA: 20/07/2018 09/08/2018

CONVENIO MODIFICATORIO: MONTO EXISTE IMPORTE/PERIODO FECHA PLAZO INICIAL FINAL

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: \$400,000.00 C/IVA

OBSERVACIONES:

TERMINADO

*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



Arq. ANTONIO RÍOS PÉREZ
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Leonel Rodríguez Ríos
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:	14/09/2018
MES QUE SE REPORTA	SEPTIEMBRE

DATOS GENERALES	
MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA LOCALIDAD: RAFAEL VALENZUELA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN CALLES AVENIDA MORELOS, AVENIDA HIDALGO, EMILIANO ZAPATA, JUVENTINO ROSAS DE LOCALIDAD RAFAEL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CAMINOS Y PUENTES FEDER No. DE OBRA: 2018300690410	

ANTECEDENTES:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO	GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO X MUY BAJO
TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: RURAL URBANA CLAVE AGEB: N/A	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA INDIRECTA COMPLEMENTARIA X
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO	PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI X NO	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	
LATITUD: 20.406491657 LONGITUD: -97.128648779	

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
RASTREO Y CUNETEO, ACARREO DE MATERIALES DE BANCO, TENDIDO MEZCLADO Y ACAMELLONADO, COMPACTADO CON APLICACIÓN DE AGUA EN PIPA PARA COMPACTADO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
RASTREO Y CUNETEO, ACARREO DE MATERIALES DE BANCO, TENDIDO MEZCLADO Y ACAMELLONADO, COMPACTADO CON APLICACIÓN DE AGUA EN PIPA PARA COMPACTADO

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR.	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
STIM 1 FINIQUIT	\$1,692,672.41	1	\$1,692,672.41	190	\$1,700,000.00	\$0.00	\$7,327.59	\$0.00	\$1,692,672.41
TOTALES	\$1,692,672.41		\$1,692,672.41		\$1,700,000.00	\$0.00	\$7,327.59	\$0.00	\$1,692,672.41

MONTO AUTORIZADO:	\$1,700,000.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$1,700,000.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	EXISTE X

NO. DE CONTRATO:	IGTZ-LR 20-CAPUFE/2018 30 069 041	FECHA:	27/07/2018
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA DE ALBA EN EL GOLFO S.A DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$1,700,000.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/06/2018	01/08/2018
	TÉRMINO	15/12/2018	30/08/2018
	DÍAS	198	30
ANTICIPO:	APLICA NO APLICA	X	
	MONTO:	PORCENTAJE:	
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$1,692,672.41	09/08/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$1,692,672.00	09/08/2018
FINIQUITO:	\$1,692,672.00	09/08/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	15/08/2018

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$146,551.72 \$170,000.00
AFIANZADORA:	Fianzas Monterrey S.A DFianzas Monterrey S.A DF
No. DE FIANZA:	1928271 1933802
FECHA:	27/07/2018 23/08/2018
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO EXISTE IMPORTE/PERIODO FECHA
	PLAZO INICIAL FINAL
	NO APLICA
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$1,700,000.00 C/IVA

OBSERVACIONES:

TERMINADO

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Norberto Juárez Mejía
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:	14/09/2018
MES QUE SE REPORTA	SEPTIEMBRE

DATOS GENERALES	
MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA LOCALIDAD: GUTIERREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR MODELOS EFICIENTES TIPO CITI 55-305V EN CABECERA MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CAMINOS Y PUENTES FEDER No. DE OBRA: 2018300690414	

ANTECEDENTES:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO	GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO X
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: TIPO DE ZONA: RURAL URBANA CLAVE AGEB: N/A	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA INDIRECTA COMPLEMENTARIA X
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP. SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO SI X NO	PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA LATITUD 20.44848028853680 LONGITUD -97.08962220322870	

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA: Colocación de luminarias TIPO CITI 55-305V

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES: Colocación de luminarias TIPO CITI 55-305V

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACIÓN 1	\$1,430,919.84	1	\$1,430,919.84	36	\$1,437,114.30	\$0.00	\$6,194.46	\$0.00	\$1,430,919.84
TOTALES	\$1,430,919.84		\$1,430,919.84		\$1,437,114.30	\$0.00	\$6,194.46	\$0.00	\$1,430,919.84

MONTO AUTORIZADO:	\$2,872,135.80	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$2,872,135.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	EXISTE X

NO. DE CONTRATO:	IGTZ-LR 28-CAPUFE/2018 30 069 041	FECHA:	29/08/2018
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RUZAMU S.A DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$2,872,135.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRAMADA	REAL
	TÉRMINO	01/06/2018	30/08/2018
	DÍAS	15	0
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
FECHA DE PAGO:			

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$1,430,919.84	29/08/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$1,430,919.84	29/08/2018
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	25	100	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	0	50	100	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	50	100	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$247,597.91	\$247,597.00	
AFIANZADORA:	Fianzas Monterrey S.A DE Fianzas Monterrey S.A DE		
No. DE FIANZA:	1933908	1948271	
FECHA:	29/08/2018	10/09/2018	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE IMPORTE/PERIODO	FECHA
	PLAZO	INICIAL FINAL	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$2,872,135.00	C/IVA	

*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



Arq. ANTONIO RÍOS PÉREZ
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Norberto Juárez Mejía
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

FECHA DE ELABORACION:
16/04/2018
MES QUE SE REPORTA
SEPTIEMBRE

EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA LOCALIDAD: GUTIERREZ ZAMORA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INTERESES FISMDF 2017 No. DE OBRA: 2018300690050 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: ACCIÓN DE CALLES CON CONCRETO EN SECCIONES AISLADOS "BACHEO", EN LA CABECERA N

ANTECEDENTES:
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO

OBRAS REALIZADAS CON FISMDF:
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA CLAVE AGE: N/A
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI X NO

GRADO DE REZAGO SOCIAL:
MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO X

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:
DIRECTA INDIRECTA COMPLEMENTARIA
PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA
LATITUD LONGITUD

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
ACCIÓN DE CALLES CON CONCRETO EN SECCIONES AISLADOS "BACHEO", EN LA CABECERA N

ESTADO FINANCIERO DE LA OBRA*

FACTURA		PÓLIZA		DESCRIPCIÓN BREVE DEL OBJETO DEL PAGO	IMPORTE
FOLIO	MONTO	FOLIO	MONTO		
463	\$23,035.24	01	\$23,035.24	CEMENTO GRIS Y GRAVA ARENA	\$23,035.24
TOTALES		\$23,035.24			\$23,035.24

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
CONCRETO FC=250 KG/CM2 20 CM DE ESPESOR.

MONTO AUTORIZADO:	\$23,035.24	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$23,035.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA VALIDACIÓN:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	

MANO DE OBRA, LISTAS DE RAYA

No.	IMPORTE	No.	PERIODO DE LA LISTA DE RAYA	IMPORTE
TOTALES				
	\$0.00			\$0.00

NO. DE ACUERDO DE EJECUCIÓN: IN-1-FISM REM/2018 FECHA: 09/03/2018

MONTO DEL PRESUPUESTO FINAL:	\$23,035.00	C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL
	INICIO 23/03/2018	09/03/2018
	TÉRMINO 23/03/2018	18/03/2018
	DÍAS 10	10

REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$23,035.24	15/03/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$23,035.24	15/03/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		23/03/2018

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Arg. ANTONIO RIOS PEREZ DIRECTOR DE OBRAS
ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA SUPERVISOR



OBSERVACIONES:

*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

FORMATO 12

C.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUTIÉRREZ ZAMORA
PRESENTE

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACION

INFORMACION RECEPCIONADA: INFORMACION DE OBRA PUBLICA

PERIODO: SEPTIEMBRE

FECHA DE RECEPCION: 25/10/2018

FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA: 25/10/2018

INFORME ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO		COMENTARIOS MUNICIPIOS	RECEPCION	
	PDF	EXCEL		FECHA	HORA
OFICIO DE REMISIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA	✓		OFICIO 0569 SE REMITE ESTADOS DE OBRA MES DE SEPTIEMBRE 2018	25/10/2018	18:09:17
ACTA DE SESIÓN DE CABILDO DE AUTORIZACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA	✓		ACTA 58 APROBACIÓN DE LAS ESTADOS DE OBRA MES SEPTIEMBRE 2018	25/10/2018	18:21:47
RELACIÓN Y TOTAL DE OBRAS	✓		LISTAS DE OBRAS Y ACUSES SIMVER ORFIS MES SEPTIEMBRE 2018	25/10/2018	18:30:45
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (FORMATO 9)	✓		FORMATO DE REPORTE FOTOGRÁFICO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	25/10/2018	18:34:56
ESTADO MENSUAL DE OBRA POR CONTRATO (FORMATO 11)	✓		FORMATO 11 REPORTE DE LOS CONTRATOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	25/10/2018	18:39:50
ESTADO MENSUAL DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (FORMATO 12)	✓		REPORTE POR ADMINISTRACIÓN INT. FISM 2017	25/10/2018	18:44:26
REPORTE TRIMESTRAL (FORMATO 03) TERCER TRIMESTRE	✓		TRIM-3 FONDOS: FIS MDF 2018- FORTAMUNDF 2018- PRODERE 2018- FORTAFIN 2018- CAPUFE 2017- CAPUFE 208-INT. FISM 2017.	25/10/2018	22:40:58

El presente documento se emite en el caso de Estados Financieros y Estados de Obra Pública mensuales de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para las demás se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. No exime de solicitudes, se reciben documentos con reserva de Ley, este recibo no implica validación de la información.
