

**OPERADO
FISMA**

Villa García, Zac. A 25 de Abril 2022

REPORTE DE OBRA



[REDACTED]
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

PRESENTE

De acuerdo al programa de supervisiones de obra pública que establece la ley orgánica municipal vigente, se realizan supervisiones a las obras ejecutadas con los recursos provenientes de fondo de aportaciones para la infraestructura social y municipal (FISMDF), así como los provenientes de los recursos federales, estatales y otros. Se supervisó la obra: CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES 9 DE MAYO, COLORINES, Y 21 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE AGUA GORDA, VILLA GARCÍA, ZAC. se realizó con FONDO III 2022. De la cual le informo los resultados obtenidos de la visita.

Contratista [REDACTED]

Nº de contrato: 2 MVG - 19 - 04 - 22

Supervisor [REDACTED]

Fecha de inspección: 25 de Abril del 2022.



La obra se encuentra a un 10% de avance.

Se da inicio con los trabajos correspondientes a las obras de drenaje con un recorrido en las tres áreas a construir, llegando a un acuerdo del material adecuado para su construcción de pozos y tapas.

La obra se encuentra a un 10% de avance

López Mateos No. 102, Col. Centro
Villa García, Zacatecas, México C.P. 98900
Ayuntamiento_1316villagarcia@outlook.com



[REDACTED]
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

ATENTAMENTE

[REDACTED]
SUPERVISOR DE OBRA

000014

JUNTOS SEGUIMOS AVANZANDO



OPERATIVO
FISM

Villa García, Zac. A 26 de Abril 2022

REPORTE DE OBRA



[Redacted]

DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

PRESENTE

De acuerdo al programa de supervisiones de obra pública que establece la ley orgánica municipal vigente, se realizan supervisiones a las obras ejecutadas con los recursos provenientes de fondo de aportaciones para la infraestructura social y municipal (FISMDF), así como los provenientes de los recursos federales, estatales y otros. Se supervisó la obra: CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES 9 DE MAYO, COLORINES, Y 21 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE AGUA GORDA, VILLA GARCÍA, ZAC. se realizó con FONDO III 2022. De la cual le informo los resultados obtenidos de la visita.

Contratista

[Redacted]

Nº de contrato: 2 MVG - 19 - 04 - 22

Supervisor

[Redacted]

Fecha de inspección: 26 de Abril del 2022.



Se inicia marcaje de excavación por lo cual se confirma la existencia de material tipo C (rocoso) en el tramo de la zanja para lo cual se aran cambios y a su vez se marcan las alcantarillas de descarga.

La obra se encuentra a un 20% de avance.

López Mateos No. 102, Col. Centro
Villa García, Zacatecas, México C.P. 98900
Ayuntamiento_1316villagarcia@ortitok.com



[Redacted signature]


DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

ATENTAMENTE

[Redacted signature]

SUPERVISOR DE OBRA

000115



**OPERADO
FISMD**

Villa García, Zac. A 29 de Abril 2022

REPORTE DE OBRA



[Redacted]
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

PRESENTE

De acuerdo al programa de supervisiones de obra pública que establece la ley orgánica municipal vigente, se realizan supervisiones a las obras ejecutadas con los recursos provenientes de fondo de aportaciones para la infraestructura social y municipal (FISMD), así como los provenientes de los recursos federales, estatales y otros. Se supervisó la obra: CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES 9 DE MAYO, COLORINES, Y 21 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE AGUA GORDA, VILLA GARCÍA, ZAC. se realizó con FONDO III 2022. De la cual le informo los resultados obtenidos de la visita.

Contratista [Redacted]

Nº de contrato: 21 MVG - 19 - 04 - 22

Supervisor [Redacted]

Fecha de Inspección: 29 de Abril del 2022.



Se inicia la colocación de plantilla rectificando los niveles correspondientes a las pendientes y a su vez en la misma tubería, también se coloca plantilla para los pozos de vista en la áreas trazadas.

La obra se encuentra a un 30% de avance.

ATENTAMENTE

[Redacted Signature]
[Redacted]
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA
MUNICIPIO DE VILLA GARCIA, ZAC.

[Redacted Signature]
[Redacted]
SUPERVISOR DE OBRA

000116

López Mateos No. 102, Col. Centro
Villa García, Zacatecas, México C.P. 98900
Ayuntamiento_1316villagarcia@outlook.com



**OPERANDO
FISMDF**

Villa García, Zac. A 17 de Mayo 2022

REPORTE DE OBRA



[REDACTED]
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

PRESENTE

De acuerdo al programa de supervisiones de obra pública que establece la ley orgánica municipal vigente, se realizan supervisiones a las obras ejecutadas con los recursos provenientes de fondo de aportaciones para la infraestructura social y municipal (FISMDF), así como los provenientes de los recursos federales, estatales y otros. Se supervisó la obra: CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES 9 DE MAYO, COLORINES, Y 21 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE AGUA GORDA, VILLA GARCÍA, ZAC. se realizó con FONDO III 2022. De la cual le informo los resultados obtenidos de la visita.

Contratista [REDACTED]

Nº de contrato: 21 MVG - 19 - 04 - 22

Supervisor [REDACTED]

Fecha de inspección: 17 de Mayo del 2022.



Se revisan los trabajos de excavación del área tres así como la colocación de tubería y trabajos de relleno y construcción de alcantarillado realizando ajustes necesarios de metas y conceptos.

La obra se encuentra a un 70% de avance.

ATENTAMENTE

[Signature]
[REDACTED]
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

[Signature]
[REDACTED]
SUPERVISOR DE OBRA

000118

López Mateos No. 102 Col. Centro
Villa García, Zacatecas, México C.P. 98900
Ayuntamiento_1316:villagarcia@outlook.com

JUNTOS SEGUIMOS AVANZANDO



**OPERADO
FISIM**

Villa García, Zac. A 24 de Mayo 2022

REPORTE DE OBRA

[REDACTED]
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

PRESENTE

De acuerdo al programa de supervisiones de obra pública que establece la ley orgánica municipal vigente, se realizan supervisiones a las obras ejecutadas con los recursos provenientes de fondo de aportaciones para la infraestructura social y municipal (FISMDF), así como los provenientes de los recursos federales, estatales y otros. Se supervisó la obra: CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES 9 DE MAYO, COLORINES, Y 21 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE AGUA GORDA, VILLA GARCÍA, ZAC. se realizó con FONDO III 2022. De la cual le informo los resultados obtenidos de la visita.

Contratista [REDACTED]

Nº de contrato: 21 MVG - 19 - 04 - 22

Supervisor [REDACTED]

Fecha de inspección: 24 de Mayo del 2022.

Se inicia con la construcción de descargas domiciliarias dejando el tubo al borde de la calle para los beneficiarios y así realicen la conexión necesaria a sus viviendas.

La obra se encuentra a un 90% de avance.



ATENTAMENTE




[REDACTED]
SUPERVISOR DE OBRA

000119

López Mateos No. 102 Col. Centro
Villa García, Zacatecas, México C.P. 98900
Ayuntamiento_1316villagarcia@outlook.com

JUNTOS SEGUIMOS AVANZANDO



Villa García, Zac. A 27 de Mayo 2022

REPORTE DE OBRA

[REDACTED]
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

PRESENTE

De acuerdo al programa de supervisiones de obra pública que establece la ley orgánica municipal vigente, se realizan supervisiones a las obras ejecutadas con los recursos provenientes de fondo de aportaciones para la infraestructura social y municipal (FISMDF), así como los provenientes de los recursos federales, estatales y otros. Se supervisó la obra: CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES 9 DE MAYO, COLORINES, Y 21 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE AGUA GORDA, VILLA GARCÍA, ZAC. se realizó con FONDO III 2022. De la cual le informo los resultados obtenidos de la visita.

Contratista: [REDACTED]

Nº de contrato: 21 MVG - 19 - 04 - 22

Supervisor: [REDACTED]

Fecha de inspección: 27 de Mayo del 2022.

Se da termino con los trabajos realizados por el contratista, en el cual especifica y deja en claro con el personal del ayuntamiento los cambios y ajustes necesarios en las metas.

La obra se encuentra a un 100% de avance.



[REDACTED]
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA


ATENTAMENTE

[REDACTED]
SUPERVISOR DE OBRA

López Mateos No. 102, Col. Centro
Villa García, Zacatecas, México C.P. 98900
Ayuntamiento_1316villagarcia@outlook.com

000120

JUNTOS SEGUIMOS AVANZANDO

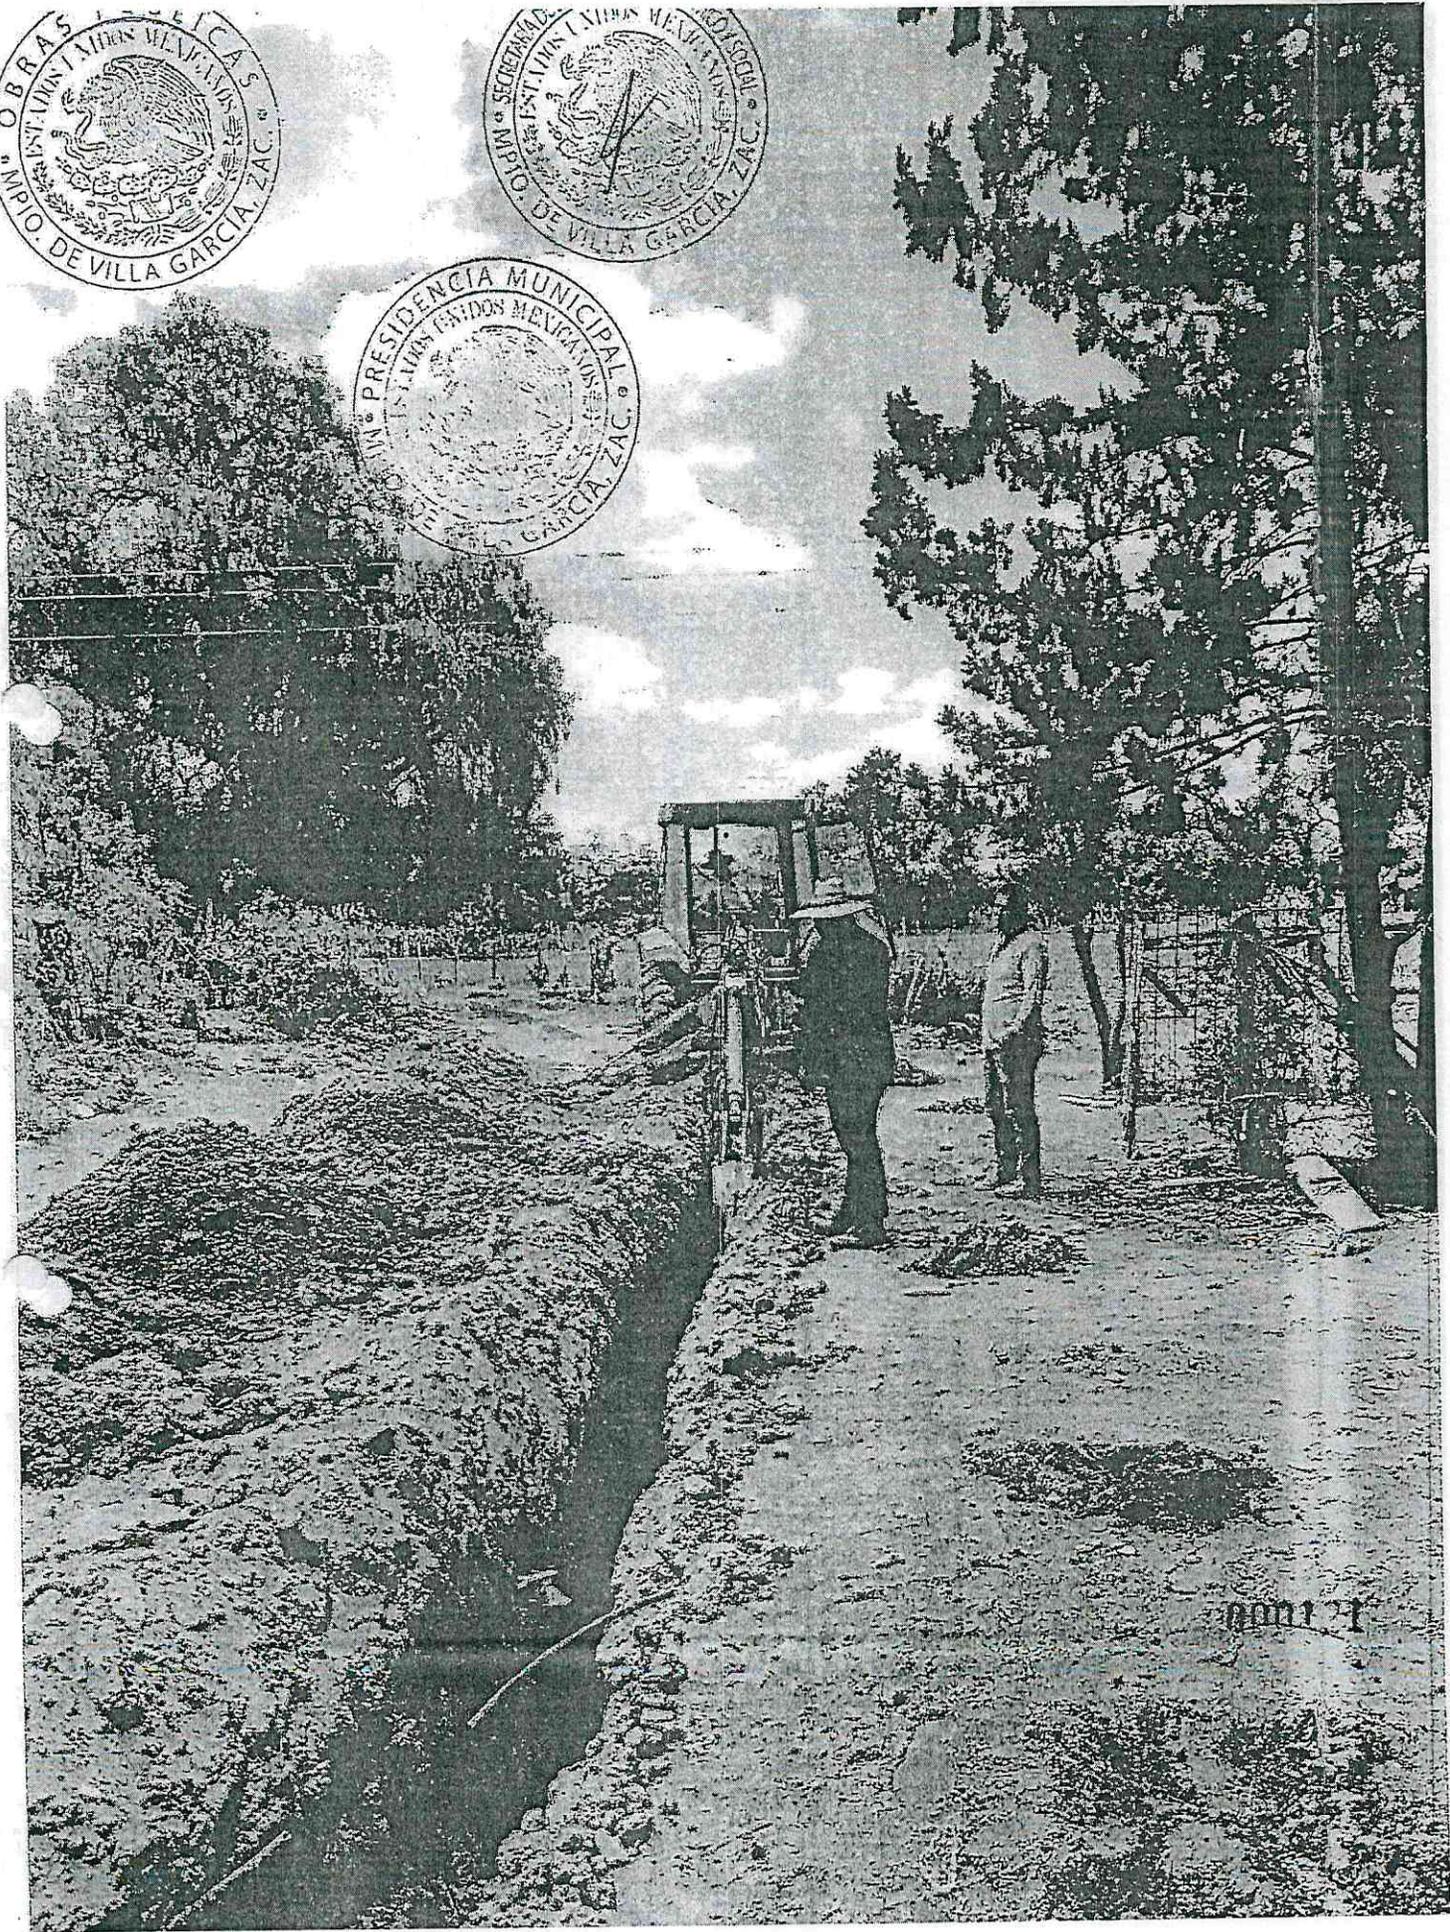

0001 71
