

INFORME DE SUPERVISION DE OBRA

DIRECCION DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

REAL		PROGRAMADO	
AVANC FISICO	100	AVANC FISICO	100
AVANC FIANC	100	AVANC FIANC	100

No. REPORTE :	1
FECHA REPORTE :	02/10/2023

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE : CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA CON BIODIGESTOR DE CAPACIDAD DE 7,500 LITROS PARA BENEFICIAR A 18 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUAGORDA, VILLA GARCIA, ZACATECAS

UBICACION : AGUA GORDA

TIPO DE OBRA : NUEVA

MODALIDAD EJEC.: ADJUDICACION DIRECTA

No.CONTRATO : CTO NO. 7 MVG -02-05-2023

EMPRESA : JUAN PABLO CONTRERAS LOPEZ

MONTO CONTRATO : \$ 102,316.51

FECHA CONTRATO : 02/05/2023

MONTO ANTICIPO : \$

FECHA PAGO ANTICIPO : 0-ene-00

No. AMPL. DE CONTRATO: N/A

MONTO AMPL. CONTRATO: N/A

FECHA AMPL. CONTRATO: N/A

PERIODO DE EJECUCION	INICIO	TERM.
FECHAS PROGRAMADAS :	2-may-23	30-may-23
FECHAS REALES :	2-may-23	30-may-23

FECHAS REPROGRAMADAS : OBSERVACIONES

PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA	MESES												DIAS	% EN BASE TIEMPO				
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC						
PARTIDAS																		
LETREIRO					█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█		
PRELIMINARES Y EXCAVACIONES					█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█		
FOSA					█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█		
BIODIGESTOR					█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█		
IMPORTES																		
\$														4,837.91				
\$														7,795.63				
\$														22,841.73				
\$														52,758.62				
SUB-TOTAL															\$ 88,203.89			
16% I.V.A.															\$ 14,112.62			
TOTAL															\$ 102,316.51			



DIRECTOR OBRAS PUBLICAS
HOMBERTO ACOLLANE DAVALA

SUPERVISOR DE OBRA
JUAN PABLO CONTRERAS LOPEZ


JORGE ADRIAN BASTIDA GOMEZ



MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

INFORME FOTOGRÁFICO

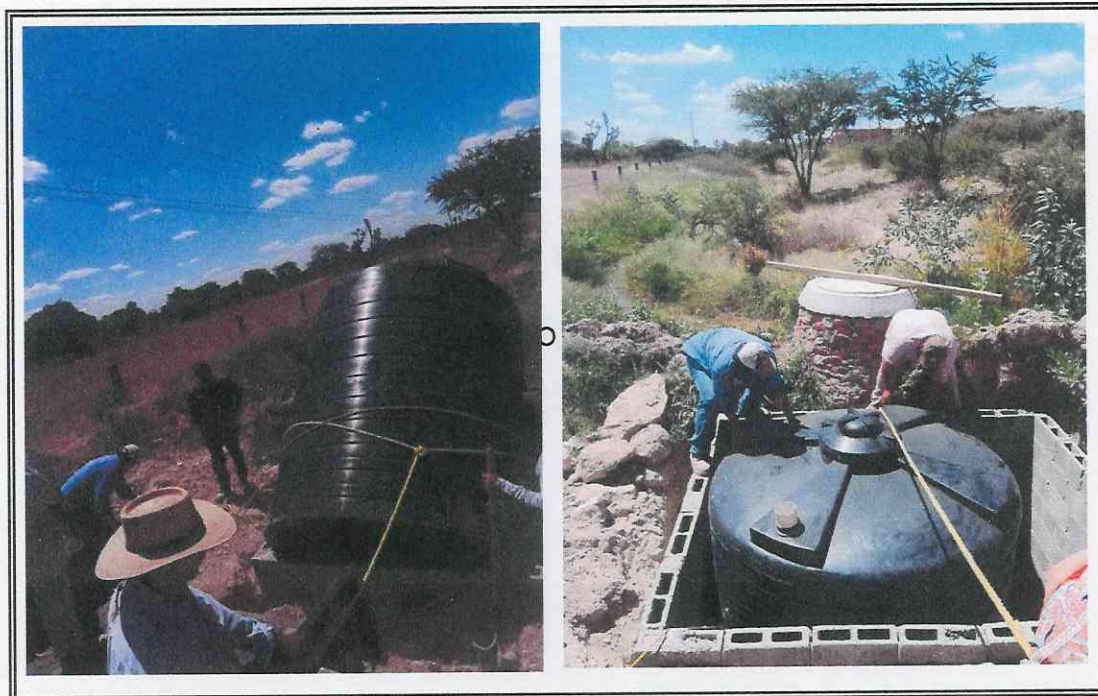

CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA CON BIODIGESTOR DE CAPACIDAD DE 7,500 LITROS PARA BENEFICIAR A 18 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUAGORDA, VILLA GARCIA, ZACATECAS

OBRA: **AGUA GORDA**
LOCALIDAD: **AGUA GORDA**
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO **2-may-23** TERMINO **30-may-23**
FECHA **lunes, 2 de octubre de 2023**
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE): **100%**

BITÁCORA DE OBRA.

CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA CON BIODIGESTOR DE CAPACIDAD DE 7,500 LITROS PARA BENEFICIAR A 18 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUAGORDA, VILLA GARCIA, ZACATECAS

Nota 1: Se da el inicio con la ubicación de la colocación de biodigestor para rrealizar las excavaciones correspondietnes considerando pendientes adecuadas para el flujo de las aguas residuales y asi se realice el adecuado tratamiento de las mismas.

Nota 2: Se da inicio a las excavaciones, y una vez terminados, se procede a afinar los taludes de la fosa así como del piso para colocar la plantilla de concreto.

Nota 3: Se da incio a la construcción de muros a base de block.

Nota 4: Se colococo el biodigestor, para' realizar la construcción del techo de la fosa, así como el acondicionamiento de la tubería y descarga del agua ya tratada.

Nota 5: Con la colocación de las tapas para protección y manejo de los contenedores de las aguas residuales (biodigeter y contenedor de lodos) se da por concluida la obra programada lista para su recepción.
