



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!

¡YA ES HORA DE CREER EN TI!
ESPERANZA
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL
Y COMBATE A LA POBREZA



INFORME MENSUAL DE ESTADO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
**OBRAS
PÚBLICAS**

OCTUBRE 2018

Recibí
JWS
27/11/18



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!

¡YA ES HORA DE CREER EN TI!
ESPERANZA
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL
Y COMBATE A LA POBREZA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA.
OFICIO No. P-2018/23/11-0629
ASUNTO: REPORTE MES DE OCTUBRE

DIP. JOSÉ MANUEL POZOS CASTRO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
LXV LEGISLATURA DEL ESTADO
XALAPA, VERACRUZ.
PRESENTE:

El que suscribe **C. Ing. Wilman Monje Morales**, Presidente Municipal Constitucional de Gutiérrez Zamora, por medio del presente me dirijo a usted para hacer de conocimiento que en cumplimiento a lo que establece el artículo 30 de la *Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*, así como *Las Reglas de Carácter General para el cumplimiento de la Presentación de Información Municipal a través de Medios Electrónicos* al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz; remito a usted el **Estado de Obra Pública correspondiente al mes de Octubre 2018**, generado en el sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), así como el acta de cabildo donde fueron aprobados.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Gutiérrez Zamora, Ver.; a Viernes 23 de Noviembre de 2018.

ATENTAMENTE


ING. WILMAN MONJE MORALES.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE GUTIÉRREZ ZAMORA.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
PRESIDENCIA

c.c.p. el archivo



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!

¡YA ES HORA DE CREER EN TI!
ESPERANZA
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL
Y COMBATE A LA POBREZA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA.
OFICIO No. P-2018/23/11-0630
ASUNTO: REPORTE MES DE OCTUBRE

C.P.C LORENZO ANTONIO PORTILLA VÁSQUEZ
AUDITOR GENERAL TITULAR DEL ORGANO
DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO.
PRESENTE:

El que suscribe **C. Ing. Wilman Monje Morales**, Presidente Municipal Constitucional de Gutiérrez Zamora, por medio del presente me dirijo a usted para hacer de conocimiento que en cumplimiento a lo que establece el artículo 30 de la *Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*, así como *Las Reglas de Carácter General para el cumplimiento de la Presentación de Información Municipal a través de Medios Electrónicos* al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz; remito a usted el **Estado de Obra Pública correspondiente al mes de Octubre 2018**, generado en el sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), así como el acta de cabildo donde fueron aprobados.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Gutiérrez Zamora, Ver.; a Viernes 23 de Noviembre de 2018.

ATENTAMENTE


ING. WILMAN MONJE MORALES.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE GUTIÉRREZ ZAMORA.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
PRESIDENCIA

c.c.p. el archivo



ACTA NUMERO 62 SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
GUTIÉRREZ ZAMORA, VERACRUZ

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO efectuada por el Honorable Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz, a las NUEVE horas del QUINCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, de conformidad con lo que disponen los Artículos 36, Fracción I, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz-Llave.-
Preside el C. Wilman Monje Morales Presidente Municipal, con quórum integrado por los ciudadanos: C. Rosa María Ortega González, Sindica Única; C. Gonzalo Quiñones López Regidor Primero, Silviana Rodríguez Martínez Regidora Segunda, Francisco Hatzel Gómez Ochoa Regidor Tercero, Rosalía García Guerrero Regidora Cuarta. El C. Presidente Municipal, C. Wilman Monje Morales, declara abierta la Sesión, acto seguido, el secretario del H. ayuntamiento, procede a pasar lista de asistencia, declarando quórum legal. Inmediatamente da lectura al Orden del Día, misma que a la letra dice:-----

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.-----
- 2.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.-----
- 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-----
- 4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.-----
- 5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018; DE LOS REPORTES DE LOS FONDOS DEL FISM DF 2018, FORTAMUN DF 2018, INTERESES FISM 2017, PRODERE 2018, FORTAFIN 2018, CAPUFE 2017, CAPUFE 2018.-----
- 6.- ASUNTOS GENERALES.-----

Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, C. WILMAN MONJE MORALES, pregunta al Cuerpo Edilicio si están de acuerdo en aprobar el Orden del Día. - ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.-----

CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA APROBADO Y AGOTADOS LOS PUNTOS 1, 2 Y 3 SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO.-----

4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.-----


PRESIDENTE
MUNICIPAL


SINDICA ÚNICA


REGIDOR
PRIMERO


REGIDORA
SEGUNDA


REGIDOR
TERCERO


REGIDORA
CUARTA


SECRETARIO I
AYUNTAMIENTO



En uso de la voz la C. Kitzia Eunice Juárez Salazar, Tesorera Municipal, informa al cabildo los Estados Financieros del mes de octubre de 2018, acorde a lo establecido en el artículo 45 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre, mismos que fueron preparados por la Tesorería Municipal, en términos del artículo 72 fracción XIII de la misma Ley. En uso de la voz el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al cabildo si son de aprobarse los estados financieros correspondientes al mes de octubre del año 2018.-----

PRESIDENTE
MUNICIPAL

El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO. - Se aprueban los Estados Financieros correspondientes al mes de octubre del año 2018. APROBADO POR UNANIMIDAD. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.-----

SINDICA ÚNICA

5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018; DE LOS REPORTES DE LOS FONDOS DEL FISM DF 2018, FORTAMUN DF 2018, INTERESES FISM 2017, PRODERE 2018, FORTAFIN 2018, CAPUFE 2017, CAPUFE 2018.-----

REGIDOR
PRIMERO

En uso de la voz el C. Arq. Antonio Ríos Pérez, Director de Obras Públicas; informa al cabildo los Estados de Obra Pública del mes de octubre de 2018, acorde a lo establecido en el artículo 73 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre; y presenta los reportes de los fondos del FISM DF 2018, FORTAMUN DF 2018, INTERESES FISM 2017, PRODERE 2018, FORTAFIN 2018, CAPUFE 2017, CAPUFE 2018. En uso de la voz el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al cabildo si son de aprobarse los estados de Obra correspondientes al mes de octubre del año 2018; de los reportes de los fondos del FISM DF 2018, FORTAMUN DF 2018, INTERESES FISM 2017, PRODERE 2018, FORTAFIN 2018, CAPUFE 2017, CAPUFE 2018. El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO. - Se aprueban los Estados de Obra Pública correspondientes al mes de octubre del año 2018, de los reportes de los fondos del FISM DF 2018, FORTAMUN DF 2018, INTERESES FISM 2017, PRODERE 2018, FORTAFIN 2018, CAPUFE 2017, CAPUFE 2018. APROBADO POR UNANIMIDAD. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.-----

REGIDORA
SEGUNDA

REGIDOR
TERCERO

REGIDORA
CUARTA

6.- ASUNTOS GENERALES.-----

No hubo asuntos generales.-----

SECRETARIO F
AYUNTAMIENTO

Posterior a ello, el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal, en los términos que marca la Ley, en uso de la voz, hace del conocimiento de los miembros del cabildo que se agotaron los asuntos del orden del día de esta Sexagésima segunda sesión ordinaria del H. Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz.-----

7.- CLAUSURA.-----

Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS, DEL DÍA QUINCE DE



NOVIEMBRE, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA QUE FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS CIUDADANOS EDILES QUE EN ELLA INTERVINIERON ANTE EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, QUE AUTORIZA Y DA FE. REMÍTASE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA AL H. CONGRESO DEL ESTADO. -----



C.

WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
¡BRILLA CON FUERZA!
SINDICATURA

ROSÁ MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICA ÚNICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
¡BRILLA CON FUERZA!
REGIDURIA PRIMERA

C.

GONZALO QUIÑONES LÓPEZ
REGIDOR PRIMERO



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
¡BRILLA CON FUERZA!
REGIDURIA SEGUNDA

SILVANA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
REGIDORA SEGUNDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
¡BRILLA CON FUERZA!
REGIDURIA TERCERA

C.

FRANCISCO HATZEL GÓMEZ OCHOA
REGIDOR TERCERO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
REGIDURIA
CUARTA

ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021

C.

JORGE CHENA BATRES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/41939

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690050	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO EN SECCIONES AISLADOS "BACHEO", EN LA CABECERA MUNICIPAL.	No	No	No	Sí

EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/41939



SELLO DIGITAL:

vKccR1t3fsYSPpaSs8XbRFedP7B6wcoHCZZArjQ1HG/Zeq8tkRwaWJqX24RVGb/XpUgtEu9teejRx88JrH2wNs9YM9q27VZzA2bQkAs39WO9I6ytk1Ebl1ai6mBc8zGP21gRichz6CHa1mP2dVX+jze4iAVUvwKvj4ijNEjHyU=



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/41940

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690033	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO "STA. ROSA"	No	No	Sí	No
2018300690042	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO LOMAS CHICAS A RAFAEL VALENZUELA DEL KM 0+000 AL KM 0+180	No	No	Sí	No
2018300690040	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RAFAEL VALENZUELA A IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, DEL KM 0+669 AL KM 1+334	No	No	Sí	No
2018300690043	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO LOMAS CHICAS A RAFAEL VALENZUELA DEL KM 0+775 AL KM 0+903	No	No	Sí	No

EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/41940



SELLO DIGITAL:

D9iOyEVS97+UvshEjH5DPEu3VezLPwylMxnHS7pfuNFOamtNgEBPu4Vp7p1Ww+0lldhADJChvgioTpxwVVkSh86dvIK3JppLc/XMcMi1nHfoz2tFUtDd4fzlxW1UffeYWuawA+MSBJ0gQeb8o8xjWadWJd6OHlKoVaKtrR5HPg=



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/41938

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690301	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL "INFRAESTRUCTURA VIAL" EN LA CABECERA MUNICIPAL	No	No	Sí	No

EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/41938



SELLO DIGITAL:

hst0cjNtAmv9PB9C/PlpJNspT2BtYObiRzx6mVosv8dOwZsjqETGRFFDjmyipLW3RYvvhysjZTwkCOE739Jx/RlqkY7vvAK1IZQ5iFvntoPPH24L9LOfHYsmdt9LUjJhLzsSYisBiHKRXd23QnUFlvaxkGIZgVZ6sBfCNQSiebU=



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/41937

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690302	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE MUNICIPAL EN COLONIA CUAHUTÉMOC, EN CABECERA MUNICIPAL	No	No	Sí	No

EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/41937



SELLO DIGITAL:

KHXZBNht+ZCEOpRoVo8g4cqZr7Fpp9dDsFOyEIUckAN9WPmAK97yhx1XoG5PY4ArQQSznI4ECfM6i9cYP/dnBqZha8jK1g81kHKtcEbyZTfZsXl18G5Lni24qJtqGSFKZeDEFgHZ/Itwi5wVrwhmYLya9nIKVOQhZFBab5jw=



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/42252

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690225	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES Y OBRAS DE ACCESO EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, GALERAS DE LA FERIA Y LIENZO CHARRO.	No	No	No	No
2018300690226	REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL	No	No	No	No
2018300690232	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL	Sí	No	Sí	No

EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/42252



SELLO DIGITAL:

LRzC8v+Dt8iuV5WpoiPPf+2XBfMlrU4k9moKa6U8jiaOvYy3FFWcTe4SxAs1Cyw1hsf9dM5q4ckEV9c53eonv4NxtZII5RW90uWqxMbb+UTKISBKVIW8iKpDjKuo2Gcekadz60tcHYGgcMD8cnFI9/3+LQ3ggcnEvazj+hmc=



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/42715

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690101	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA DE LA RIBERA ENTRE PUENTE TECOLUTLA Y PUERTO CABALLERO	No	No	No	No
2018300690102	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO CORONADO - LOMAS CHICAS	No	No	Sí	No
2018300690103	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRILES - EL CEPILLO	No	No	Sí	No
2018300690104	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRILES - SAN ANTONIO CORONADO	No	No	Sí	No
2018300690105	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: RAFAEL VALENZUELA-LOMAS CHICAS	No	No	Sí	No
2018300690106	REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO EN CALLES NIÑOS HÉROES, EMILIANO ZAPATA Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL EJIDO SOTO Y GAMA	No	No	No	No
2018300690107	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, CLAVE: 30DPR5104U COL. ASOCIACIÓN CIVIL.	No	No	Sí	No
2018300690110	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 109, COLONIAS DEL CARMEN, MURILLO VIDAL, HERNÁNDEZ OCHOA	Sí	No	Sí	No
2018300690112	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 202, COLONIAS PRIMERO DE MAYO, AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO Y FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS	Sí	No	Sí	No
2018300690113	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 185, COLONIA CUAUHTLAN	Sí	No	Sí	No
2018300690114	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 019A, COLONIAS EL PORVENIR, ASOCIACIÓN CIVIL PRIMERO DE MAYO Y AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO.	Sí	No	Sí	No



SELLO DIGITAL:

gjuYbh+VH5Ct/S6e6APUIY7ApAzYqVk9+96yKwg+LwVXbIM6E74zWQtLUoe859mBOnORjL8gGNWSVcajNKepY+2kpHxprSEOQInenB+XmB2LUQTcBc/wJ63BHcXF9F+DMVKuDqS0ilCwbFEqLDCcfm+I3hTpFBdoXzBmX1UT3A=



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/42715

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690116	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 217, COLONIAS FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, LUIS DONALDO COLOSIO Y GUADALUPE	No	No	Sí	No
2018300690108	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL ENRIQUE RODRIGUEZ CANO CLAVE: 30DPR0616M, LOCALIDAD EL COCO	No	No	Sí	No
2018300690109	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE DR. ALEJANDRO CERISOLA EN CABECERA MUNICIPAL.	No	No	No	No
2018300690124	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD LOMAS CHICAS	Sí	No	Sí	No
2018300690125	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD LOMAS DE ARENA	Sí	No	Sí	No
2018300690126	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD CARRILLO PUERTO SANTA ROSA	No	No	Sí	No
2018300690127	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL VALENZUELA	Sí	No	Sí	No
2018300690128	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	Sí	No	Sí	No
2018300690129	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL CEPILLO	No	No	No	No
2018300690130	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MACARENA ARRAZOLA	No	No	No	No
2018300690131	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA	No	No	No	No
2018300690132	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PAGUAS DE CORONADO	No	No	No	No



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
**OBRAS
PUBLICAS**

SELLO DIGITAL:

gjuYbh+VH5Ct/S6e6APUIY7ApAzYqVk9+96yKwg+LwVxbIM6E74zWQtblUoe859mBOnORjL8gGNWSVcajNKepY+2kpHxprSEOQInenB+XmB2LUQTcB/wJ63BHcXF9F+DMVKuDqS0ilCwbFEqLDCcfm+I3hTpFBdoXzBmX1UT3A=



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/42728

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690401	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - ENTRONQUE PAGUAS DE CORONADO DEL KM 0+000 AL KM 1+400	No	No	No	No
2018300690403	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE "B" ENTRE CALLE 2 Y LIMITE DE COLONIA FIDEL HERRERA, EN COLONIA ASOCIACIÓN CIVIL	Sí	No	Sí	No
2018300690404	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN SECCIÓN DE CALLES MELCHOR OCAMPO ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE MELCHOR OCAMPO Y JUVENTINO ROSAS, JUVENTINO ROSAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA ALLENDE EN LA LOCALIDAD RAFAEL	No	No	No	No
2018300690402	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: ARROYO GRANDE - LA GALEANA DEL KM 0+000 AL KM 2+000	Sí	No	Sí	No
2018300690405	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MÉXICO ENTRE CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO Y CALLE PERU Y PERÚ ENTRE CALLE MÉXICO Y GUYANA EN LA COLONIA FIDEL HERRERA	No	No	No	No
2018300690406	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMO: RICARDO FLORES MAGON- LAS BOMBAS	No	No	No	No
2018300690407	REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS CON PASAMANOS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES RICARDO FLORES MAGON Y FRANCISCO I. MADERO EN COLONIA REVOLUCIÓN	No	No	No	No

EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/42728



SELLO DIGITAL:

B7GJCy3IreQzVAhU30JHCae51IezuoyR3Wu7QW34H7eUfEDypP3ZqpcBQDZlpg+OMo69Ximw1kTrbeAgI+MwzT4HP5/0oTzglFm1Gh5Iz3MwGXwteKQiom1zVAWDo41VeFnVpjU2ezvXwbjKpjnVKp6ghCHwymmmV6ruG/0CrZ3Y=

Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/42728

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690408	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CONSTITUCIÓN, ENTRE AVENIDA DOS DE ABRIL Y CINCO DE FEBRERO EN EL CERRO DE LOS PINOS, CABECERA MUNICIPAL	No	No	No	No
2018300690409	REHABILITACIÓN CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN CALLES: NIÑOS HÉROES, EMILIANO ZAPATA, GENERAL LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO DEL EJIDO SOTO Y GAMA	No	No	Sí	No
2018300690410	REHABILITACIÓN CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN CALLES AVENIDA MORELOS, AVENIDA HIDALGO, EMILIANO ZAPATA, JUVENTINO ROSAS DE LOCALIDAD RAFAEL VALENZUELA	No	No	Sí	No
2018300690411	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: ANCLON Y ARENAL BARRILES	No	No	No	No
2018300690412	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS ENTRE "EL FALSO Y CEMENTERIO DE SANTA ROSA" DEL KM 0+000 AL KM 1+460	No	No	No	No
2018300690414	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR MODELOS EFICIENTES TIPO CITI 55-305V EN CABECERA MUNICIPAL	No	No	No	No
2018300690415	REHABILITACIÓN DE PARQUE IGNACIO MUÑOZ ZAPOTAL CONSISTENTE EN: JARDINERAS, QUIOSCO, ANDADORES Y ALUMBRADO PÚBLICO	No	No	No	No
2018300690413	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLEJÓN CINCO DE MAYO, CERRO DE LA CRUZ EN CABECERA MUNICIPAL	No	No	No	No
2018300690416	REHABILITACIÓN DE PARQUE COL. FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS CONSISTENTE: JARDINERAS, ANDADORES, COLOCACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CANAL PLUVIAL Y ALUMBRADO PÚBLICO	No	No	No	No

EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/42728



SELLO DIGITAL:

B7GJCy3IreQzVAH30JHCae51IezuoyR3Wu7QW34H7eUfEdypP3ZqpcBQZDlpg+OMo69Ximw1kTrbeAgI+MwzT4HP5/0oTzgfFm1Gh5IZ3MwGXwteKQiom1zVAWDo41VeFnVpjU2ezvXwbjKpjnVKp6ghCHwymV6ruG/0CrZ3Y=



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/42728

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690417	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: ENTRONQUE A CAMINO A PALO BLANCO - A LA LOCALIDAD MARIO HERNÁNDEZ POSADAS DEL KM 0+000 AL KM 3+200	No	No	No	No
2018300690418	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN TRAMO: UNIVERSIDAD-ENTRONQUE A CAMINO PAGUAS DE ARROYO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 2+820	No	No	No	No

EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/42728



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRAS
PÚBLICAS

SELLO DIGITAL:

B7GJCy3IreQzVAhU30JHCae51lezuoyR3Wu7QW34H7eUfEDypP3ZqpcBQDZlpg+OMo69Ximw1kTrbeAgl+MwzT4HP5/0oTzgfFm1Gh5IZ3MwGXwteKQiom1zVAWDo41VeFnVpjU2ezvXwbjKpjnVKp6ghCHwymV6ruG/0CrZ3Y=



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690232.00	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL			Fuente de financiamiento:	LOS MUNICIPIOS Y DE LAS
				Fecha de revisión:	12/11/2018



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
OBRAS
PÚBLICAS

Ing. Luis Javier Oróstico López
INGENIERO

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690110.00	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	3.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 109, COLONIAS DEL CARMEN, MURILLO VIDAL, HERNÁNDEZ OCHOA			Fuente de financiamiento:	OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	12/11/2018



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:



Ing. Rodolfo Gutierrez Lechuga
INGENIERO
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis




H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690112.00	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	3.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 202, COLONIAS PRIMERO DE MAYO, AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO Y FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS			Fuente de financiamiento:	OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	12/11/2018

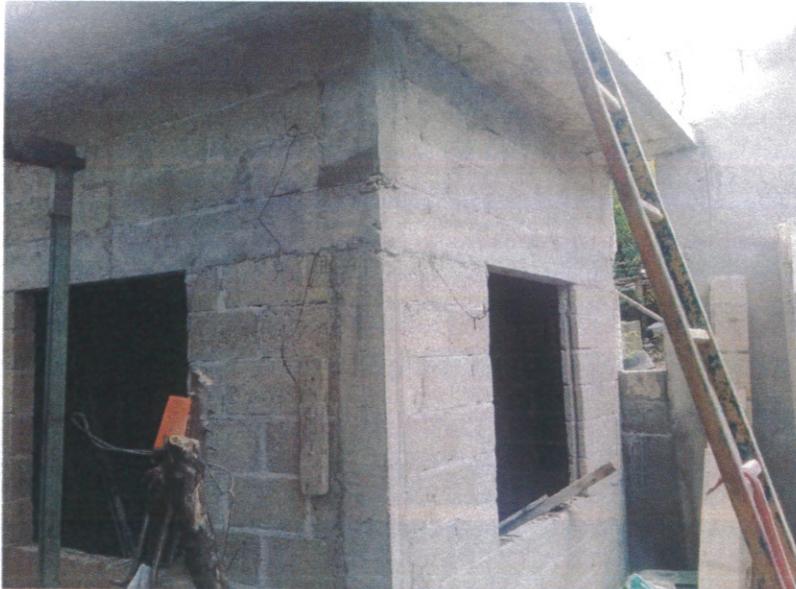

FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Observaciones area (empty space for notes)




 Ing. Rodolfo Gutiérrez Lechuga
 INGENIERO
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690113.00	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	3.00
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 185, COLONIA CUAUHTLAN			Fuente de financiamiento: OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS		
				Fecha de revisión:	12/11/2018



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.



Ing. Rodolfo Gutierrez Lechuga
INGENIERO
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690114.00	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	3.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 019A, COLONIAS EL PORVENIR, ASOCIACIÓN CIVIL PRIMERO DE MAYO Y AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO.			Fuente de financiamiento:	OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	12/11/2018



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:



EL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRAS
PÚBLICAS


 Ing. Rodolfo Gutierrez Lechuga
 INGENIERO
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio: GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad: LOMAS CHICAS	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2018
No. de obra: 2018300690124.00	Periodo: OCTUBRE	Número de estimación: 2.00
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD LOMAS CHICAS		Fuente de financiamiento: OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
		Fecha de revisión: 12/11/2018



FOTO

Concepto de obra ejecutado:




FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Observaciones area with a stamp from the Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz, dated 12/11/2018.


 Ing. Rodolfo Gutierrez Lechuga
 INGENIERO
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)


DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	LOMAS DE ARENA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690125.00	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	2.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD LOMAS DE ARENA			Fuente de financiamiento:	SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	12/11/2018



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

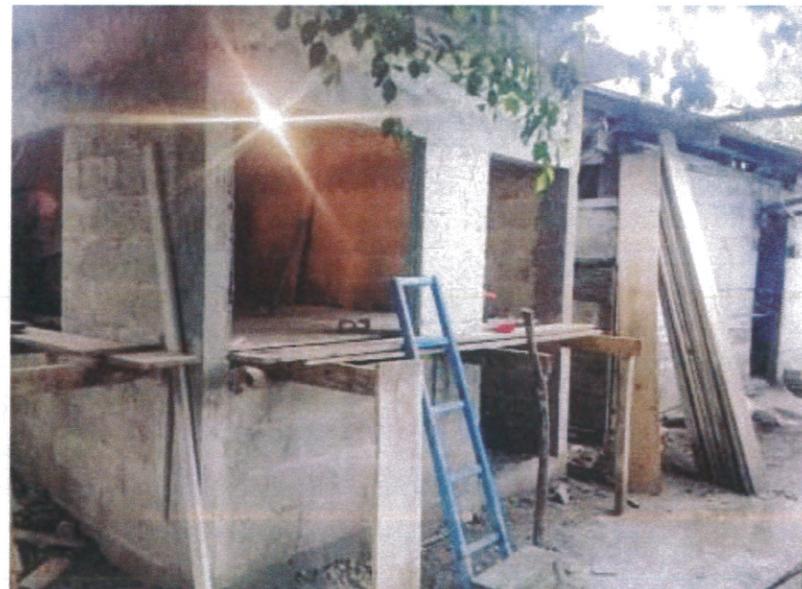

FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.



Ing. Rodolfo Gutierrez Lechuga
INGENIERO
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio: GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad: RAFAEL VALENZUELA	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2018
No. de obra: 2018300690127.00	Periodo: OCTUBRE	Número de estimación: 3.00
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL VALENZUELA		Fuente de financiamiento: OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
		Fecha de revisión: 12/11/2018



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.




 Ing. Rodolfo Gutierrez Lechuga
 INGENIERO
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)


DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	M. ALTAMIRANO (PLAN DE ALTA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690128.00	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	2.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO			Fuente de financiamiento:	OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	12/11/2018



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

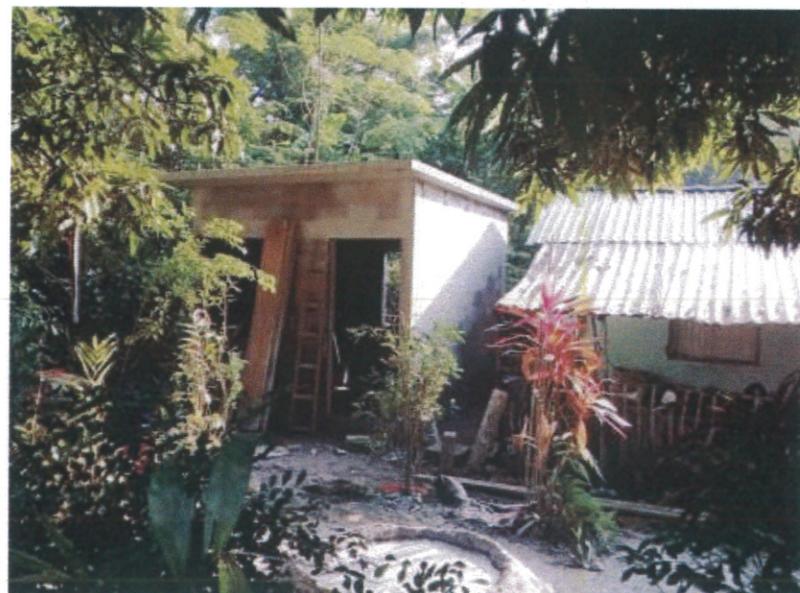

FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.



Ing. Rodolfo Gutierrez Lechuga

INGENIERO

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	ARROYO GRANDE	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690402.00	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	2.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: ARROYO GRANDE - LA GALEANA DEL KM 0+000 AL KM 2+000			Fuente de financiamiento:	MINOS Y PUENTES FEDERAL
				Fecha de revisión:	24/11/2018



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.




 Ing. Alfredo Moreno Neri
 INGENIERO
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)


DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690403.00	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	1.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE "B" ENTRE CALLE 2 Y LIMITE DE COLONIA FIDEL HERRERA, EN COLONIA ASOCIACIÓN CIVIL			Fuente de financiamiento:	MINOS Y PUENTES FEDERAL
				Fecha de revisión:	12/11/2018



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

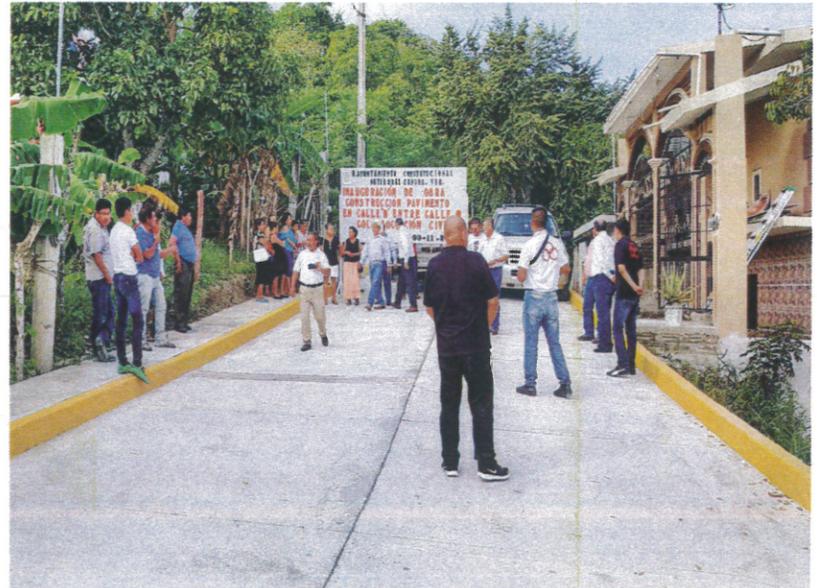

FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.



Ing. Leonel Rodríguez Ríos
INGENIERO
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfís



**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA**

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN: 16/04/2018
MES QUE SE REPORTA OCTUBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: GUTIERREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: ACIÓN DE CALLES CON CONCRETO EN SECCIONES AISLADOS "BACHEO", EN LA CABECERA N
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INTERESES FISMDF 2017	No. DE OBRA: 2018300690050	

ANTECEDENTES:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	MUY ALTO	ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO X
OBRAS REALIZADAS CON FISMDF:		TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:	
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA	CLAVE AGE: N/A	DIRECTA	INDIRECTA COMPLEMENTARIA
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	PROYECTO ESPECIAL	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA			
LATITUD 20.460803	LONGITUD -97.082945		

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
ACIÓN DE CALLES CON CONCRETO EN SECCIONES AISLADOS "BACHEO", EN LA CABECERA N

ESTADO FINANCIERO DE LA OBRA*

FACTURA		POLIZA		DESCRIPCIÓN BREVE DEL OBJETO DEL PAGO	IMPORTE
FOLIO	MONTO	FOLIO	MONTO		
463	\$23,035.24	01	\$23,035.24	CEMENTO GRIS Y GRAVA ARENA	\$23,035.24
TOTALES		\$23,035.24			\$23,035.24

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
CONCRETO FC=250 KG/CM2 20 CM DE ESPESOR.

MANO DE OBRA, LISTAS DE RAYA			
POLIZA DE CHEQUE			
No.	IMPORTE	No.	PERIODO DE LA LISTA DE RAYA
TOTALES		\$0.00	\$0.00

MONTO AUTORIZADO:	\$23,035.24	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$23,035.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA VALIDACIÓN:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		

NO. DE ACUERDO DE EJECUCIÓN:	0N-1-FISM REM/2018	FECHA:	09/03/2018
MONTO DEL PRESUPUESTO FINAL:	\$23,035.00		C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	23/03/2018	09/03/2018
	TERMINO	23/03/2018	18/03/2018
	DÍAS	10	10

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$23,035.24	15/03/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$23,035.24	15/03/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		23/03/2018

AVANCE FISICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0
REAL	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0
ACUMULADO	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ DIRECTOR DE OBRAS
ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA SUPERVISOR



FORMATO 12

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:
16/07/2018
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

MUNICIPIO: GUTIÉRREZ ZAMORA	LOCALIDAD: CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO "STA. ROSA"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CAMINOS Y PUENTES FEDER	No. DE OBRA: 2018300690033	

ANTECEDENTES:										
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:			SI	X	NO					
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:										
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGE:	N/A	GRADO DE REZAGO SOCIAL:						
	URBANA			MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	X	MUY BAJO	
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:										
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:			SI	X	NO					
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO			SI	X	NO					
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA			PROYECTO ESPECIAL			CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE			SI	
LATITUD	20.420623399	LONGITUD	-97.188314198				NO			X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
BARDA PERIMETRAL Y GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
TERMINADA GRADAS Y MURO

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
FINIQUITO	\$639,552.63	1	\$639,552.63	108	\$642,321.26	\$0.00	\$2,768.63	\$0.00	\$639,552.63
TOTALES	\$639,552.63		\$639,552.63		\$642,321.26	\$0.00	\$2,768.63	\$0.00	\$639,552.63

MONTO AUTORIZADO:	\$642,321.26	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$642,321.26	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	EXISTE	X
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	CAPUFE-GTZ-IR-2017300690033	FECHA:	02/10/2017
CONTRATISTA:	FELICIANA BARRIOS ZALETA		
MONTO CONTRATADO:	\$642,321.00		C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRAMADA	REAL
	TÉRMINO	01/01/2018	01/01/2018
	DÍAS	15/12/2018	30/03/2018
	APLICA	89	89
ANTICIPO:	APLICA MONTO:	NO APLICA	X
	FECHA DE PAGO:		PORCENTAJE:

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$642,321.00	30/03/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$642,321.00	30/03/2018
FINIQUITO:	\$642,321.00	30/03/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	26/11/2017

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0
REAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0
ACUMULADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:
TERMINADA

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



Arq. ANTONIO RÍOS PÉREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ARO. ANTONIO RÍOS PÉREZ
SUPERVISOR



**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN: 16/07/2018
MES QUE SE REPORTA OCTUBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: RAFAEL VALENZUELA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO RAFAEL VALENZUELA A IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, DEL KM 0+669 AL KM 1+334
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CAMINOS Y PUENTES FEDER	No. DE OBRA: 2018300690040	

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO		ANTECEDENTES:	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA	CLAVE AGE: N/A	MUY ALTO	ALTO MEDIO BAJO X MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI X NO	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI X NO	DIRECTA	INDIRECTA COMPLEMENTARIA X
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X
LATITUD 20.400158176	LONGITUD -97.126243084		

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
PAGO DE PAVIMENTO OBRA CAPUFE 2017

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
PAVIMENTO EN CAMINO

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
FINIQUITO	\$746,580.20	1	\$746,580.20	A 196	\$749,812.15	\$0.00	\$3,231.95	\$0.00	\$746,580.20
TOTALES	\$746,580.20		\$746,580.20		\$749,812.15	\$0.00	\$3,231.95	\$0.00	\$746,580.20

MONTO AUTORIZADO:	\$749,812.15	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$749,812.15	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	EXISTE	X
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	CAPUFE-GTZ-IR-2017300690040	FECHA:	09/10/2017
CONTRATISTA:	URIEL DEL ANGEL PÉREZ		
MONTO CONTRATADO:	\$749,812.00		C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRAMADA	REAL
	TÉRMINO	01/01/2018	01/01/2018
	DÍAS	15/12/2018	30/03/2018
	APLICA	89	89
ANTICIPO:	MONTO:	NO APLICA	X
	FECHA DE PAGO:		PORCENTAJE:

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$749,812.00	28/03/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$749,812.00	28/03/2018
FINIQUITO:	\$749,812.00	28/03/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	13/12/2017

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0
REAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0
ACUMULADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TERMINADA

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		\$323,275.86	\$375,000.00
AFIANZADORA:		zadora Insurgentes S.A Dzadora Insurgentes S.A D	
No. DE FIANZA:		5652-02076-5	5652-02088-8
FECHA:		09/10/2017	30/11/2017
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO		INICIAL FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$749,812.15	C/IVA

Arq. ANTONIO RÍOS PÉREZ DIRECTOR DE OBRAS

ARQ. ANTONIO RÍOS PÉREZ SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:	15/03/2018
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: LOMAS CHICAS	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO LOMAS CHICAS A RAFAEL VALENZUELA DEL KM 0+000 AL KM 0+180
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CAMINOS Y PUENTES FEDER	No. DE OBRA: 2018300690042	

ANTECEDENTES:										
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:			SI	X	NO					
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:										
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGE:	N/A		MUY ALTO	ALTO	MEDIO	X	BAJO	MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI	X	NO						
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO						
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:										
DIRECTA			INDIRECTA			COMPLEMENTARIA			X	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA										
LATITUD	20.413178197	LONGITUD	-97.141518136							
PROYECTO ESPECIAL			CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE			SI	NO			
						X				

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:	PAVIMENTO EN CAMINO OBAR DE 2017 CAPUFE PASIVOS
--	---

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:	CONCRETO EN CAMINO TERMINADO
--	------------------------------

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
FINIQUITO	\$975,896.16	1	\$975,896.16	99	\$980,120.82	\$0.00	\$4,224.66	\$0.00	\$975,896.16
TOTALES	\$975,896.16		\$975,896.16		\$980,120.82	\$0.00	\$4,224.66	\$0.00	\$975,896.16

MONTO AUTORIZADO:	\$980,120.82	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$980,120.82	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		X	
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	CAPUFE-GTZ-IR-2017300690042	FECHA:	21/11/2017
CONTRATISTA:	PEDRO HERNÁNDEZ REYES		
MONTO CONTRATADO:	\$980,120.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/01/2018	01/01/2018
	TÉRMINO	15/12/2018	30/03/2018
	DÍAS	89	89
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$980,120.00	30/03/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$980,120.00	30/03/2018
FINIQUITO:	\$980,120.00	30/03/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	21/12/2017

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0
REAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0
ACUMULADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:	TERMINADO
-----------------------	-----------

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:		\$84,493.17	\$98,012.08	
AFIANZADORA:		Firma, S.A de C.V. Grupo Firta, S.A de C.V. Grupo Fir		
No. DE FIANZA:		3900-02431-4	3900-02459-2	
FECHA:		21/11/2017	20/12/2017	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	PLAZO		INICIAL	FINAL
	NO APLICA			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$980,120.82		C/IVA	

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ARQ. ANTONIO RÍOS PÉREZ
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACION:	16/07/2018
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: RAFAEL VALENZUELA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO LOMAS CHICAS A RAFAEL VALENZUELA DEL KM 0+775 AL KM 0+903
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CAMINOS Y PUENTES FEDER	No. DE OBRA: 2018300690043	

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:					
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGE:	N/A	GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	URBANA	SI	X	NO	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			
LATITUD	20.408985841	LONGITUD	-97.135090846	DIRECTA	INDIRECTA
				COMPLEMENTARIA	X
				PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE
				SI	NO
				NO	X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO OBRA 2017-PASIVOS CAPUFE

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
PAVIMENTO EN CAMINO TERMINADO

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
FINIQUITO	\$706,129.98	1	\$706,129.98	36	\$709,186.82	\$0.00	\$3,056.84	\$0.00	\$706,129.98
TOTALES	\$706,129.98		\$706,129.98		\$709,186.82	\$0.00	\$3,056.84	\$0.00	\$706,129.98

MONTO AUTORIZADO:	\$709,186.82	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$709,186.82	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	EXISTE	
	LICITACIÓN PÚBLICA		X	

NO. DE CONTRATO:	CAPUFE-GTZ-IR-2017300690043	FECHA:	21/11/2017
CONTRATISTA:	JOSE LUIS ESPINO HERNANDEZ		
MONTO CONTRATADO:	\$709,186.00		C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/01/2018	01/01/2018
	TÉRMINO	15/12/2018	30/03/2018
	DÍAS	89	89
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$709,186.00	30/03/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$709,186.00	30/03/2018
FINIQUITO:	\$709,186.00	30/03/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	18/12/2017

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0
REAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0
ACUMULADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:
TERMINADO

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		\$61,136.79	\$70,918.68
AFIANZADORA:		rta, S.A de C.V. Grupo Firta, S.A de C.V. Grupo Fi	
No. DE FIANZA:		8035-00146-9	8035-00147-2
FECHA:		21/11/2017	15/12/2017
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$709,186.82	C/IVA

Arq. ANTONIO RÍOS PÉREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ARQ. ANTONIO RÍOS PÉREZ
SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:	15/10/2018
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: GUTIERREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL "INFRAESTRUCTURA VIAL" EN LA CABECERA MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROYECTOS DE DESARROLLO	No. DE OBRA: 2018300690301	

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO			
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA	CLAVE AGE: N/A	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	X
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI X NO	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:					
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI X NO	DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	X		
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI	NO	X	
LATITUD 20.446698209	LONGITUD -97.092630985						

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
CONCRETO EN BANQUETAS Y GUARNICIONES

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ANTICIPO	\$1,335,150.00	1	\$1,335,150.00	2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,335,150.00
ESTIMACIÓN UNO	\$1,058,912.07	2	\$1,058,912.07	3	\$2,136,240.00	\$1,068,120.00	\$9,207.93	\$0.00	\$1,058,912.07
ESTIMACIÓN DOS	\$264,728.02	3	\$264,728.02	5	\$534,060.00	\$267,030.00	\$2,301.98	\$0.00	\$264,728.02
TOTALES	\$2,658,790.09		\$2,658,790.09		\$2,670,300.00	\$1,335,150.00	\$11,509.91	\$0.00	\$2,658,790.09

MONTO AUTORIZADO:	\$2,670,300.00	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$2,670,300.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	LICITACIÓN PÚBLICA	EXISTE

NO. DE CONTRATO:	GTZ-LR 12-PRODERE/2018 30 069 03	FECHA:	19/06/2018
CONTRATISTA:	MATEO GOMEZ GUERRA		
MONTO CONTRATADO:	\$2,670,300.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRAMADA	REAL
		01/04/2018	25/06/2018
	TÉRMINO	15/12/2018	
	DÍAS	259	60
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$1,335,150.00	PORCENTAJE: 50.00
	FECHA DE PAGO:	19/06/2018	

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$264,728.02	13/08/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$2,670,300.00	13/08/2018
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE	AVANCE FÍSICO REAL											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	10	50	100	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	10	50	100	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	10	50	100	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$1,335,150.00	\$230,198.28	\$267,030.00
AFIANZADORA:	Fianza Dorama, S.A.		
No. DE FIANZA:	1947511	14947513	1034644
FECHA:	19/06/2018	19/06/2017	24/08/2018
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$2,670,300.00	C/IVA	

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
OBRAS
PÚBLICAS

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Alfredo Moreno Neri
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACION:

15/08/2018

MES QUE SE REPORTA

OCTUBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	GUTIERREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE ALBERGUE MUNICIPAL EN COLONIA CUAHUTEMOC, EN CABECERA MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE FORTALECIMIENT	No. DE OBRA:	2018300690302		

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	X	NO						
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:									
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGE:	N/A	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	X
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP. SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI	X	NO						
	SI	X	NO						
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:	DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA						X
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA				PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI	NO		X
LATITUD	20.4630360210349	LONGITUD	-97.0833351052974						

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS PARA ZAPATAS, DADOS Y CADENAS DE DESPLANTE, MUROS, HABILITADO DE ACERO PARA LOSAS Y CONCRETO, ACABADOS Y PINTURA,

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS PARA ZAPATAS, DADOS Y CADENAS DE DESPLANTE, MUROS

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ANTICIPO	\$1,450,000.00	1	\$1,450,000.00	1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450,000.00
ESTIMACION UNO	\$1,161,500.00	2	\$1,161,500.00	2	\$2,343,200.00	\$1,171,600.00	\$10,100.00	\$0.00	\$1,161,500.00
ESTIMACION DOS	\$233,118.80	3	\$233,118.80	5	\$470,291.84	\$235,145.92	\$2,027.12	\$0.00	\$233,118.80
TOTALES	\$2,844,618.80		\$2,844,618.80		\$2,813,491.84	\$1,406,745.92	\$12,127.12	\$0.00	\$2,844,618.80

MONTO AUTORIZADO:	\$2,900,000.00	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$2,900,000.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X		
	licitación pública			

NO. DE CONTRATO:	GTZ-LR 13-FORTAFIN/2018 30 069 03	FECHA:	19/06/2018
CONTRATISTA:	MIGUEL ANGEL LIMA ESCAMILLA		
MONTO CONTRATADO:	\$2,900,000.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	02/04/2018	25/06/2018
	TÉRMINO	15/12/2018	30/10/2018
	DÍAS	90	105
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$1,450,000.00	PORCENTAJE: 50.00
	FECHA DE PAGO:	20/06/2018	

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$233,118.80	11/09/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$2,844,618.80	11/09/2018
FINQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	10	45	85	90	100	0	0
REAL	0	0	0	0	0	10	80	85	90	100	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	10	80	85	90	100	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRAS
PUBLICAS

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:	\$1,450,000.00	\$250,000.00	\$290,000.00	
AFIANZADORA:	Fianzas Monterrey S.A DE CV Fianzas Monterrey S.A DE CV Fianzadora SOFIMEX, S.			
No. DE FIANZA:	1947510	1947512	2256769	
FECHA:	19/06/2018	19/06/2018	18/10/2018	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	PLAZO	X	INICIAL	FINAL
	NO APLICA		24/09/2018	18/10/2018
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$2,900,000.00	C/IVA		

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Alfredo Moreno Neri
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACION:
15/06/2018
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	EL CEPILLO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRILES - EL CEPILLO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES F	No. DE OBRA:	2018300690103		

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI NO

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO

TIPO DE ZONA: RURAL URBANA CLAVE AGE: N/A

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI NO TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA INDIRECTA COMPLEMENTARIA

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI NO PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA
LATITUD 20.4316076500761 LONGITUD -97.1258345620038

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

ESCARIFICADO, CUNETEO, ACARREOS DE MATERIAL DE BANCO, TENDIDO Y MEZCLADO DE MATERIAL, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ANTICIPO	\$675,000.00	1	\$675,000.00	31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,000.00
ESTIMACIÓN UNIC	\$669,181.03	2	\$669,181.03	59	\$1,350,000.00	\$675,000.00	\$5,818.97	\$0.00	\$669,181.03
TOTALES	\$1,344,181.03		\$1,344,181.03		\$1,350,000.00	\$675,000.00	\$5,818.97	\$0.00	\$1,344,181.03

MONTO AUTORIZADO:	\$1,350,000.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$1,350,000.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/> INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS <input checked="" type="checkbox"/> LICITACIÓN PÚBLICA <input type="checkbox"/>	EXISTE <input type="checkbox"/>

NO. DE CONTRATO:	ICO-AR 003-FISM DF/2018 30 069 01(FECHA: 02/03/2018
CONTRATISTA:	ISABEL SALAZAR ESPINOSA
MONTO CONTRATADO:	\$1,350,000.00 C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA REAL
	INICIO 01/02/2018 05/03/2018
	TÉRMINO 15/12/2018 30/03/2018
	DÍAS 25 25
ANTICIPO:	APLICA <input checked="" type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/> MONTO: \$675,000.00 PORCENTAJE: 50.00 FECHA DE PAGO: 13/03/2018

REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$1,350,000.00	09/04/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$1,350,000.00	09/04/2018
FINIQUITO:	\$669,181.03	09/04/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	06/04/2018

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0
REAL	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0
ACUMULADO	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TERMINADO

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRAS
PÚBLICAS

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ING. NORBERTO JUÁREZ MEJÍA
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACION:	16/04/2018
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: SAN ANTONIO CORONADO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRILES - SAN ANTONIO CORONADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA: 2018300690104	

ANTECEDENTES:										
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:			SI	X	NO					
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:										
TIPO DE ZONA:	RURAL	X	CLAVE AGE:	N/A	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	X	MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	URBANA		SI	X	NO					
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO			SI	X	NO					
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:										
DIRECTA			INDIRECTA			COMPLEMENTARIA			X	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA										
LATITUD	20.4412601738537	LONGITUD	-97.1340862415972	PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE			SI	NO	X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRILES - SAN ANTONIO CORONADO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
RASTREO Y CUNETEO, EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE BANCO DE SABANA Y DE RIO, ESCARIFICADO Y ACAMELLONADO, TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO DE SUPERFICIE, COMPACTADO.

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ANTICIPO	\$200,000.00	2	\$200,000.00	28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
STIMACIÓN ÚNICA	\$198,275.86	3	\$198,275.86	57	\$400,000.00	\$200,000.00	\$1,724.14	\$0.00	\$198,275.86
TOTALES	\$398,275.86		\$398,275.86		\$400,000.00	\$200,000.00	\$1,724.14	\$0.00	\$398,275.86

MONTO AUTORIZADO:	\$400,000.00	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$400,000.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE	X	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	CO-AD 004-FISM DF/2018 30 069 01/	FECHA:	02/03/2018
CONTRATISTA:	ISAAEL SALAZAR ESPINOSA		
MONTO CONTRATADO:	\$400,000.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/02/2018	05/03/2018
	TÉRMINO	15/12/2018	30/03/2018
	DÍAS	25	25
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$200,000.00	PORCENTAJE: 50.00
	FECHA DE PAGO:	13/03/2018	

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$198,275.86	09/04/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$400,000.00	09/04/2018
FINIQUITO:	\$198,275.86	09/04/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	06/04/2018

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0
REAL	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0
ACUMULADO	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:
TERMINADO

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRAS
PÚBLICAS

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$200,000.00	\$34,482.76	\$34,482.76
AFIANZADORA:	Irta, S.A de C.V. Grupo FIrta, S.A de C.V. Grupo FIrta, S.A de C.V. Grupo FIrta		
No. DE FIANZA:	3900-02484-0	3900-02485-5	3900-02494-7
FECHA:	02/03/2018	02/03/2018	05/04/2018
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$400,000.00	C/IVA	

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ING. LEONEL RODRIGUEZ RIOS
SUPERVISOR



**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACION:	15/06/2018
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIÉRREZ ZAMORA	LOCALIDAD: RAFAEL VALENZUELA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: RAFAEL VALENZUELA-LOMAS CHICAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA: 2018300690105	

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:					
TIPO DE ZONA:	RURAL X	CLAVE AGE:	N/A	GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
	URBANA			MUY ALTO	ALTO MEDIO BAJO X MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI X NO	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI X NO	DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	X
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI NO X
LATITUD	20.4120989487176	LONGITUD	-97.1405879681418		

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
CONFORMACIÓN, ESCARIFICADO, CUNETEO, ACARREO DE MATERIAL DE BANCO, TENDIDO DE MATERIAL MEZCLADO, NIVELADO Y CONFORMADO, COMPACTADO CON AGUA EN PIPA

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACION	\$235,452.59	003	\$235,452.59	58	\$475,000.00	\$237,500.00	\$2,047.41	\$0.00	\$235,452.59
ANTICIPO	\$237,500.00	2	\$237,500.00	27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,500.00
TOTALES	\$472,952.59		\$472,952.59		\$475,000.00	\$237,500.00	\$2,047.41	\$0.00	\$472,952.59

MONTO AUTORIZADO:	\$475,000.00	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$475,000.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	EXISTE	X
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	CO-AD 005-FISM DF/2018 30 069 011	FECHA:	02/03/2018
CONTRATISTA:	ISABEL SALAZAR ESPINOSA		
MONTO CONTRATADO:	\$475,000.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/02/2018	05/03/2018
	TÉRMINO	15/12/2018	30/03/2018
	DÍAS	25	25
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$237,500.00	PORCENTAJE: 50.00
	FECHA DE PAGO:	13/03/2018	

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$235,452.59	09/04/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$475,000.00	09/04/2018
FINIQUITO:	\$235,452.59	09/04/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	06/04/2018

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0
REAL	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0
ACUMULADO	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:
TERMINADO

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



EL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRAS
PÚBLICAS

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$237,500.00	\$40,948.28	\$47,500.00
AFIANZADORA:	FIRTA, S.A de C.V. Grupo Firta		
No. DE FIANZA:	3900-02486-4	3900-02487-7	3900-02496-3
FECHA:	01/03/2018	01/03/2018	05/04/2018
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO	INICIAL	FINAL
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$475,000.00		C/IVA

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ING. NORBERTO JUÁREZ MEJÍA
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACION:	15/10/2018
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: GUTIERREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 217, COLONIAS FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, LUIS DONALDO COLOSIO Y GUADALUPE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA: 2018300690116	

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO				
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:						
TIPO DE ZONA: RURAL	CLAVE AGEB: 0217	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	X	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	X	NO		TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI	X	NO		DIRECTA	X	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI	NO	X
LATITUD 20.4405334852855	LONGITUD -97.0923051931730							

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS PARA DADOS, CASTILLOS, MUROS, PUERTAS Y VENTANAS, LOSA DE CONCRETO ARMADO, APLANADOS EN MUROS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, PINTURA EN MUROS.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS PARA DADOS, CASTILLOS, MUROS, PUERTAS Y VENTANAS, LOSA DE CONCRETO ARMADO, APLANADOS EN MUROS.

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACIÓN UN	\$1,196,350.36	1	\$1,196,350.36	40	\$1,201,529.36	\$0.00	\$5,179.01	\$0.00	\$1,196,350.36
TOTALES	\$1,196,350.36		\$1,196,350.36		\$1,201,529.36	\$0.00	\$5,179.01	\$0.00	\$1,196,350.36

MONTO AUTORIZADO:	\$2,403,056.70	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$2,403,056.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	EXISTE	X
		LICITACIÓN PÚBLICA		

NO. DE CONTRATO: 1GTZ-LR 29-FISM DF/2018 30 069 011	FECHA: 03/08/2018		
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RUZAMU S.A DE C.V.			
MONTO CONTRATADO: \$2,403,056.70	C/IVA		
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO 01/02/2018	07/08/2018	
	TÉRMINO 15/12/2018		
	DÍAS 318	0	
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:	PORCENTAJE:	
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$1,196,350.36	11/09/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$1,196,350.00	11/09/2018
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	40	80	90	0	100
REAL	0	0	0	0	0	0	0	40	80	90	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	40	80	90	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRAS
PÚBLICAS

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		\$207,160.06	
AFIANZADORA:		Fianzas Dorama S.A.	
No. DE FIANZA:		1008867	
FECHA:		03/08/2018	
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO	INICIAL	FINAL
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	NO APLICA		

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Rodolfo Gutiérrez Lechuga
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:	15/06/2018
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	GUTIERREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE: 30DPR5104U COL. ASOCIACIÓN CIVIL.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2018300690107		

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO					
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:							
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGE:	019A	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	X
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	URBANA	SI	X	NO		TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	X	SI	X	NO		DIRECTA	X	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI	NO	X	
LATITUD	20.4437152	LONGITUD	-97.09677834						

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

DESPLANTE DE ESTRUCTURA, COLUMNAS, ESTRUCTURA PARA TECHADO, BARRA DE COCINA Y MOBILIARIO

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACIÓN UN	\$181,129.24	1	\$181,129.24	182	\$181,913.35	\$0.00	\$784.11	\$0.00	\$181,129.24
ESTIMACIÓN DO	\$167,362.15	2	\$167,362.15	186	\$168,086.66	\$0.00	\$724.51	\$0.00	\$167,362.15
TOTALES	\$348,491.39		\$348,491.39		\$350,000.01	\$0.00	\$1,508.62	\$0.00	\$348,491.39

MONTO AUTORIZADO:	\$350,000.00	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$350,000.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE	X	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	IGTZ-AD 10-FISMDF/2018 30 069 010	FECHA:	13/04/2018
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA DE ALBA EN EL GOLFO S.A DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$350,000.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/02/2018	16/04/2018
	TÉRMINO	15/12/2018	31/05/2018
	DÍAS	70	46
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$167,362.00	31/05/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$350,000.00	31/05/2018
FINIQUITO:	\$167,362.15	31/05/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	22/06/2018

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	25	50	100	100	100	100	100	100	0
REAL	0	0	0	50	100	100	100	100	100	100	100	0
ACUMULADO	0	0	0	50	100	100	100	100	100	100	100	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TERMINADO

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
MAY 2018
OBRAS
MAY 2018

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ARQ. JAIME GUADALUPE CASTILLO
BERNABE
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:
15/06/2018
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	EL COCO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL ENRIQUE RODRIGUEZ CANO CLAVE: 30DPR0616M, LOCALIDAD EL COCO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2018300690108		

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:					
TIPO DE ZONA:	RURAL X URBANA	CLAVE AGE:	N/A	GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI	X	NO	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	
LATITUD	20.4537854477126	LONGITUD	-97.1424357972518	SI	NO
					X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS, HABILITADO DE ESTRUCTURA PARA TECHADO, BARRA PARA COCINA Y MESAS.

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACIÓN UN	\$131,057.27	1	\$131,057.27	180	\$131,624.62	\$0.00	\$567.35	\$0.00	\$131,057.27
ESTIMACIÓN DO	\$117,865.15	2	\$117,865.15	184	\$118,375.39	\$0.00	\$510.24	\$0.00	\$117,865.15
TOTALES	\$248,922.42		\$248,922.42		\$250,000.01	\$0.00	\$1,077.59	\$0.00	\$248,922.42

MONTO AUTORIZADO:	\$250,000.00	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$250,000.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE	X	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	IGTZ-AD 11-FISMDF/2018 30 069 010	FECHA:	13/06/2018
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA DE ALBA EN EL GOLFO S.A DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$250,000.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/02/2018	16/04/2018
	TÉRMINO	15/12/2018	31/05/2018
	DÍAS	70	46
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$117,865.15	31/05/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$250,000.00	31/05/2018
FINIQUITO:	\$17,865.15	31/05/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	21/06/2018

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	25	50	100	100	100	100	100	0	0
REAL	0	0	0	50	100	100	100	100	100	100	0	0
ACUMULADO	0	0	0	50	100	100	100	100	100	100	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TERMINADO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRAS
PÚBLICAS

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:		\$21,551.72	\$25,000.00	
AFIANZADORA:		Fianzas Monterrey S.A DFianzas Monterrey S.A D		
No. DE FIANZA:		1904096	1910279	
FECHA:		13/04/2018	31/05/2018	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	
	PLAZO		INICIAL	FINAL
	NO APLICA			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$250,000.00	C/IVA	

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ARQ. JAIME GUADALUPE CASTILLO
BERNABE
SUPERVISOR

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACION: 18/06/2018
MES QUE SE REPORTA OCTUBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: GUTIERREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 019A, COLONIAS EL PORVENIR, ASOCIACIÓN CIVIL PRIMERO DE MAYO Y AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA: 2018300690114	

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO		ANTECEDENTES:	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA X	CLAVE AGEB: 019A	MUY ALTO	ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO X
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO	SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI X NO	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:	
		DIRECTA X	INDIRECTA COMPLEMENTARIA
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		PROYECTO ESPECIAL: SI NO X	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE: SI NO X
LATITUD: 20.4430718006572	LONGITUD: -97.0958851612790		

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

DESPLANTES DE ESTRUCTURAS, MUROS, ACEROS DE REFUERZO Y CONCRETOS

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACIÓN 3	\$293,339.85	3	\$293,399.85	A67	\$294,609.72	\$0.00	\$1,269.87	\$0.00	\$293,339.85
ESTIMACIÓN 1	\$1,113,719.51	1	\$1,113,719.00	A33	\$1,118,540.81	\$0.00	\$4,821.30	\$0.00	\$1,113,719.51
ESTIMACIÓN 2	\$826,126.10	2	\$826,126.10	A39	\$829,702.40	\$0.00	\$3,576.30	\$0.00	\$826,126.10
TOTALES	\$2,233,185.46		\$2,233,244.95		\$2,242,852.93	\$0.00	\$9,667.47	\$0.00	\$2,233,185.46

MONTO AUTORIZADO:	\$2,242,852.92	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$2,242,852.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	EXISTE X

NO. DE CONTRATO: 1GTZ-LR 10-FISM DF/2018 30 069 011	FECHA: 30/03/2018
CONTRATISTA: GRUPO CARDENA DE VERACRUZ S.A DE C.V.	
MONTO CONTRATADO: \$2,242,852.00	C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA REAL
INICIO	01/02/2018 02/04/2018
TERMINO	15/12/2018 30/07/2018
DÍAS	120 120
ANTICIPO:	APLICA NO APLICA X
MONTO:	PORCENTAJE:
FECHA DE PAGO:	

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$293,339.85	02/10/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$2,242,852.92	02/10/2018
FINIQUITO:	\$253,973.90	02/10/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FISICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	25	50	75	100	100	100	100	0	0
REAL	0	0	0	25	50	75	100	100	100	100	0	0
ACUMULADO	0	0	0	25	50	75	100	100	100	100	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TERMINADA

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRAS
PÚBLICAS

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ING. ALFREDO MORENO NERI
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:	15/06/2018
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: GUTIERREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 202, COLONIAS PRIMERO DE MAYO, AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO Y FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA: 2018300690112	

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:				
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGEB:	0202	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	URBANA X	SI	X	NO
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO
GRADO DE REZAGO SOCIAL:				
	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO
				MUY BAJA X
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:				
	DIRECTA	X	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA				
LATITUD	0.00000000	LONGITUD	0.00000000	
	PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI NO X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, CASTILLOS, MUROS, CONCRETO Y ACABADOS

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ACCIÓN TRES FINI	\$353,779.13	3	\$353,779.13	A68	\$355,310.64	\$0.00	\$1,531.51	\$0.00	\$353,779.13
ESTIMACIÓN UNO	\$1,208,602.63	1	\$1,208,602.63	A33	\$1,213,834.00	\$0.00	\$5,232.05	\$0.00	\$1,208,602.63
ESTIMACIÓN DOS	\$830,316.93	2	\$830,316.93	A38	\$833,911.38	\$0.00	\$3,594.45	\$0.00	\$830,316.93
TOTALES	\$2,392,698.69		\$2,392,698.69		\$2,403,056.02	\$0.00	\$10,358.01	\$0.00	\$2,392,698.69

MONTO AUTORIZADO:	\$2,403,056.70	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$2,403,056.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA			EXISTE
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			X
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	IGTZ-LR 11-FISM DF/2018 30 069 011	FECHA:	30/03/2018
CONTRATISTA:	GRUPO CARDEÑA DE VERACRUZ S.A DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$2,403,056.70		C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/02/2018	02/04/2018
	TÉRMINO	15/12/2018	30/07/2018
	DÍAS	120	120
	APLICA	NO APLICA	X
ANTICIPO:	MONTO:	PORCENTAJE:	
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$353,779.13	02/10/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$2,403,056.70	02/10/2018
FINIQUITO:	\$353,779.13	02/10/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	25	50	75	100	100	100	100	100	0	0
REAL	0	0	25	50	75	100	100	100	100	100	0	0
ACUMULADO	0	0	25	50	75	100	100	100	100	100	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
OBRAS PÚBLICAS

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:		\$207,160.06	\$207,160.00	
AFIANZADORA:		Afianzadora SOFIMEX S.A. Afianzadora SOFIMEX S.A.		
No. DE FIANZA:		2197812	2197934	
FECHA:		30/03/2018	30/07/2018	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	
	PLAZO		INICIAL	FINAL
	NO APLICA			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$2,403,056.00	C/IVA	

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ING. ALFREDO MORENO NERI
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACION:
15/10/2018
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	GUTIÉRREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	GUTIÉRREZ ZAMORA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2018300690110
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 109, COLONIAS DEL CARMEN, MURILLO VIDAL, HERNÁNDEZ OCHOA	

ANTECEDENTES:			
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	X	NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:			
TIPO DE ZONA:	RURAL	URBANA	X
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	X	NO
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI	X	NO
CLAVE AGEB:	0109		
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO
MUY ALTO			MUY BAJO
			X
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			
DIRECTA	X	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA
PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI
			NO
			X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS PARA DADOS, CASTILLOS, MUROS, PUERTAS Y VENTANAS, LOSA DE CONCRETO ARMADO, APLANADOS EN MUROS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, PINTURA EN MUROS.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS PARA DADOS, CASTILLOS, MUROS, PUERTAS Y VENTANAS, LOSA DE CONCRETO ARMADO, APLANADOS EN MUROS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, PINTURA EN MUROS.

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
IM- TRES FINIQU	\$40,181.65	3	\$40,181.65	42	\$40,355.60	\$0.00	\$173.95	\$0.00	\$40,181.65
STIMACIÓN UN	\$216,319.15	1	\$216,319.15	34	\$217,255.60	\$0.00	\$936.45	\$0.00	\$216,319.15
STIMACIÓN DO	\$176,137.50	2	\$176,137.50	39	\$176,900.00	\$0.00	\$762.50	\$0.00	\$176,137.50
TOTALES	\$432,638.30		\$432,638.30		\$434,511.20	\$0.00	\$1,872.90	\$0.00	\$432,638.30

MONTO AUTORIZADO:	\$434,511.20	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$434,511.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	LICITACIÓN PÚBLICA	EXISTE
				X

NO. DE CONTRATO:	IGTZ-AD 13-FISM DF/2018 30 069 01	FECHA:	13/07/2018
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RUZAMU S.A DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$0.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/02/2018	16/07/2018
	TÉRMINO	15/12/2018	13/09/2018
	DÍAS	318	60
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
FECHA DE PAGO:			

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$40,181.65	01/10/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$434,511.20	01/10/2018
FINIQUITO:	\$40,181.65	01/10/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	50	80	100	100	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	50	80	100	100	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	50	80	100	100	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRAS
PÚBLICAS

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Rodolfo Gutierrez Lechuga
SUPERVISOR

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACION:	25/09/2018
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: GUTIERREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 185, COLONIA CUAUHTLAN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA: 2018300690113	

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI <input checked="" type="checkbox"/> X NO <input type="checkbox"/>		ANTECEDENTES:	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
TIPO DE ZONA: RURAL <input type="checkbox"/> URBANA <input checked="" type="checkbox"/>	CLAVE AGE: 0185	MUY ALTO <input type="checkbox"/>	ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BAJO <input type="checkbox"/> MUY BAJO <input checked="" type="checkbox"/> X
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI <input checked="" type="checkbox"/> X NO <input type="checkbox"/>	TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:	DIRECTA <input checked="" type="checkbox"/> X INDIRECTA <input type="checkbox"/> COMPLEMENTARIA <input type="checkbox"/>	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI <input checked="" type="checkbox"/> X NO <input type="checkbox"/>	COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	PROYECTO ESPECIAL: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X
LATITUD: 20.43824841	LONGITUD: -97.09257743		

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS PARA DADOS, CASTILLOS, MUROS, PUERTAS Y VENTANAS, LOSA DE CONCRETO ARMADO, APLANADOS EN MUROS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, PINTURA EN MUROS.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS PARA DADOS, CASTILLOS, MUROS, PUERTAS Y VENTANAS, LOSA DE CONCRETO ARMADO, APLANADOS EN MUROS.

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
STIM-3 FINIQUIT	\$40,181.65	3	\$40,181.65	43	\$40,355.60	\$0.00	\$173.95	\$0.00	\$40,181.65
timación 1 Parc	\$216,319.15	1	\$216,319.15	35	\$217,255.60	\$0.00	\$936.45	\$0.00	\$216,319.15
STIMACIÓN DOS	\$176,137.50	2	\$176,137.50	38	\$176,900.00	\$0.00	\$762.50	\$0.00	\$176,137.50
TOTALES	\$432,638.30		\$432,638.30		\$434,511.20	\$0.00	\$1,872.90	\$0.00	\$432,638.30

MONTO AUTORIZADO:	\$434,511.20	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$434,511.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> X NO APLICA <input type="checkbox"/>	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> X NO APLICA <input type="checkbox"/>	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/> INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS <input type="checkbox"/> LICITACIÓN PÚBLICA <input checked="" type="checkbox"/> X	

NO. DE CONTRATO: IGZ-AD 14-FISM DF/2018 30 069 01	FECHA: 13/07/2018
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RUZAMU S.A DE C.V.	
MONTO CONTRATADO:	\$434,511.20 C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA REAL
INICIO	01/02/2018 16/07/2018
TÉRMINO	15/12/2018 13/09/2018
DÍAS	118 60
ANTICIPO:	APLICA <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/> X
	MONTO: PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$40,181.65	01/10/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$434,511.20	01/10/2018
FINIQUITO:	\$40,181.65	01/10/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	25	80	100	100	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	25	80	100	100	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	25	80	100	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:
Proceso

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRAS
PÚBLICAS

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		\$37,457.86	\$37,457.00
AFIANZADORA:		Fianzas Dorama S.A.	Fianzas Dorama S.A.
No. DE FIANZA:		1008862	10A37973
FECHA:		13/07/2017	13/09/2018
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	PLAZO	INICIAL FINAL	
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$434,511.00		C/IVA

Arq. ANTONIO RÍOS PÉREZ
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Rodolfo Gutiérrez Lechuga
SUPERVISOR

FORMATO 11



**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACION:
15/08/2018
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: LOMAS CHICAS	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD LOMAS CHICAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA: 2018300690124	

ANTECEDENTES:			
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	X	NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:			
TIPO DE ZONA:	RURAL	X	URBANA
CLAVE AGEB:	N/A		
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	X	NO
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI	X	NO
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA			
LATITUD	20.412526577	LONGITUD	-97.142740653
GRADO DE REZAGO SOCIAL:	MUY ALTO	ALTO	MEDIO
		X	BAJO
			MUY BAJO
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			
DIRECTA	X	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA
PROYECTO ESPECIAL	SI	NO	X
CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE			
		SI	NO

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, HABILITADO DE ESTRUCTURAS PARA DADOS CASTILLO Y CADENAS, MUROS, PERFILES EN PUERTAS Y VENTANAS, CONCRETO EN PISOS Y LOSAS, PINTURA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS Y HABILITADO DE CASTILLOS Y CADENAS

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
TIM-DOS FINIQU	\$43,076.54	3	\$43,076.54	18	\$86,902.24	\$43,451.12	\$374.58	\$0.00	\$43,076.54
ANTICIPO	\$304,157.84	1	\$304,157.84	6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,157.84
ESTIMACIÓN 1	\$258,459.25	2	\$258,459.25	13	\$521,413.43	\$260,706.71	\$2,247.47	\$0.00	\$258,459.25
TOTALES	\$605,693.63		\$605,693.63		\$608,315.67	\$304,157.83	\$2,622.05	\$0.00	\$605,693.63

MONTO AUTORIZADO:	\$608,315.68	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$608,315.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	LICITACIÓN PÚBLICA	EXISTE
				X

NO. DE CONTRATO:	IGTZ-LR 14-FISM DF/2018 30 069 012	FECHA:	04/06/2018
CONTRATISTA:	NOE MONTALVO VAZQUEZ		
MONTO CONTRATADO:	\$608,315.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/05/2018	07/06/2018
	TÉRMINO	15/12/2018	04/09/2018
	DÍAS	90	90
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$304,157.84	PORCENTAJE: 50.00
	FECHA DE PAGO:	04/06/2018	

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$43,076.54	18/10/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$608,315.68	18/10/2018
FINIQUITO:	\$43,076.54	18/10/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	30	60	90	100	100	0	0
REAL	0	0	0	0	0	60	80	90	100	100	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	60	80	90	100	100	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

PROCESO

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRAS
PÚBLICAS

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$304,157.84	\$52,441.01	\$52,441.00
AFIANZADORA:	Fianzas Monterrey S.A DE CV	Fianzas Monterrey S.A DE CV	Fianzas Dorama S.A.
No. DE FIANZA:	1925010	1925012	1008891
FECHA:	04/06/2018	04/06/2018	04/09/2018
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO	INICIAL	FINAL
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	NO APLICA		
		\$608,315.00	C/IVA

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Rodolfo Gutiérrez Lechuga
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:	12/11/2018
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIÉRREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	LOMAS DE ARENA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD LOMAS DE ARENA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2018300690125		

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO						
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:										
TIPO DE ZONA:	RURAL X URBANA	CLAVE AGE:	N/A		GRADO DE REZAGO SOCIAL:	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO X	MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP. SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO		TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:				
		SI	X	NO		DIRECTA X	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA		
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA										
LATITUD	20.415117132	LONGITUD	-97.163648840		PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI	NO	X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS PARA DADOS, CASTILLOS, MUROS, PUERTAS Y VENTANAS, LOSA DE CONCRETO ARMADO, APLANADOS EN MUROS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, PINTURA EN MUROS.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS PARA DADOS, CASTILLOS, MUROS, PUERTAS Y VENTANAS, LOSA DE CONCRETO ARMADO, APLANADOS EN MUROS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, PINTURA EN MUROS.

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
IM- DOS FINIQU	\$42,572.68	3	\$42,572.68	17	\$85,885.78	\$42,942.90	\$370.20	\$0.00	\$42,572.68
ESTIMACIÓN UN	\$425,726.93	2	\$425,726.93	15	\$858,857.81	\$429,428.90	\$3,701.97	\$0.00	\$425,726.93
ANTICIPO	\$472,371.80	1	\$472,371.80	7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472,371.80
TOTALES	\$940,671.41		\$940,671.41		\$944,743.59	\$472,371.80	\$4,072.17	\$0.00	\$940,671.41

MONTO AUTORIZADO:	\$944,743.59	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$944,743.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	LICITACIÓN PÚBLICA	EXISTE
				X

NO. DE CONTRATO:	IGTZ-LR 15-FISM DF/2018 30 069 011	FECHA:	04/06/2018
CONTRATISTA:	NOE MONTALVO VAZQUEZ		
MONTO CONTRATADO:	\$944,743.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/05/2018	07/06/2018
	TÉRMINO	15/12/2018	04/09/2018
	DÍAS	0	90
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$42,572.68	02/10/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$944,743.59	02/10/2018
FINIQUITO:	\$42,572.68	02/10/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	30	60	90	100	100	0	0
REAL	0	0	0	0	0	80	90	100	100	100	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	80	90	100	100	100	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
OBRAS PÚBLICAS

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Rodolfo Gutiérrez Lechuga
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACION:
12/11/2018
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD CARRILLO PUERTO SANTA ROSA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA: 2018300690126	

ANTECEDENTES:										
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:			SI	X	NO					
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:										
TIPO DE ZONA:	RURAL	X	CLAVE AGEB:	N/A	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	X	MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	X	NO		TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:					
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI	X	NO		DIRECTA	X	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA		
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA					PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI	NO	X
LATITUD	20.419282218		LONGITUD	-97.175885930						

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS PARA DADOS, CASTILLOS, MUROS, PUERTAS Y VENTANAS, LOSA DE CONCRETO ARMADO, APLANADOS EN MUROS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, PINTURA EN MUROS.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS PARA DADOS, CASTILLOS, MUROS, PUERTAS Y VENTANAS, LOSA DE CONCRETO ARMADO, APLANADOS EN MUROS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, PINTURA EN MUROS.

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIM 2	\$42,572.68	3	\$42,572.68	16	\$85,885.78	\$42,942.90	\$11,846.31	\$0.00	\$42,572.68
ESTIM 1	\$425,726.93	2	\$425,726.93	15	\$858,857.81	\$429,428.90	\$3,701.97	\$0.00	\$425,726.93
ANTICIPO	\$472,371.80	1	\$472,371.80	8	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472,371.80
TOTALES	\$940,671.41		\$940,671.41		\$944,743.59	\$472,371.80	\$15,548.28	\$0.00	\$940,671.41

MONTO AUTORIZADO:	\$944,743.59	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$944,743.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	LICITACIÓN PÚBLICA	EXISTE
				X

NO. DE CONTRATO:	IGTZ-LR 16-FISM DF/2018 30 069 011	FECHA:	04/06/2018
CONTRATISTA:	NOE MONTALVO VAZQUEZ		
MONTO CONTRATADO:	\$944,743.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/05/2018	07/06/2018
	TÉRMINO	15/12/2018	04/09/2018
	DÍAS	0	90
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$472,371.80	PORCENTAJE: 50.00
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$42,572.68	02/10/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$944,743.59	02/10/2018
FINIQUITO:	\$42,572.68	02/10/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	30	60	80	100	100	0	0
REAL	0	0	0	0	0	80	90	100	100	100	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	80	90	100	100	100	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$472,371.80	\$81,443.41	\$81,443.00
AFIANZADORA:	UZ & LÓPEZ FIANZAS S.A.UZ & LÓPEZ FIANZAS S.A.UZ & LÓPEZ FIANZAS S.A		
No. DE FIANZA:	10340	10344	10498
FECHA:	04/06/2018	04/06/2018	04/09/2018
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO	INICIAL	FINAL
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$944,743.00	C/IVA	

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Rodolfo Gutierrez Lechuga
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACION: 12/11/2018
MES QUE SE REPORTA OCTUBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: RAFAEL VALENZUELA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL VALENZUELA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES	NO. DE OBRA: 2018300690127	

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI <input checked="" type="checkbox"/> X NO <input type="checkbox"/>		ANTECEDENTES:	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
TIPO DE ZONA: RURAL <input checked="" type="checkbox"/> URBANA	CLAVE AGEB: N/A	MUY ALTO	ALTO MEDIO BAJO <input checked="" type="checkbox"/> MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI <input checked="" type="checkbox"/> X NO <input type="checkbox"/>	SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI <input checked="" type="checkbox"/> X NO <input type="checkbox"/>	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		DIRECTA <input checked="" type="checkbox"/> X	INDIRECTA COMPLEMENTARIA
LATITUD: 20.407939645	LONGITUD: -97.130419037	PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA: EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS PARA DADOS, CASTILLOS, MUROS, PUERTAS Y VENTANAS, LOSA DE CONCRETO ARMADO, APLANADOS EN MUROS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, PINTURA EN MUROS.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES: EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS PARA DADOS, CASTILLOS, MUROS, PUERTAS Y VENTANAS, LOSA DE CONCRETO ARMADO, APLANADOS EN MUROS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, PINTURA EN MUROS.

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
IM TRES FINIQU	\$335,972.04	3	\$335,972.04	17	\$337,426.46	\$0.00	\$1,454.42	\$0.00	\$335,972.04
ESTIM DOS	\$780,620.69	2	\$780,620.69	15	\$784,000.00	\$0.00	\$3,379.31	\$0.00	\$780,620.69
ESTIM UNO	\$1,116,592.73	1	\$1,116,592.73	6	\$1,121,426.46	\$0.00	\$4,833.73	\$0.00	\$1,116,592.73
TOTALES	\$2,233,185.46		\$2,233,185.46		\$2,242,852.92	\$0.00	\$9,667.46	\$0.00	\$2,233,185.46

MONTO AUTORIZADO:	\$2,242,852.92	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$2,242,852.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/> INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS <input checked="" type="checkbox"/> LICITACIÓN PÚBLICA <input type="checkbox"/>	EXISTE <input type="checkbox"/>

NO. DE CONTRATO: IGTZ-LR 21-FISM DF/2018 30 069 011	FECHA: 02/07/2018
CONTRATISTA: PRODUCCIÓN GESTIÓN Y COMERCIO S.A DE C.V.	
MONTO CONTRATADO: \$2,242,852.00	C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	
PROGRAMADA	REAL
INICIO: 04/07/2018	04/07/2018
TÉRMINO: 15/12/2018	04/09/2018
DÍAS: 0	63
ANTICIPO:	
APLICA <input type="checkbox"/>	NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>
MONTO:	PORCENTAJE:
FECHA DE PAGO:	

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$335,972.04	11/10/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$2,242,852.92	11/10/2018
FINIQUITO:	\$335,972.04	11/10/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	30	60	100	100	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	50	85	100	100	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	85	100	10	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRAS
PÚBLICAS

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		\$193,349.39	
AFIANZADORA:		FIANZAS DORAMA	FIANZAS DORAMA
No. DE FIANZA:		18A37965	18A37988
FECHA:		04/07/2018	04/09/2018
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$2,242,852.00	C/IVA

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Rodolfo Gutiérrez Lechuga
SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACION:
12/11/2018
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: NACIO M. ALTAMIRANO (PLAN DE ALTAMIRANO)	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES F	No. DE OBRA: 2018300690128	

ANTECEDENTES:										
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:					GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
SI	X	NO			MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	X	MUY BAJO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:					TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:					
TIPO DE ZONA:	RURAL	X	URBANA		CLAVE AGE:	N/A				
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:					SI	X	NO			
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO					SI	X	NO			
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA					TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:					
LATITUD	20.386426076	LONGITUD	-97.133076261		DIRECTA	X	INDIRECTA		COMPLEMENTARIA	
PROYECTO ESPECIAL					SI		NO		X	

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS PARA DADOS, CASTILLOS, MUROS, PUERTAS Y VENTANAS, LOSA DE CONCRETO ARMADO, APLANADOS EN MUROS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, PINTURA EN MUROS.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS PARA DADOS, CASTILLOS, MUROS, PUERTAS Y VENTANAS, LOSA DE CONCRETO ARMADO, APLANADOS EN MUROS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, PINTURA EN MUROS.

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	FACTURAS		
		No.	MONTO				5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
IM - DOS FINIQU	\$1,116,592.72	2	\$1,116,592.72	16	\$1,121,426.46	\$0.00	\$4,833.73	\$0.00	\$1,116,592.72
ESTIM - UNO	\$1,116,592.73	1	\$1,116,592.73	7	\$1,121,426.46	\$0.00	\$4,833.73	\$0.00	\$1,116,592.73
TOTALES	\$2,233,185.45		\$2,233,185.45		\$2,242,852.92	\$0.00	\$9,667.46	\$0.00	\$2,233,185.45

MONTO AUTORIZADO:	\$2,242,852.92	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$2,242,852.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		X	
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	IGTZ-LR 22-FISM DF/2018 30 069 012	FECHA:	02/07/2018
CONTRATISTA:	PRODUCCIÓN GESTIÓN Y COMERCIO S.A DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$2,242,852.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRAMADA	REAL
		04/07/2018	04/07/2018
	TÉRMINO	15/12/2018	04/09/2018
	DÍAS	0	63
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$1,116,592.72	01/10/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$2,242,852.92	01/10/2018
FINIQUITO:	\$1,116,592.00	01/10/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	50	95	100	100	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	50	95	100	100	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	50	95	100	100	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRAS
PÚBLICAS

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Rodolfo Gutiérrez Lechuga
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACION:
15/08/2018
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: ARROYO GRANDE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: ARROYO GRANDE - LA GALEANA DEL KM 0+000 AL KM 2+000
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CAMINOS Y PUENTES FEDER	No. DE OBRA: 2018300690402	

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	X	NO						
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:									
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGEB:	N/A	GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI	X	NO	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	X	BAJO	MUY BAJO
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:									
				DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	X		
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA									
LATITUD	20.482303302	LONGITUD	-97.108957268	PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI	NO	X	

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

CUNETEO, ESCARIFICADO, NIVELADO-CONFORMADO DE SUPERFICIE, ACARREOS DE MATERIALES DE BANCO, MEZCLADO Y TENDIDO DE MATERIALES DE REVESTIMIENTO, NIVELADO Y COMPACTADO EN CAPAS CON AGUA EN PIPA

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

CUNETEO, ESCARIFICADO, NIVELADO-CONFORMADO DE SUPERFICIE, ACARREOS DE MATERIALES DE BANCO, MEZCLADO Y TENDIDO DE MATERIALES DE REVESTIMIENTO, NIVELADO Y COMPACTADO EN CAPAS CON AGUA EN PIPA

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
TIM DOS FINIQU	\$591,439.66	2	\$591,439.66	140	\$594,000.00	\$0.00	\$2,560.34	\$0.00	\$591,439.66
ESTIM 1	\$1,399,939.66	1	\$1,399,939.66	105	\$1,406,000.00	\$0.00	\$6,060.34	\$0.00	\$1,399,939.66
TOTALES	\$1,991,379.32		\$1,991,379.32		\$2,000,000.00	\$0.00	\$8,620.68	\$0.00	\$1,991,379.32

MONTO AUTORIZADO:	\$2,000,000.00	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$2,000,000.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	licitación PÚBLICA	EXISTE
				X

NO. DE CONTRATO:	IGTZ-LR 18-CAPUFE/2018 30 069 040	FECHA:	25/07/2018
CONTRATISTA:	ISAIEL SALAZAR ESPINOSA		
MONTO CONTRATADO:	\$2,000,000.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/06/2018	30/07/2018
	TÉRMINO	15/12/2018	12/09/2018
	DÍAS	45	45
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:		\$172,413.79	\$172,413.00	
AFIANZADORA:		FIRTA, S.A de C.V. Grupo Firta, S.A de C.V. Grupo Firta		
No. DE FIANZA:		3900-02633-0	3900-02745-0	
FECHA:		25/07/2018	12/09/2018	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	PLAZO		INICIAL	FINAL
	NO APLICA			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$2,000,000.00	C/IVA	

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$591,439.66	10/10/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$2,000,000.00	10/10/2018
FINIQUITO:	\$591,439.66	10/10/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	15	80	100	100	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	25	80	100	100	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	25	80	100	100	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

Proceso



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
OBRAS
PÚBLICAS

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Alfredo Moreno Neri
SUPERVISOR

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:
12/11/2018
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	GUTIERREZ ZAMORA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	CAMINOS Y PUENTES FEDER	No. DE OBRA:	2018300690403
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE "B" ENTRE CALLE 2 Y LIMITE DE COLONIA FIDEL HERRERA, EN COLONIA ASOCIACIÓN CIVIL	

ANTECEDENTES:										
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO						
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:					GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGE:	N/A	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	X	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI	X	NO		TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:				
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO		DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	X	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA					PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI	NO	X	
LATITUD	20.443823152	LONGITUD	-97.095953342							

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
AFINE, COMPACTACIÓN, CONCRETO FIRME, GUARNICIONES Y BANQUETAS.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
AFINE, COMPACTACIÓN, CONCRETO FIRME, GUARNICIONES Y BANQUETAS.

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACIÓN DO	\$159,310.34	2	\$159,310.34	A70	\$160,000.00	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$159,310.34
ESTIMACIÓN UN	\$637,241.38	1	\$637,241.38	A69	\$640,000.00	\$0.00	\$88,275.86	\$0.00	\$637,241.38
TOTALES	\$796,551.72		\$796,551.72		\$800,000.00	\$0.00	\$88,965.52	\$0.00	\$796,551.72

MONTO AUTORIZADO:	\$800,000.00	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$800,000.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X		
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	IGTZ-LR 19-CAPUFE/2018 30 069 04	FECHA:	27/07/2018
CONTRATISTA:	GRUPO CARDEÑA DE VERACRUZ S.A DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$800,000.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/06/2018	01/08/2018
	TÉRMINO	15/12/2018	30/08/2018
	DÍAS	0	30
ANTICIPO:	APLICA MONTO:	NO APLICA	X
	FECHA DE PAGO:		PORCENTAJE:

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$159,310.34	10/10/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$800,000.00	10/10/2018
FINIQUITO:	\$159,310.34	10/10/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		\$68,965.52	\$80,000.00
AFIANZADORA:	Afianzadora SOFIMEX S.A. Afianzadora SOFIMEX S.A.		
No. DE FIANZA:	2230086	2263772	
FECHA:	01/08/2018	30/08/2018	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$800,000.00	C/IVA	

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Leonel Rodríguez Ríos
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACION:

14/09/2018

MES QUE SE REPORTA

OCTUBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	EJIDO SOTO Y GAMA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACION CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN CALLES: NINOS HEROES, EMILIANO ZAPATA, GENERAL LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO DEL EJIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	CAMINOS Y PUENTES FEDER	No. DE OBRA:	2018300690409		

ANTECEDENTES:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI X NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	
TIPO DE ZONA:	RURAL URBANA
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI X NO
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI X NO
CLAVE AGE:	N/A
GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
MUY ALTO	ALTO MEDIO X BAJO MUY BAJO
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:	
DIRECTA	INDIRECTA COMPLEMENTARIA X
PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	
LATITUD	20.4240233855551
LONGITUD	-97.0520995202649

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
RASTREO Y CUNETEO DE CALLES, REVESTIMIENTO EN CALLES, ACARREOS DE MATERIALES, MEZCLADO TENDIDO, NIVELACIÓN, COMPACTADO CON AGUA EN PIPA.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
RASTREO Y CUNETEO DE CALLES, REVESTIMIENTO EN CALLES, ACARREOS DE MATERIALES, MEZCLADO TENDIDO, NIVELACIÓN, COMPACTADO CON AGUA EN PIPA.

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
MACIÓN 1 FINIQ	\$398,275.86	1	\$398,275.86	191	\$400,000.00	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00	\$398,275.86
TOTALES	\$398,275.86		\$398,275.86		\$400,000.00	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00	\$398,275.86

MONTO AUTORIZADO:	\$400,000.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$400,000.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	EXISTE X

NO. DE CONTRATO:	IGTZ-AD 12-CAPUFE/2018 30 069 04(FECHA:	20/07/2018
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA DE ALBA EN EL GOLFO S.A DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$400,000.00		C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/06/2018	24/07/2018
	TÉRMINO	15/12/2018	09/08/2018
	DÍAS	198	17
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$398,275.00	09/08/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$400,000.00	09/08/2018
FINIQUITO:	\$398,275.00	09/08/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	13/08/2018

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	25	100	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	50	100	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	50	100	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:
TERMINADO

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRAS
PÚBLICAS

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		\$34,482.76	\$40,000.00
AFIANZADORA:		Fianzas Monterrey S.A DE Fianzas Monterrey S.A DE	
No. DE FIANZA:		1933577	1934915
FECHA:		20/07/2018	09/08/2018
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO FECHA
	PLAZO		INICIAL FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$400,000.00	C/IVA

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Leonel Rodríguez Ríos
SUPERVISOR



**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACION:	14/09/2018
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: RAFAEL VALENZUELA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN CALLES AVENIDA MORELOS, AVENIDA HIDALGO, EMILIANO ZAPATA, JUVENTINO ROSAS DE LOCALIDAD RAFAEL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CAMINOS Y PUENTES FEDER	No. DE OBRA: 2018300690410	

ANTECEDENTES:									
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO			GRADO DE REZAGO SOCIAL:						
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:			MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	X	MUY BAJO	
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA	CLAVE AGEB: N/A		TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:						
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO	SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI X NO		DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	X			
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA			PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI NO	X			
LATITUD 20.406491657	LONGITUD -97.128648779								

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
RASTREO Y CUNETEO, ACARREO DE MATERIALES DE BANCO, TENDIDO MEZCLADO Y ACAMELLONADO, COMPACTADO CON APLICACIÓN DE AGUA EN PIPA PARA COMPACTADO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
RASTREO Y CUNETEO, ACARREO DE MATERIALES DE BANCO, TENDIDO MEZCLADO Y ACAMELLONADO, COMPACTADO CON APLICACIÓN DE AGUA EN PIPA PARA COMPACTADO

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
STIM 1 FINIQUIT	\$1,692,672.41	1	\$1,692,672.41	190	\$1,700,000.00	\$0.00	\$7,327.59	\$0.00	\$1,692,672.41
TOTALES	\$1,692,672.41		\$1,692,672.41		\$1,700,000.00	\$0.00	\$7,327.59	\$0.00	\$1,692,672.41

MONTO AUTORIZADO:	\$1,700,000.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$1,700,000.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
LA FACTIBILIDAD QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		EXISTE
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	X

NO. DE CONTRATO: MGTZ-LR 20-CAPUFE/2018 30 069 041	FECHA: 27/07/2018
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DE ALBA EN EL GOLFO S.A DE C.V.	
MONTO CONTRATADO: \$1,700,000.00	C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA REAL
INICIO	01/06/2018 01/08/2018
TÉRMINO	15/12/2018 30/08/2018
DÍAS	198 30
ANTICIPO:	APLICA NO APLICA X
	MONTO: PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$1,692,672.41	09/08/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$1,700,000.00	09/08/2018
FINIQUITO:	\$1,692,672.00	09/08/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	15/08/2018

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	100	1000	100	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:
TERMINADO

TIPO DE FIANZA: ANTICIPO	CUMPLIMIENTO: \$146,551.72	VICIOS OCULTOS: \$170,000.00
MONTO AFIANZADO:	Fianzas Monterrey S.A DFianzas Monterrey S.A D	
AFIANZADORA:	1928271	1933802
No. DE FIANZA:	27/07/2018	23/08/2018
FECHA:	EXISTE IMPORTE/PERIODO	FECHA
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO PLAZO	INICIAL FINAL
	NO APLICA	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$1,700,000.00	C/IVA

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



Arq. ANTONIO RÍOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Norberto Juárez Mejía
SUPERVISOR

FORMATO 11



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/42728

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/11/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/11/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	OCTUBRE
Fuente de financiamiento:	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

B7GJCy3lreQzVAhU30JHCae51lezuoyR3Wu7QW34H7eUfEDypP3ZqpcBQDZlpg+OMo69Ximw1kTrbeAgl+MwzT4HP5/0oTzglFm1Gh5lZ3MwGXwteKQiom1zVAWDo41VeFnVpjU2ezvXwbjKpjnVKp6ghCHwymV6ruG/0CrZ3Y=



EL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
**OBRAS
PUBLICAS**

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/41940

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/11/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/11/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	OCTUBRE
Fuente de financiamiento:	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 2017
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

D9iOyEVS97+UvsHsEjh5DPEu3VezLPwyIMxnHS7pfuNFOamtNgEBPu4Vp7p1Ww+0lldhADJChvgioTpxw
VVk5h86dvlK3JppLc/
XMcmi1nHfoz2tFUtdD4fzlxW1UffeYWuawA+MSBJ0gQeb8o8xjWadWJd6OHlKoVaKtrR5HPg=



“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/42252

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/11/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/11/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	OCTUBRE
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

LRzC8v+Dt8iuV5WpoiPPf+2XBfMlrU4k9moKa6U8jiaOvYy3FFWcTe4SxAs1Cyw1hsf9dM5q4ckEV9c53eon
v4NxtJZII5RW90uWqxMbb+UTKISBKVIW8iKpDjKUUO2Gcekaduz60tcHYGgcMD8cnFI9/
3+LQ3ggcnEvazqj+hmc=



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
**OBRAS
PUBLICAS**

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/42715

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
PRESENTE.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/11/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/11/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	OCTUBRE
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

gjuYbh+VH5Ct/
S6e6APUIY7ApAzYqVk9+96yKwg+LwVXblM6E74zWQtbLUoe859mBOnORjL8gGNWSVcajNKepY+2kpH
xprSEOQInenB+XmB2LUQTCBc/
wJ63BHcXF9F+DMVKuDqS0ilCwbFEqLDCcfm+I3hTpFBdoXzBmX1UT3A=



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
**OBRAS
PÚBLICAS**

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/41937

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
PRESENTE.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/11/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/11/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	OCTUBRE
Fuente de financiamiento:	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

KHXZBNht+ZCEOpRoVo8g4cqZr7Fpp9dDsFOyEIUckAN9WpMAK97yhX1XoG5PY4ArQQSznI4ECfM6i9cY
P/dnBqZha8jK1g81kHKtcECbyZTfZZsXl18G5Lni24qjTqGSFKZeDEFgHZ/
ltwi5wVrwhhmYLya9nIKVOQhZFBab5jw=



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
**OBRAS
PÚBLICAS**

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/41939

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/11/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/11/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	OCTUBRE
Fuente de financiamiento:	INTERESES FISMDF 2017
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

vKccR1t3fsYSPpaSs8XbRFedP7B6wcoHCZZArjQ1HG/Zeq8tkRwaWJqX24RVGb/
XpUgtEu9teejRx8JrH2wNs9YM9q27VZzA2bQkAs39WO9l6ytk1Ebl1ai6mBc8zGP21gRichz6CHa1mP2dV
X+jze4iAVuwbKvjJ4ijNEjHyU=



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
**OBRAS
PUBLICAS**

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/41938

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/11/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/11/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	OCTUBRE
Fuente de financiamiento:	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

hst0cjNtAmv9PB9C/PlpJNspT2BtYObiRzx6mVosv8dOwZsjqETGRFfDjmyipLW3RYvwhySjZTwKC0E739Jx/RlqkY7vvAK1iZQ5iFvnToPPH24L9LOfHYsmdt9LUjIhLzsSYisBiHKRXd23QnUFlvakxGIZgVZ6sBfCNQSiebU
=



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
**OBRAS
PUBLICAS**

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."

C.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUTIÉRREZ ZAMORA
PRESENTE

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACION

INFORMACION RECEPCIONADA: INFORMACION DE OBRA PUBLICA

PERIODO: OCTUBRE

FECHA DE RECEPCION: 25/11/2018

FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA: 25/11/2018

INFORME ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO		COMENTARIOS MUNICIPIOS	RECEPCION	
	PDF	EXCEL		FECHA	HORA
OFICIO DE REMISIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA	✓		OFICIO 629-REPORTE MES OCTUBRE 2018	25/11/2018	17:26:22
ACTA DE SESIÓN DE CABILDO DE AUTORIZACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA	✓		ACTA 62 ESTADOS DE OBRA MES OCTUBRE	25/11/2018	17:27:11
RELACIÓN Y TOTAL DE OBRAS	✓		LISTADO DE OBRAS MES DE OCTUBRE 2018	25/11/2018	17:33:15
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (FORMATO 9)	✓		FORMATO REPORTE FOTOGRÁFICO-OCTUBRE 2018	25/11/2018	17:34:49
ESTADO MENSUAL DE OBRA POR CONTRATO (FORMATO 11)	✓		REPORTE FORMATO DE DE CONTRATOS-OCTUBRE 2018	25/11/2018	17:37:06
ESTADO MENSUAL DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (FORMATO 12)	✓		REPORTE FORMA POR ADMON DIRECTA-OCTUBRE 2018	25/11/2018	17:40:43

El presente documento se emite en el caso de Estados Financieros y Estados de Obra Pública mensuales de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para las demás se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. No exime de solicitudes, se reciben documentos con reserva de Ley, este recibo no implica validación de la información.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

2018-2021
**OBRAS
PÚBLICAS**

REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES MUNICIPALES 2018

AYUNTAMIENTO:	Gutiérrez Zamora	No.	069
---------------	------------------	-----	-----

DOCUMENTO	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ESTADOS FINANCIEROS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REPORTES DE OBRA PUBLICA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
CORTE DE CAJA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REPORTE DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REPORTE DE RECAUDACIÓN DE TRASLACIÓN DE DOMINIO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REPORTE DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AGUA												

DOCUMENTO	ESTATUS
PRESUPUESTO BASE DEL PGI YO MODIFICACIÓN MODALIDAD POR CONTRATO PARA ACLARACIÓN YO SOLVENTACIÓN	
PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MODALIDAD POR CONTRATO PARA ACLARACIÓN YO SOLVENTACIÓN	
AUTORIZACIÓN DEL CONGRESO CUANDO SE CELEBREN CONVENIOS CON PERSONAS FÍSICAS O MORALES CUANDO SE CONTRATEN OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS POR UN PLAZO MAYOR AL PERÍODO DEL AYUNTAMIENTO Y CUANDO REBASAN EL 20 DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA RESPECTIVA	
PROYECTO EJECUTIVO INCLUYENDO VALIDACIONES QUE SE REQUIEREN - AL EJECUTAR LA OBRA - MODALIDAD POR CONTRATO (PARA ACLARACIÓN Y/O SOLVENTACIÓN)	
CUENTA PÚBLICA	✓
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	✓
ACTA DE CABILDO DONDE SE PRÓRROGA EL DESCUENTO DEL IMPUESTO PREDIAL	✓
PADRONES DE INGRESOS SUJETOS A PAGOS PERIÓDICOS - PREDIAL	✓
PADRONES DE INGRESOS SUJETOS A PAGOS PERIÓDICOS - AGUA	
PADRONES DE INGRESOS SUJETOS A PAGOS PERIÓDICOS - LIMPIA PÚBLICA	✓
PADRONES DE INGRESOS SUJETOS A PAGOS PERIÓDICOS - COMERCIO	✓
PADRONES DE INGRESOS SUJETOS A PAGOS PERIÓDICOS - MERCADO	
PADRONES DE INGRESOS SUJETOS A PAGOS PERIÓDICOS - BARES Y CANTINAS	✓
FIANZAS PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LAS RESPONSABILIDADES EN QUE PUDIERA INCURRIR	✓
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	✓
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	✓
EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION - ACTA CIRCUNSTANCIADA	✓
EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION - ACTA DE INTEGRACION DE LA COMISION DE LA ENTREGA-RECEPCION	✓
EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION - DICTAMEN	✓
EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION - NOTIFICACION	✓
EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION - ACTA DE ACUERDO EN VIA DE OPINION	✓



ACTA DE INSTALACION	✓
DESIGNACION DE COMISIONES	✓
NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	✓
NOMBRAMIENTO DEL TESORERO	✓
NOMBRAMIENTO DE TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO	✓
NOMBRAMIENTO DE COMANDANTE DE LA POLICIA	✓
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	✓
MODIFICACION PRESUPUESTARIA	✓
MODIFICACION A LA PLANTILLA DE PERSONAL	✓
NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO_CAMBIO	
NOMBRAMIENTO DEL TESORERO_CAMBIO	
NOMBRAMIENTO DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO_CAMBIO	
NOMBRAMIENTO DEL COMANDANTE DE LA POLICIA_CAMBIO	
PROPUESTA DE INVERSIÓN (FORMATO 01)	✓
MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (FORMATO 02)	✓
REPORTE TRIMESTRAL (FORMATO 03) PRIMER TRIMESTRE	✓
REPORTE TRIMESTRAL (FORMATO 03) SEGUNDO TRIMESTRE	✓
REPORTE TRIMESTRAL (FORMATO 03) TERCER TRIMESTRE	✓
CIERRE DE OBRA Y ACCIONES DEL EJERCICIO (FORMATO 04)	
COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL - AL EJECUTAR LA OBRA - MODALIDAD POR CONTRATO (PARA ACLARACIÓN Y/O SOLVENTACIÓN)	
CUADRO FRÍO DE ADJUDICACIÓN DE OBRA - AL EJECUTAR LA OBRA - MODALIDAD POR CONTRATO (PARA ACLARACIÓN Y/O SOLVENTACIÓN)	
PRUEBAS DE LABORATORIO (CUANDO LA OBRA LO REQUIERA) - AL EJECUTAR LA OBRA - MODALIDAD POR CONTRATO (PARA ACLARACIÓN Y/O SOLVENTACIÓN)	
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO - AL FINALIZAR LA OBRA - MODALIDAD POR CONTRATO (PARA ACLARACIÓN Y/O SOLVENTACIÓN)	
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL AYUNTAMIENTO AL COMITÉ DE OBRA O COMUNIDAD - AL FINALIZAR LA OBRA - MODALIDAD POR CONTRATO (PARA ACLARACIÓN Y/O SOLVENTACIÓN)	
PRESUPUESTO BASE, DEL PGI Y/O MODIFICACIÓN - MODALIDAD POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (PARA ACLARACIÓN Y/O SOLVENTACIÓN)	
PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS - MODALIDAD POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (PARA ACLARACIÓN Y/O SOLVENTACIÓN)	
PROYECTO EJECUTIVO INCLUYENDO VALIDACIONES QUE SE REQUIERAN - AL EJECUTAR LA OBRA - MODALIDAD POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (PARA ACLARACIÓN Y/O SOLVENTACIÓN)	
COMPROBACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL AYUNTAMIENTO - AL EJECUTAR LA OBRA - MODALIDAD POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (PARA ACLARACIÓN Y/O SOLVENTACIÓN)	
RELACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y OBREROS DEL AYUNTAMIENTO - AL EJECUTAR LA OBRA - MODALIDAD ADMINISTRACIÓN DIRECTA (PARA ACLARACIÓN Y/O SOLVENTACIÓN)	
COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL - AL EJECUTAR LA OBRA - MODALIDAD POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (PARA ACLARACIÓN Y/O SOLVENTACIÓN)	
PROCESO DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE MATERIALES - AL EJECUTAR LA OBRA - MODALIDAD POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (PARA ACLARACIÓN Y/O SOLVENTACIÓN)	
PRUEBAS DE LABORATORIO (CUANDO LA OBRA LO REQUIERA) - AL EJECUTAR LA OBRA - MODALIDAD POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (PARA ACLARACIÓN Y/O SOLVENTACIÓN)	
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL AYUNTAMIENTO A LA COMUNIDAD - AL FINALIZAR LA OBRA - MODALIDAD POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (PARA ACLARACIÓN Y/O SOLVENTACIÓN)	



DICTAMEN DE PROCEDENCIA DONDE SE DEMUESTRE QUE NO ES POSIBLE O CONVENIENTE SU ADQUISICIÓN - ARRENDAMIENTO DE BIENES (PARA ACLARACIÓN Y/O SOLVENTACIÓN)	
MODIFICACIÓN EN LA DESIGNACIÓN DE COMISIONES	
PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	
RESUMEN POR CAPÍTULO DE LA CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	
CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO	
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	
OFICIO DE REMISIÓN PROYECTO DE LEY DE INGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PLANTILLA DE PERSONAL	
ACTA DE SESIÓN DE CABILDO PROYECTO DE LEY DE INGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PLANTILLA DE PERSONAL	
PROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS	
CALENDARIO DE INGRESOS BASE MENSUAL	
CONCENTRADO ESTADÍSTICO DE INGRESOS ARMONIZADO	
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	
PRIORIDADES DE GASTO	
PROGRAMAS Y PROYECTOS	
ANALÍTICO DE DIETAS PLAZAS Y PUESTOS	
PLANTILLA DE PERSONAL	
PROYECTO LEY DE INGRESOS CRI REFORMADO 2019	
PROYECCIÓN DE INGRESOS 2019	
PROYECCIÓN DE EGRESOS 2019	
RESULTADOS DE INGRESOS 2019	
RESULTADOS DE EGRESOS 2019	



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
 2018 - 2021
**OBRAS
 PÚBLICAS**
