

INFORME:

***ÁREA DE COORDINACIÓN
DE SUPERVISIÓN.***

MES: ENERO

AÑO: 2020

“3era. ETAPA DE SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE.”

Empresa Ganadora: PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.

**Contrato No. SAPSAM-LPE-OB-022-2019.
Monto Contratado \$ \$9,442,794.70. INCLUYE IVA**

PLAZO DE EJECUCIÓN: 406 DÍAS NATURALES		
FECHAS	INICIO	TERMINACIÓN
PROGRAMADA:	22-oct-19	30-nov-20

Avance Físico: 40.00% (Adquisición de Suministros y Piezas Especiales)

Avance Financiero: 45.45% (Pago del Anticipo y Estimación N° 1 Y 2)



“Construcción de redes de agua potable y alcantarillado sanitario en la Avenida las Torres (tramo Justos Sierra-Fray Bartolomé de las Casas).”

Empresa Ganadora: ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YÁÑEZ.

Contrato No. SAPSAM-IR-OB-023-2019

Contrato Monto Contratado \$ 2,500,595.02 INCLUYE IVA.

Monto Ejecutado: \$ 2'706,363.89 INCLUYE IVA

Avance Físico: AGUA POTABLE 100.00 %

DRENAJE SANITARIO: 100.00%

Avance Financiero: 100.00% (INCLUYE CONVENIO EN TIEMPO Y MONTO A LA ALZA)

PLAZO DE EJECUCIÓN: 62 DÍAS NATURALES		
FECHAS	INICIO	TERMINACIÓN
PROGRAMADA:	28-oct-19	28-dic-19
REAL:	28-oct-19	10-ene-20

AGUA POTABLE:

1353.15 ml de tubo PVC hidráulico- RD/26 de 50mm, preparaciones de 129.00 tomas domiciliarias para agua potable y construcción de 2 Caja para operación de válvulas.

DRENAJE SANITARIO:

1,470.20 ml de tubo PVC sanitario serie 20 de 10" de diámetro, construcción de 127.00 preparaciones de descargas sanitarias y construcción de 27 pozos de visita.



“ESTUDIO PARA IDENTIFICACIÓN DE PERDIDAS FÍSICAS Y MEDICIÓN EN EL ACUEDUCTO CEDRAL-MATEHUALA.”

Empresa Ganadora: JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ

Contrato: SAPSAM-AD-SROB-025-2019

Contrato Monto Contratado \$ 224,740.35, INCLUYE IVA.

Avance Físico: 95%

Avance Financiero: 0.00% (No Aplica pago de anticipo)

A la fecha no se ha entregado ninguna información y no se ha realizado ningún trámite de pago.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 DÍAS NATURALES		
FECHAS	INICIO	TERMINACIÓN
PROGRAMADA:	09-oct-19	22-nov-19
REAL:	09-oct-19	03-dic-19

“CONSTRUCCIÓN DE CINCO POZOS DESARENADORES EN DIFERENTES CRUCEROS DE LA CIUDAD DE MATEHUALA S.L.P.”

Empresa Ganadora: ING. JOSE VICENTE ACEVEDO OROZCO

Contrato: SAPSAM-AD-OB-029-2019

Monto Contratado \$ 238,573.63 , INCLUYE IVA.

Avance Físico: 74.00%

Avance Financiero: 30.00% (Pago de Anticipo)

Convenio en tiempo.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 44 DÍAS NATURALES		
FECHAS	INICIO	TERMINACIÓN
PROGRAMADA:	03-dic-19	15-ene-20
REAL:	03-dic-19	26-ene-20



“CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE XICOTENCATL (J. CARRILLO-M. ESPERÓN) (2ª Invitación)”

Empresa Adjudicada: JULIO CESAR CARRIZALES ZAVALA

Contrato: SAPSAM-AD-OB-035-2019

Monto Contratado: \$ 344,058.33 INCLUYE IVA.

Monto Ejecutado: \$ 366,709.30 INCLUYE IVA

Convenio Modificatorio en monto al alza

Avance Físico: 100.00%

Avance Financiero: 100.00%

AGUA POTABLE:

90.00 ML DE TUBO PVC HIDRÁULICO- ANG RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO, PREPARACIONES DE 23.00 TOMAS DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE

DRENAJE SANITARIO:

116.90 ML DE TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 10" DE DIÁMETRO, CONSTRUCCIÓN DE 13.00 PREPARACIONES DE DESCARGAS SANITARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE 2 POZOS DE VISITA. ASÍ MISMO CABE SEÑALAR QUE EN EL TRAMO INTERMEDIO EXISTENTE ENTRE SILVESTRE REVUELTAS Y ZEFERINO PONCE, SE REQUIRIÓ DE LA EXTRACCIÓN Y REPOSICIÓN DE 36.10 ML DE TUBERÍA EXISTENTE; DEBIDO AL AZOLVE CON GRAVAS, ARENAS Y FINOS, LOS CUALES SE SEDIMENTARON Y SE COMPACTARON POR EFECTO DE GRAVITACIÓN, VOLUMETRÍA, SATURACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS MATERIALES, LOS CUALES QUEDARON ATRAPADOS DENTRO DE LA TUBERÍA EN LA TOTALIDAD DE LA LÍNEA DE ESTE TRAMO EN CUESTIÓN. Y ESTOS PROCESOS RESULTARON ATÍPICO, MOTIVO POR EL CUAL NO SE ENCONTRABAN DENTRO DEL PROYECTO.



"REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PASEO ANGEL VERAL (PALMA A FCO. GONZÁLEZ BOCANEGRA), 434.486 m CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 355MM DE DIÁMETRO, SUSTITUCIÓN DE 11 DESCARGAS Y 14 INTERCONEXIONES EN POZOS DE VISITA "

Empresa Adjudicada: ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUÁREZ RIVERA


Contrato SAPSAM-PROSANEAR-IO-824020999-E3-2019

Monto Contratado \$ 1, 432,282.98 incluye IVA

PLAZO DE EJECUCIÓN: 99 DÍAS NATURALES		
FECHAS	INICIO	TERMINACIÓN
PROGRAMADA:	26-dic-19	30-mar-20
REAL:	27-dic-19	30-mar-20

Avance Físico: 20.00%

Avance Financiero: 0.00% (No ha presentado factura pago que correspondiente al anticipo)

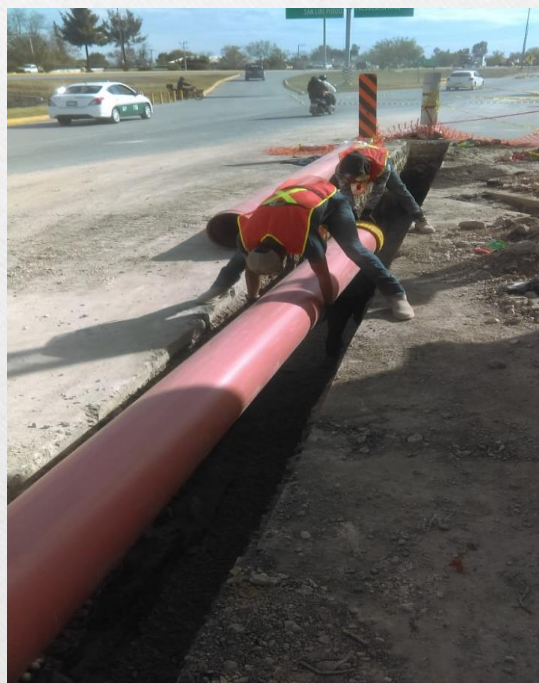

"REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JESÚS GARCÍA (RÉGULES-MARIANO VÁZQUEZ), 289.00 m CONTUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 10" DE DIÁMETRO, SUSTITUCIÓN DE 34 DESCARGAS Y CONSTRUCCIÓN DE 2 POZOS DE VISITA"

Empresa Adjudicada: MARTELEC S.A. DE C.V.

Contrato: SAPSAM-PROSANEAR- IO-824020999-E4-2019

Monto Contratado \$ 953,172.56 *Incluye IVA*

PLAZO DE EJECUCIÓN: 99 DÍAS NATURALES		
FECHAS	INICIO	TERMINACIÓN
PROGRAMADA:	23-dic-19	30-mar-20
REAL:	26-dic-19	30-mar-20

Avance Físico: 75%

Avance Financiero: 30% (correspondiente al anticipo)



"REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE RÉGULES (5 DE MAYO A PASEO ÁNGEL VERAL), 397.93 m CONTUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 305MM DE DIÁMETRO, SUSTITUCIÓN DE 67 DESCARGAS Y CONSTRUCCIÓN DE 6 POZOS DE VISITA"

Empresa Adjudicada: ING. JOSE VICENTE ACEVEDO OROZCO


Contrato: SAPSAM-PROSANEAR- IO-824020999-E5-2019

Monto Contratado \$ 1,739,898.85 Incluye IVA

PLAZO DE EJECUCIÓN: 96 DÍAS NATURALES		
FECHAS	INICIO	TERMINACIÓN
PROGRAMADA:	26-dic-19	30-mar-20
REAL:	27-dic-19	30-mar-20

Avance Físico: 35%

Avance Financiero: 30% (correspondiente al anticipo)

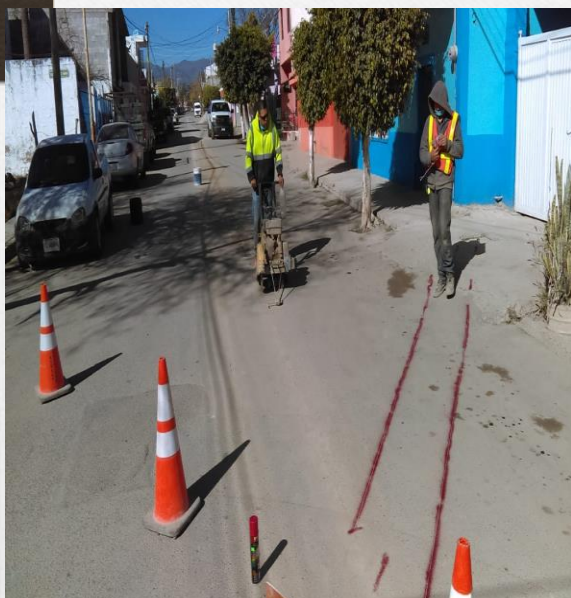

**INFORME:
ÁREA DE COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN.**

MES: ENERO

AÑO: 2020

Elaboro.

Revisión.

Ing. Joel Blas Muñoz Loreda.
Coordinador de Supervisión.

Ing. Alonso Tobías García.
Subdirector.

Recibido.

Lic. Marcela Magdalena Cervantes Morales.
Coordinadora de Seguimiento a Planes y
Programas
