



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!

¡YA ES HORA DE CREER EN TI!
ESPERANZA
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL
Y COMBATE A LA POBREZA



INFORME MENSUAL DE ESTADO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES

DICIEMBRE 2018



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
OFICIO No. P-2019/17/01-0012
ASUNTO: REPORTE MES DE
DICIEMBRE

C.P.C LORENZO ANTONIO PORTILLA VÁSQUEZ
AUDITOR GENERAL TITULAR DEL ORGANO
DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO.
PRESENTE:

El que suscribe **C. Ing. Wilman Monje Morales**, Presidente Municipal Constitucional de Gutiérrez Zamora, por medio del presente me dirijo a Usted para hacer de conocimiento que en cumplimiento a lo que establece el artículo 30 de la *Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*, así como *Las Reglas de Carácter General para el cumplimiento de la Presentación de Información Municipal a través de Medios Electrónicos* al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz; remito a Usted el **Estado de Obra Pública correspondiente al mes de Diciembre 2018**, generado en el sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), así como el acta de cabildo donde fueron aprobados.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración

ATENTAMENTE
Gutiérrez Zamora, Ver. ; a 17 de Enero de 2019.

ING. WILMAN MONJE MORALES.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE GUTIÉRREZ ZAMORA.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
PRESIDENCIA



ACTA NUMERO 02 SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
GUTIÉRREZ ZAMORA, VERACRUZ

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO efectuada por el Honorable Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz, a las NUEVE horas del QUINCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, de conformidad con lo que disponen los Artículos 36, Fracción I, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz-Llave.- Preside el C. Wilman Monje Morales Presidente Municipal, con quórum integrado por los ciudadanos: C. Rosa María Ortega González, Sindica Única; C. Gonzalo Quiñones López Regidor Primero, Silviana Rodríguez Martínez Regidora Segunda, Francisco Hatzel Gómez Ochoa Regidor Tercero, Rosalía García Guerrero Regidora Cuarta. El C. Presidente Municipal, C. Wilman Monje Morales, declara abierta la Sesión, acto seguido, el secretario del H. ayuntamiento, procede a pasar lista de asistencia, declarando quórum legal. Inmediatamente da lectura al Orden del Día, misma que a la letra dice: -----

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICA ÚNICA

REGIDOR PRIMERO

1.- LISTA DE ASISTENCIA. -----

REGIDORA SEGUNDA

2.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -----

3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----

REGIDOR TERCERO

4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.-----

5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018; DE LOS REPORTES DE LOS FONDOS DEL FISM DF 2018, FORTAMUN DF 2018, INTERESES FISM 2017, PRODERE 2018, FORTAFIN 2018, CAPUFE 2017, CAPUFE 2018. -----

REGIDORA CUARTA

6.- ASUNTOS GENERALES. -----

SECRETARIO AYUNTAMIENTO

Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, C. WILMAN MONJE MORALES, pregunta al Cuerpo Edilicio si están de acuerdo en aprobar el Orden del Día. - ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. -----

CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA APROBADO Y AGOTADOS LOS PUNTOS 1, 2 y 3 SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO. -----

4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.-----



En uso de la voz la C. Kitzia Eunice Juárez Salazar, Tesorera Municipal, informa al cabildo los Estados Financieros del mes de diciembre de 2018, acorde a lo establecido en el artículo 45 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre, mismos que fueron preparados por la Tesorería Municipal, en términos del artículo 72 fracción XIII de la misma Ley. En uso de la voz el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al cabildo si son de aprobarse los estados financieros correspondientes al mes de diciembre del año 2018.-----

El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO. - Se aprueban los Estados Financieros correspondientes al mes de diciembre del año 2018. APROBADO POR UNANIMIDAD. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.-----

PRESIDENTE
MUNICIPAL

SINDICA ÚNICA

5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018; DE LOS REPORTES DE LOS FONDOS DEL FISM DF 2018, FORTAMUN DF 2018, INTERESES FISM 2017, PRODERE 2018, FORTAFIN 2018, CAPUFE 2017, CAPUFE 2018.-----

En uso de la voz el C. Arq. Antonio Ríos Pérez, Director de Obras Públicas; informa al cabildo los Estados de Obra Pública del mes de diciembre de 2018, acorde a lo establecido en el artículo 73 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre; y presenta los reportes de los fondos del FISM DF 2018, FORTAMUN DF 2018, INTERESES FISM 2017, PRODERE 2018, FORTAFIN 2018, CAPUFE 2017, CAPUFE 2018. En uso de la voz el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al cabildo si son de aprobarse los estados de Obra correspondientes al mes de diciembre del año 2018; de los reportes de los fondos del FISM DF 2018, FORTAMUN DF 2018, INTERESES FISM 2017, PRODERE 2018, FORTAFIN 2018, CAPUFE 2017, CAPUFE 2018. El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO. - Se aprueban los Estados de Obra Pública correspondientes al mes de diciembre del año 2018, de los reportes de los fondos del FISM DF 2018, FORTAMUN DF 2018, INTERESES FISM 2017, PRODERE 2018, FORTAFIN 2018, CAPUFE 2017, CAPUFE 2018. APROBADO POR UNANIMIDAD. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.-----

REGIDOR
PRIMERO

REGIDORA
SEGUNDA

REGIDOR
TERCERO

REGIDORA
CUARTA

SECRETARIO F
AYUNTAMIENTO

6.- ASUNTOS GENERALES.-----

No hubo asuntos generales.-----

Posterior a ello, el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal, en los términos que marca la Ley, en uso de la voz, hace del conocimiento de los miembros del cabildo que se agotaron los asuntos del orden del día de esta Segunda sesión ordinaria del H. Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz.-----

7.- CLAUSURA.-----

Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS, DEL DÍA QUINCE DE ENERO,



LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA QUE FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS CIUDADANOS EDILES QUE EN ELLA INTERVINIERON ANTE EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, QUE AUTORIZA Y DA FE. REMÍTASE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA AL H. CONGRESO DEL ESTADO.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
PRESIDENCIA


C. 
WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
¡BRILLA CON FUERZA!
SINDICATURA


ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICA ÚNICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
REGIDURIA PRIMERA


C. 
GONZALO QUIÑONES LÓPEZ
REGIDOR PRIMERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
REGIDURIA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
¡BRILLA CON FUERZA!
REGIDURIA PRIMERA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
¡BRILLA CON FUERZA!
REGIDURIA SEGUNDA


SILVANA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
REGIDORA SEGUNDA


C. 
FRANCISCO HATZEL GÓMEZ OCHOA
REGIDOR TERCERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
¡BRILLA CON FUERZA!
REGIDURIA TERCERA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
¡BRILLA CON FUERZA!
REGIDURIA CUARTA


ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA

C. 
JORGE CHENA BATRES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
SECRETARÍA



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/44467

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690050	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO EN SECCIONES AISLADOS "BACHEO", EN LA CABECERA MUNICIPAL.	No	No	No	No

EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/44467



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRAS
PUBLICAS

SELLO DIGITAL:

YChDVPah9oxg5f0q+xD4CwaBYrZLfs5AZWMuXsa5HewJRSjom8501+mjJuMKydSWWPDUZlPb3TzpqfPb9W7l/zxxBoSHg4jm3xHL1GLGIDbN0I9J5x8SxiLLI82myU+SEmGxeCifR0MoEfEke9IYvaZgltFAAOs5fiNLwOKdMdU=



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/44204

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690033	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO "STA. ROSA"	No	No	Sí	No
2018300690042	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO LOMAS CHICAS A RAFAEL VALENZUELA DEL KM 0+000 AL KM 0+180	No	No	Sí	No
2018300690040	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RAFAEL VALENZUELA A IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, DEL KM 0+669 AL KM 1+334	No	No	Sí	No
2018300690043	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO LOMAS CHICAS A RAFAEL VALENZUELA DEL KM 0+775 AL KM 0+903	No	No	Sí	No

EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/44204



SELLO DIGITAL:

H2lcj1WsEc7/oSLIDEqNI1sVO1LOW9FfjA7avYzsJdQa+0LkQqM4cX4vw+/AhJL+6bbxJ6Lki2HHqDUk8Es5JSVA4oDgy+JW9lrIWeoYMovzAAXLyckm2SXj1xMXJrdB8S7IbBhCwhCp+xyvR/DfebhMK0oBGX6DAIxEDvhUA5U=



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/44425

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690101	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA DE LA RIBERA ENTRE PUENTE TECOLUTLA Y PUERTO CABALLERO	No	No	No	No
2018300690102	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO CORONADO - LOMAS CHICAS	No	No	No	No
2018300690103	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRILES - EL CEPILLO	No	No	No	No
2018300690104	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRILES - SAN ANTONIO CORONADO	No	No	No	No
2018300690105	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: RAFAEL VALENZUELA-LOMAS CHICAS	No	No	No	No
2018300690106	REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO EN CALLES NIÑOS HÉROES, EMILIANO ZAPATA Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL EJIDO SOTO Y GAMA	No	No	No	No
2018300690107	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, CLAVE 30DPR5104U COL. ASOCIACIÓN CIVIL.	No	No	No	No
2018300690110	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 109, COLONIAS DEL CARMEN, MURILLO VIDAL, HERNÁNDEZ OCHOA	No	No	No	No
2018300690112	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 202, COLONIAS PRIMERO DE MAYO, AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO Y FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS	No	No	No	No
2018300690113	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 185, COLONIA CUAUHTLAN	No	No	No	No
2018300690114	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 019A, COLONIAS EL PORVENIR, ASOCIACIÓN CIVIL PRIMERO DE MAYO Y AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO.	No	No	No	No

EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/44425

SELLO DIGITAL:

Y47R+jk6ITbEc1rwqpEzINP5L4aqLmqxs3AWPhUO2QkNXmypoBtmavizRe6JJC0tW0bFFbvGBnSBzOBnMWIIWTHaLK1HltgJ1Wsq0wcW5o9x3eTaFS5EbihezqAk5CBNfunljkHYm+6Y/UUsh7FkSc+yF/gtLjxtF5vhd4sfA=



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/44425

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690116	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 217, COLONIAS FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, LUIS DONALDO COLOSIO Y GUADALUPE	No	No	No	No
2018300690108	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL ENRIQUE RODRIGUEZ CANO CLAVE: 30DPR0616M, LOCALIDAD EL COCO	No	No	No	No
2018300690109	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE DR. ALEJANDRO CERISOLA EN CABECERA MUNICIPAL.	No	No	No	No
2018300690124	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD LOMAS CHICAS	No	No	No	No
2018300690125	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD LOMAS DE ARENA	No	No	No	No
2018300690126	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD CARRILLO PUERTO SANTA ROSA	No	No	No	No
2018300690127	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL VALENZUELA	No	No	No	No
2018300690128	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	No	No	No	No
2018300690129	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL CEPILLO	No	No	No	No
2018300690130	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MACARENA ARRAZOLA	No	No	No	No
2018300690131	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA	No	No	No	No
2018300690132	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PAGUAS DE CORONADO	No	No	No	No

SELLO DIGITAL:

Y47R+jk6lTbEc1rwqpEZINP5L4aqLmqqs3AWPhU02QkNXmypoBtmavIzRe6JJC0tW0bFFbvG8nSbZOBnMWIIWTHaLK1HltgJ1Wsq0wcW5o9x3eTaF55EbihezqAk5CBNfunIjKHYm+6Y/UUsh7FkSc+yF/gtLjxF5vhd4sfA=



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRAS
PÚBLICAS



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/44427

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690225	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES Y OBRAS DE ACCESO EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, GALERAS DE LA FERIA Y LIENZO CHARRO.	No	No	No	No
2018300690226	REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL	No	No	No	No
2018300690232	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL	No	No	No	No

EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/44427



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRAS
PÚBLICAS

SELLO DIGITAL:

q9u2mj+L766XmEsHGJ5pXT8RROi9UJczhVDSah24QgOT4bE4E1HTs6UR1shgKuQZxg5rGtpCJOIZkoAPSaFEKQRQROiKykyqvbv27U9wKAoxAApWBohqmkEB3f9vEqdb0tPmfl6RKzZHDXhRIKBq0pYHbPhyWPCuJn8IBazJE+Qw=



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/44208

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690301	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL "INFRAESTRUCTURA VIAL" EN LA CABECERA MUNICIPAL	No	No	Sí	No

EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/44208



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
**OBRAS
PÚBLICAS**

SELLO DIGITAL:

ISakOclH/mJz0tUEd42Ie5264DDfpN3fcHV1sE0Cne+xUSXNxaqVhXlxE4v8k6dmROSYyrusAf61+nlAo6/niEWyvyZDdLLK77P6gi5zfiE4icCX76n9TfUslGojo3zp0pd05gaQVwCkPQNi+yIX0f4d2sN/FdOOtaSWuAsFbM=



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/44207

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690302	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE MUNICIPAL EN COLONIA CUAHUTÉMOC, EN CABECERA MUNICIPAL	No	No	Sí	No

EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/44207



SELLO DIGITAL:

CfinBbcJoLy4uT6nKzM5AMJDynjBBR2ihkPalk30+JmtNXImHfRxcV26Zk+jfF6e+OxJcW0gPNWGUyF0ZWXjat/rU7EvcZr07w+/UqK4VkinhQ3irCR5Y7SnFk1NfKtZNx2zSiKrdvDMwvP7yJl7wTRm9ulJ8aoHWLEp4BUeG4=



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/44426

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690401	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - ENTRONQUE PAGUAS DE CORONADO DEL KM 0+000 AL KM 1+400	No	No	No	No
2018300690403	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE "B" ENTRE CALLE 2 Y LIMITE DE COLONIA FIDEL HERRERA, EN COLONIA ASOCIACIÓN CIVIL	No	No	No	No
2018300690404	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN SECCIÓN DE CALLES MELCHOR OCAMPO ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE MELCHOR OCAMPO Y JUVENTINO ROSAS, JUVENTINO ROSAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA ALLENDE EN LA LOCALIDAD RAFAEL	Sí	Sí	Sí	No
2018300690402	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: ARROYO GRANDE - LA GALEANA DEL KM 0+000 AL KM 2+000	No	No	No	No
2018300690405	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MÉXICO ENTRE CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO Y CALLE PERU Y PERÚ ENTRE CALLE MÉXICO Y GUYANA EN LA COLONIA FIDEL HERRERA	No	No	Sí	No
2018300690406	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMO: RICARDO FLORES MAGON- LAS BOMBAS	No	No	No	No
2018300690407	REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS CON PASAMANOS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES RICARDO FLORES MAGON Y FRANCISCO I. MADERO EN COLONIA REVOLUCIÓN	No	No	Sí	No

EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/44426



SELLO DIGITAL:

Jx0XLVnqXnmSDM762aOCA9+jXNL+RjtFMe71iC7aOR+zXgQqFRLgMtkj25Bes1lFVUXWzIrcWFNQIH3GcbWFbpXnvLxJiZv7zF2o7yHhycpD46rYmQajc9lvEv/yua/U9weH+3ORBmK2npFuZQraRdBtirgXMWiyj/jXH9Go=

Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/44426

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690408	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CONSTITUCIÓN, ENTRE AVENIDA DOS DE ABRIL Y CINCO DE FEBRERO EN EL CERRO DE LOS PINOS, CABECERA MUNICIPAL	No	No	Sí	No
2018300690409	REHABILITACIÓN CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN CALLES: NIÑOS HÉROES, EMILIANO ZAPATA, GENERAL LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO DEL EJIDO SOTO Y GAMA	No	No	No	No
2018300690410	REHABILITACIÓN CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN CALLES AVENIDA MORELOS, AVENIDA HIDALGO, EMILIANO ZAPATA, JUVENTINO ROSAS DE LOCALIDAD RAFAEL VALENZUELA	No	No	No	No
2018300690411	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: ANCLON Y ARENAL - BARRILES	Sí	Sí	Sí	No
2018300690412	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS ENTRE "EL FALSO Y CEMENTERIO DE SANTA ROSA" DEL KM 0+000 AL KM 1+460	No	No	Sí	No
2018300690414	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR MODELOS EFICIENTES TIPO CITI 55-305V EN CABECERA MUNICIPAL	No	No	No	No
2018300690415	REHABILITACIÓN DE PARQUE IGNACIO MUÑOZ ZAPOTAL CONSISTENTE EN: JARDINERAS, QUIOSCO, ANDADORES Y ALUMBRADO PÚBLICO	No	No	Sí	No
2018300690413	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLEJÓN CINCO DE MAYO, CERRO DE LA CRUZ EN CABECERA MUNICIPAL	No	No	Sí	No
2018300690416	REHABILITACIÓN DE PARQUE COL. FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS CONSISTENTE: JARDINERAS, ANDADORES, COLOCACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CANAL PLUVIAL Y ALUMBRADO PÚBLICO	No	No	Sí	No

SELLO DIGITAL:

Jx0XLVnqXnmSDM762aOCA9+JXNL+RjtfMe71IC7aOR+zZxgQqFcrLgMtKj25Bes1ILfVUXWzircWFNQiH3GcbWFbpXnvLxJzV7zF2o7yHhycpD46rYmQajc9lvEv/yua/U9weH+3OR8mK2npFuZQRaRdBtirgXMWiyJ/jjXH9Go=



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/44426

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690417	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: ENTRONQUE A CAMINO A PALO BLANCO - A LA LOCALIDAD MARIO HERNÁNDEZ POSADAS DEL KM 0+000 AL KM 3+200	No	No	Sí	No
2018300690418	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN TRAMO: UNIVERSIDAD-ENTRONQUE A CAMINO PAGUAS DE ARROYO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 2+820	No	No	Sí	No

EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/44426



EL AYUNTAMIENTO
COMPETENCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
OBRAS
PÚBLICAS

SELLO DIGITAL:

Jx0XLVnqXnmSDM762aOCA9+jXNL+RjtFMe71IC7aOR+zZxgQqFcRLgMtKj25Bes1ILfVUXWzIrcWfNQIH3GcbWFbpXnvLxJiZv7zF2o7yHhycpD46rYmQajc9lvEv/yua/U9wel+3ORBmK2npFuZQRaRdBtirgXMWiyj/jXHG6e



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	RAFAEL VALENZUELA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690404.00	Periodo:	DICIEMBRE	Número de estimación:	2.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN SECCIÓN DE CALLES MELCHOR OCAMPO ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE			Fuente de financiamiento:	MINOS Y PUENTES FEDERAL
				Fecha de revisión:	02/01/2019



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for recording observations.




 Ing. Norberto Juárez Mejía
 INGENIERO
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	RAFAEL VALENZUELA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690404.00	Periodo:	DICIEMBRE	Número de estimación:	2.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN SECCIÓN DE CALLES MELCHOR OCAMPO ENTRE			Fuente de Financiamiento:	MINOS Y PUENTES FEDERAL
				Fecha de revisión:	02/01/2019



FOTO (12)
Concepto de obra ejecutado:

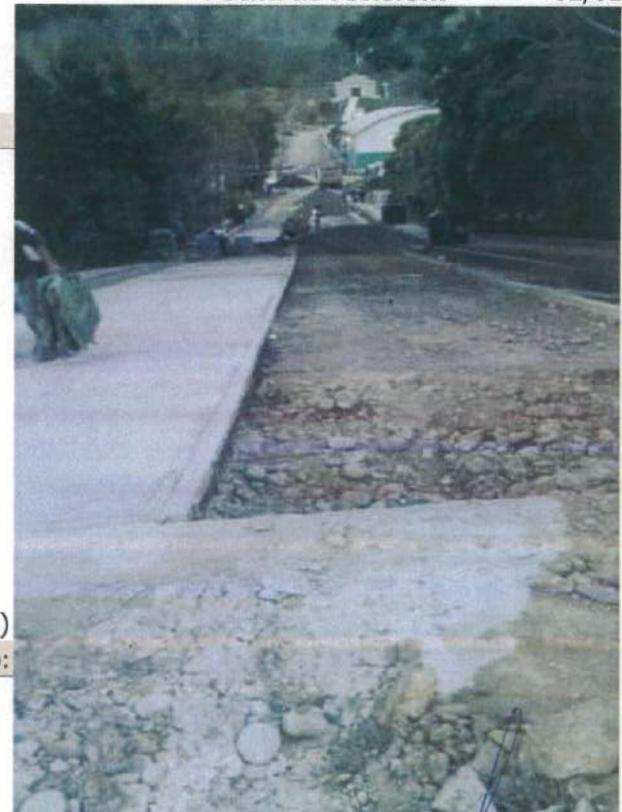


FOTO (13)
Concepto de obra ejecutado:

Obervaciones:



H. AYUNTAMIENTO
COMUNICACIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
**OBRAS
PUBLICAS**

Ing. Norberto Juárez Mejía
INGENIERO
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	ANCLÓN Y ARENAL	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690411.00	Periodo:	DICIEMBRE	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: ANCLON Y ARENAL - BARRILES			Fuente de financiamiento:	MINOS Y PUENTES FEDERALES
				Fecha de revisión:	02/01/2019



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
**OBRAS
PÚBLICAS**


Ing. Alfredo Moreno Neri
INGENIERO
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	ANCLÓN Y ARENAL	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690411.00	Periodo:	DICIEMBRE	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO:			Fuente de Financiamiento:	MINOS Y PUENTES FEDERAL
				Fecha de revisión:	02/01/2019

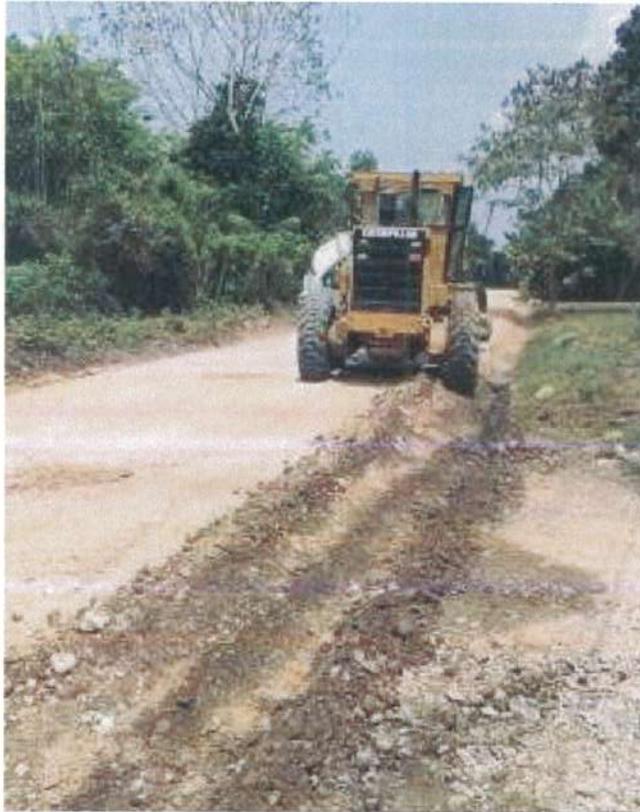


FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:



FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:



H. AYUNTAMIENTO
COMUNICIPAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
**OBRAS
PUBLICAS**

Ing. Alfredo Moreno Neri
INGENIERO
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACION:
16/07/2018
MES QUE SE REPORTA
DICIEMBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO "STA. ROSA"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	CAMINOS Y PUENTES FEDER	No. DE OBRA:	2018300690033		

ANTECEDENTES:										
Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		SI	X	NO						
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:					GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE	N/A	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	X	MUY BAJO	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		AGEB:		TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:						
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO						
		SI	X	NO	DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA			
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA				PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE			SI	NO	X
LATITUD	20.420623399	LONGITUD	-97.188314198							

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:	BARDA PERIMETRAL Y GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO
-----------------------------------------------------	----------------------------------------------

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:	TERMINADA GRADAS Y MURO
-----------------------------------------------------	-------------------------

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
FINIQUITO	\$639,552.63	1	\$639,552.63	108	\$642,321.26	\$0.00	\$2,768.63	\$0.00	\$639,552.63
TOTALES	\$639,552.63		\$639,552.63		\$642,321.26	\$0.00	\$2,768.63	\$0.00	\$639,552.63

MONTO AUTORIZADO:	\$642,321.26	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$642,321.26	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X		
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	CAPUFE-GTZ-IR-2017300690033	FECHA:	02/10/2017
CONTRATISTA:	FELICIANA BARRIOS ZAleta		
MONTO CONTRATADO:	\$642,321.26	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/01/2018	01/01/2018
	TÉRMINO	15/12/2018	30/03/2018
	DÍAS	89	89
ANTICIPO:	APLICA MONTO:	NO APLICA	X
	FECHA DE PAGO:		PORCENTAJE:

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$642,321.00	30/03/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$642,321.00	30/03/2018
FINIQUITO:	\$642,321.00	30/03/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	26/11/2017

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
REAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
ACUMULADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:	TERMINADA
----------------	-----------

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRAS
PUBLICAS

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		\$161,034.48	\$186,800.00
AFIANZADORA:		Liberty Fianzas, S.A DE C.V. Liberty Fianzas, S.A DE C.V.	
No. DE FIANZA:		1877846-0000	1891232-0000
FECHA:		02/10/2017	27/11/2017
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO	INICIAL	FINAL
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	NO APLICA	\$642,321.26	C/IVA

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ARQ. ANTONIO RÍOS PÉREZ
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:	16/07/2018
MES QUE SE REPORTA	DICIEMBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	RAFAEL VALENZUELA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO RAFAEL VALENZUELA A IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, DEL KM 0+669 AL KM 1+334
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	CAMINOS Y PUENTES FEDER	No. DE OBRA:	2018300690040		

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		SI	X	NO					
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:							
TIPO DE ZONA:	RURAL URBANA	CLAVE AGE:	N/A	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	X	MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI	X	NO		TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO		DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	X
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI			
LATITUD	20.400158176	LONGITUD	-97.126243084	NO	X				

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:	PAGO DE PAVIMENTO OBRA CAPUFE 2017
-----------------------------------------------------	------------------------------------

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:	PAVIMENTO EN CAMINO
-----------------------------------------------------	---------------------

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
FINIQUITO	\$746,580.20	1	\$746,580.20	A 196	\$749,812.15	\$0.00	\$3,231.95	\$0.00	\$746,580.20
TOTALES	\$746,580.20		\$746,580.20		\$749,812.15	\$0.00	\$3,231.95	\$0.00	\$746,580.20

MONTO AUTORIZADO:	\$749,812.15	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$749,812.15	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X		
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	CAPUFE-GTZ-IR-2017300690040	FECHA:	09/10/2017
CONTRATISTA:	URIEL DEL ANGEL PERREZ		
MONTO CONTRATADO:	\$749,812.15	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/01/2018	01/01/2018
	TÉRMINO	15/12/2018	30/03/2018
	DÍAS	89	89
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$749,812.00	28/03/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$749,812.00	28/03/2018
FINIQUITO:	\$749,812.00	28/03/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	13/12/2017

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
REAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
ACUMULADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:	TERMINADA
----------------	-----------

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

H. AYUNTAMIENTO
CONSTRUCCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRAS
PUBLICAS

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		\$323,275.86	\$375,000.00
AFIANZADORA:		zadora Insurgentes S.A. Dzadora Insurgentes S.A. D	
No. DE FIANZA:		5652-02076-5	5652-02088-8
FECHA:		09/10/2017	30/11/2017
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO	INICIAL	FINAL
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$749,812.15	C/IVA

Arq. ANTONIO RÍOS PÉREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ARQ. ANTONIO RÍOS PÉREZ
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:	15/03/2018
MES QUE SE REPORTA	DICIEMBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	LOMAS CHICAS	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO LOMAS CHICAS A RAFAEL VALENZUELA DEL KM 0+000 AL KM 0+180
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	CAMINOS Y PUENTES FEDER	No. DE OBRA:	2018300690042		

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		SI	X	NO					
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:							
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE	N/A	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	X	BAJO	MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		AGEB:							
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO		TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			
		SI	X	NO		DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	X
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		PROYECTO ESPECIAL			CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI		
LATITUD	20.413178197	LONGITUD	-97.141518136				NO	X	

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

PAVIMENTO EN CAMINO OBAR DE 2017 CAPUFE PASIVOS

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

CONCRETO EN CAMINO TERMINADO

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
FINIQUITO	\$975,896.16	1	\$975,896.16	99	\$980,120.82	\$0.00	\$4,224.66	\$0.00	\$975,896.16
TOTALES	\$975,896.16		\$975,896.16		\$980,120.82	\$0.00	\$4,224.66	\$0.00	\$975,896.16

MONTO AUTORIZADO:	\$980,120.82	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$980,120.82	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		X	
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	CAPUFE-GTZ-IR-2017300690042	FECHA:	21/11/2017
CONTRATISTA:	PEDRO HERNÁNDEZ REYES		
MONTO CONTRATADO:	\$980,120.82		C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/01/2018	01/01/2018
	TÉRMINO	15/12/2018	30/03/2018
	DÍAS	89	89
ANTICIPO:	APLICA MONTO:	NO APLICA	X
	FECHA DE PAGO:		PORCENTAJE:

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$980,120.00	30/03/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$980,120.00	30/03/2018
FINIQUITO:	\$980,120.00	30/03/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	21/12/2017

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
REAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
ACUMULADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TERMINADO

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

H. AYUNTAMIENTO
CONSEJO LOCAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRAS
PÚBLICAS

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$84,493.17	\$98,012.08	
AFIANZADORA:	Arta, S.A de C.V. Grupo Firta, S.A de C.V. Grupo FI		
No. DE FIANZA:	3900-02431-4	3900-02459-2	
FECHA:	21/11/2017	20/12/2017	
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO	INICIAL	FINAL
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$980,120.82		C/IVA

Arq. ANTONIO RÍOS-PÉREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ARQ. ANTONIO RÍOS PÉREZ
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

FECHA DE ELABORACION:
15/10/2018
MES QUE SE REPORTA
DICIEMBRE

EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	GUTIERREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL "INFRAESTRUCTURA VIAL" EN LA CABECERA MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	PROYECTOS DE DESARROLLO	No. DE OBRA:	2018300690301		

ANTECEDENTES:												
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:			SI	X	NO							
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:					GRADO DE REZAGO SOCIAL:							
TIPO DE ZONA:	RURAL URBANA	CLAVE AGE:	N/A		MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	X		
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	X	NO		TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:							
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI	X	NO		DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	X				
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA					PROYECTO ESPECIAL					SI	NO	X
LATITUD	20.446698209	LONGITUD	-97.092630985		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE					SI	NO	X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
-----------------------------------------------------	------------------------------------------

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:	CONCRETO EN BANQUETAS Y GUARNICIONES
-----------------------------------------------------	--------------------------------------

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ANTICIPO	\$1,335,150.00	1	\$1,335,150.00	2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,335,150.00
ESTIMACIÓN UNIC	\$1,058,912.07	2	\$1,058,912.07	3	\$2,136,240.00	\$1,068,120.00	\$9,207.93	\$0.00	\$1,058,912.07
ESTIMACIÓN DOS	\$264,728.02	3	\$264,728.02	5	\$534,060.00	\$267,030.00	\$2,301.98	\$0.00	\$264,728.02
TOTALES	\$2,658,790.09		\$2,658,790.09		\$2,670,300.00	\$1,335,150.00	\$11,509.91	\$0.00	\$2,658,790.09

MONTO AUTORIZADO:	\$2,670,300.00	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$2,670,300.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	EXISTE			
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA			
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			X
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	IGTZ-LR 12-PRÓDERE/2018 30 069 03	FECHA:	19/06/2018
CONTRATISTA:	MATEO GOMEZ GUERRA		
MONTO CONTRATADO:	\$2,670,300.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/04/2018	25/06/2018
	TÉRMINO	15/12/2018	
	DÍAS	259	60
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$1,335,150.00	PORCENTAJE: 50.00
	FECHA DE PAGO:	19/06/2018	

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$264,728.02	13/08/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$2,670,300.00	13/08/2018
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FISICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	10	50	100	100	100	100	100
REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	10	50	100	100	100	100	100
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

H. AYUNTAMIENTO
COMISIONAL
GUTIERREZ ZAMORA VER
2018-2021
OBRAS
PUBLICAS

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$1,335,150.00	\$230,198.28	\$267,030.00
AFIANZADORA:	arta, S.A de C.V. Grupo Fierla, S.A de C.V. Grupo Fianzas Dorama, S.A.		
No. DE FIANZA:	1947511	14947513	1034644
FECHA:	19/06/2018	19/06/2017	24/08/2018
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$2,670,300.00	C/IVA	

Ar. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Alfredo Moreno Neri
SUPERVISOR

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACION:
15/08/2018
MES QUE SE REPORTA
DICIEMBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	GUTIERREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE ALBERGUE MUNICIPAL EN COLONIA CUAHUTEMOC, EN CABECERA MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE FORTALECIMIENT	No. DE OBRA:	2018300690302		

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO						
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:								
TIPO DE ZONA:	RURAL URBANA	CLAVE AGE:	N/A							
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	X	NO		MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	X
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI	X	NO		TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:					
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		DIRECTA		INDIRECTA		COMPLEMENTARIA		X		
LATITUD	20.46303602	PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI		NO		
LONGITUD	-97.08333511							X		

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS PARA ZAPATAS, DADOS Y CADENAS DE DESPLANTE, MUROS, HABILITADO DE ACERO PARA LOSAS Y CONCRETO, ACABADOS Y PINTURA,

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS PARA ZAPATAS, DADOS Y CADENAS DE DESPLANTE, MUROS

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ANTICIPO	\$1,450,000.00	1	\$1,450,000.00	1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450,000.00
ESTIMACION UNK	\$1,161,500.00	2	\$1,161,500.00	2	\$2,343,200.00	\$1,171,600.00	\$10,100.00	\$0.00	\$1,161,500.00
ESTIMACION DO:	\$233,118.80	3	\$233,118.80	5	\$470,291.84	\$235,145.92	\$2,027.12	\$0.00	\$233,118.80
ESTIMACION TRE	\$42,881.20	3	\$42,881.20	7	\$86,508.16	\$43,254.08	\$372.88	\$0.00	\$42,881.20
TOTALES	\$2,887,500.00		\$2,887,500.00		\$2,900,000.00	\$1,450,000.00	\$12,500.00	\$0.00	\$2,887,500.00

MONTO AUTORIZADO:	\$2,900,000.00	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$2,900,000.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA			EXISTE
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			X
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	GTZ-LR 13-FORTAFIN/2018 30 069 03	FECHA:	19/06/2018
CONTRATISTA:	MIGUEL ANGEL LIMA ESCAMILLA		
MONTO CONTRATADO:	\$2,900,000.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	02/04/2018	25/06/2018
	TÉRMINO	15/12/2018	30/10/2018
	DÍAS	90	105
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$1,450,000.00	PORCENTAJE: 50.00
	FECHA DE PAGO:	20/06/2018	

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$42,881.20	13/11/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$2,900,000.00	13/11/2018
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	10	45	85	90	100	100	100
REAL	0	0	0	0	0	10	80	85	90	100	100	100
ACUMULADO	0	0	0	0	0	10	80	85	90	100	100	100
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

H. AYUNTAMIENTO
COMPTONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
OBRAS
PUBLICAS

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:	\$1,450,000.00	\$250,000.00	\$290,000.00	
AFIANZADORA:	Fianzas Monterrey S.A DE Fianzas Monterrey S.A DE Fianzas SOFIMEX, S.			
No. DE FIANZA:	1947510	1947512	2256769	
FECHA:	19/06/2018	19/06/2018	18/10/2018	
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA	
	MONTO			
	PLAZO	X	INICIAL	FINAL
	NO APLICA			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$2,900,000.00	C/IVA		

Arq. ANTONIO RÍOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Alfredo Moreno Neri
SUPERVISOR

FORMATO 11



**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACION:
05/12/2018
MES QUE SE REPORTA
DICIEMBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: RAFAEL VALENZUELA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN SECCION DE CALLES MELCHOR OCAMPO ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CAMINOS Y PUENTES FEDER	No. DE OBRA: 2018300690404	

ANTECEDENTES:									
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:			SI	X	NO				
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:									
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGE:	N/A	GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	URBANA			MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	X	MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	NO	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:					
		X		DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	X		
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA				PROYECTO ESPECIAL					
LATITUD	20.407376540	LONGITUD	-97.127479001	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE			SI	NO	X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIAS, CARGA DE MATERIALES, AFINE Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE, CIMBRA EN FRONTERA, PAVIMENTO DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO, JUNTA DE DILATACIÓN, CORTE DE PAVIMENTO Y APLICACIÓN DE CURACRETO.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIAS, CARGA DE MATERIALES, AFINE Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE, CIMBRA EN FRONTERA, PAVIMENTO DE CONCRETO

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE			FACTURAS				
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACIÓN DO	\$505,560.83	2	\$505,560.83	2	\$507,749.40	\$0.00	\$2,188.58	\$0.00	\$505,560.83
ESTIMACIÓN UN	\$411,514.63	2	\$411,514.65	1	\$413,296.10	\$0.00	\$1,781.45	\$0.00	\$411,514.65
ANTICIPO 30%	\$1,050,000.00	1	\$1,050,000.00	B93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00
TOTALES	\$1,967,075.46		\$1,967,075.48		\$921,045.50	\$0.00	\$3,970.03	\$0.00	\$1,967,075.48

MONTO AUTORIZADO:	\$3,500,000.00	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$3,500,000.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	X	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X		
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	IGTZ-LR 35-CAPUFE/2018 30 069 040	FECHA:	16/11/2018
CONTRATISTA:	JOSE DE JESUS TOLENTINO DORANTES		
MONTO CONTRATADO:	\$3,500,000.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/06/2018	19/11/2018
	TÉRMINO	15/12/2018	
	DÍAS	198	0
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$1,050,000.00	PORCENTAJE: 30.00
	FECHA DE PAGO:	16/11/2018	

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$507,749.40	17/12/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$1,971,045.50	17/12/2018
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	100
REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	88
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

H. AYUNTAMIENTO
COMISIÓN LOCAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
OBRAS PÚBLICAS

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$1,050,000.00	\$301,724.14	
AFIANZADORA:	FIRTA, S.A de C.V., Grupo Firta, S.A de C.V., Grupo F		
No. DE FIANZA:	1166-00565-0	1166-00566-3	
FECHA:	16/11/2018	16/11/2018	
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO	INICIAL	FINAL
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	NO APLICA		C/IVA

Arq. ANTONIO RÍOS PÉREZ
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Norberto Juárez Mejía
SUPERVISOR

FORMATO 11



**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACION:
05/12/2018
MES QUE SE REPORTA
DICIEMBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: GUTIERREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CONSTITUCION, ENTRE AVENIDA DOS DE ABRIL Y CINCO DE FEBRERO EN EL CERRO DE LOS PINOS, CABECERA MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CAMINOS Y PUENTES FEDER	No. DE OBRA: 2018300690408	

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO
ANTECEDENTES:				
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:		
TIPO DE ZONA:	RURAL URBANA	CLAVE AGE:	N/A	MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO X
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	X	NO	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI		NO	X
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:				
		DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA X
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA				
LATITUD	20.460503	LONGITUD	-97.086923	
		PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI NO X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO, CIMBRADO DE MUROS, VACIADO DE CONCRETO EN MUROS

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO, CIMBRADO DE MUROS, VACIADO DE CONCRETO EN MUROS

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE			FACTURAS				
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ANTICIPO	\$250,000.00	1	\$250,000.00	A75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
ESTIMACIÓN UNO	\$247,844.83	2	\$247,844.83	A80	\$500,000.00	\$250,000.00	\$2,155.17	\$0.00	\$247,844.83
TOTALES	\$497,844.83		\$497,844.83		\$500,000.00	\$250,000.00	\$2,155.17	\$0.00	\$497,844.83

MONTO AUTORIZADO:	\$500,000.00	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$500,000.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X		
	LICITACIÓN PÚBLICA			

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$500,000.00	23/11/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$500,000.00	23/11/2018
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	100
REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	100
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	100
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO. DE CONTRATO:	AGTZ-AD16 CAPUFE/2018 30 069 040	FECHA:	01/11/2018
CONTRATISTA:	GRUPO CARDEÑA DE VERACRUZ S.A DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$500,000.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/06/2018	05/11/2018
	TÉRMINO	15/12/2018	22/11/2018
	DÍAS	198	18
ANTICIPO:	APLICA X	NO APLICA	
	MONTO: \$250,000.00	PORCENTAJE: 50.00	
	FECHA DE PAGO:	08/11/2018	

OBSERVACIONES:

H. AYUNTAMIENTO
COMITÉ LOCAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$250,000.00	\$43,103.45	\$43,103.00
AFIANZADORA:	Afianzadora SOFIMEX S. Afianzadora SOFIMEX S. Afianzadora SOFIMEX S.		
No. DE FIANZA:	2261399	2261406	2261436
FECHA:	08/11/2018	08/11/2018	22/11/2018
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$500,000.00	C/IVA	

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Leonel Rodríguez Ríos
SUPERVISOR

OBRAS PÚBLICAS



**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:
02/01/2019
MES QUE SE REPORTA
DICIEMBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: ANCLÓN Y ARENAL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: ANCLÓN Y ARENAL - BARRILES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CAMINOS Y PUENTES FEDER	No. DE OBRA: 2018300690411	

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	X	NO	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:				
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA	CLAVE AGE: N/A			
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	X	NO	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI	X	NO	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA				
LATITUD 20.441717457	LONGITUD -97.123029571			
GRADO DE REZAGO SOCIAL:	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	X BAJO
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:	DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	X
PROYECTO ESPECIAL			CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI NO X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
CUNETEO A AMBOS LADOS DE CAMINO, EXTRACCIÓN DE MATERIALES TIPO II (GRAVA DE SABANA) PARA REVESTIMIENTO Y TIPO II (GRAVA DE RIO), ESCARIFICADO DISGREGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO, OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO, OPERACIÓN DE COMPACTADO EN CAPA DE 20 CM DE ESPESOR CON VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO A 90 % PROCTOR CON APLICACIÓN DE

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
CUNETEO A AMBOS LADOS DE CAMINO, EXTRACCIÓN DE MATERIALES TIPO II (GRAVA DE SABANA) PARA REVESTIMIENTO Y TIPO II (GRAVA DE RIO), ESCARIFICADO DISGREGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO, OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO, OPERACIÓN DE COMPACTADO EN CAPA DE 20 CM DE ESPESOR CON VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO A 90 % PROCTOR CON APLICACIÓN DE

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	FACTURAS		
		No.	MONTO				5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIM UNO	\$500,000.00	1	\$500,000.00	190	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
ESTIMACIÓN UN	\$495,689.66	2	\$495,689.66	195	\$1,000,000.00	\$500,000.00	\$4,310.34	\$0.00	\$495,689.66
TOTALES	\$995,689.66		\$995,689.66		\$1,000,000.00	\$500,000.00	\$4,310.34	\$0.00	\$995,689.66

MONTO AUTORIZADO:	\$1,000,000.00	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$1,000,000.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X		
	LICITACIÓN PÚBLICA			

REPORTÉ		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$1,000,000.00	15/10/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$1,000,000.00	15/10/2018
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100
REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO. DE CONTRATO: MGTZ-LR 31-CAPUFE/2018 30 069 041	FECHA: 01/10/2018
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DE ALBA EN EL GOLFO S.A DE C.V.	
MONTO CONTRATADO: \$1,000,000.00	C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	
PROGRAMADA	REAL
INICIO: 01/06/2018	02/10/2018
TÉRMINO: 15/12/2018	
DÍAS: 198	0
ANTICIPO:	
APLICA: X	NO APLICA
MONTO: \$500,000.00	PORCENTAJE: 50.00
FECHA DE PAGO: 01/10/2018	

OBSERVACIONES:

AYUNTAMIENTO
CONSEJO MUNICIPAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRAS PÚBLICAS

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$500,000.00	\$86,206.90	\$86,206.90
AFIANZADORA:	CE Fianzas Monterrey, S.CE Fianzas Monterrey, S.CE Fianzas Monterrey, S.		
No. DE FIANZA:	1949642	1949645	1961886
FECHA:	01/10/2018	01/10/2018	15/10/2018
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
MONTO			
PLAZO		INICIAL	FINAL
NO APLICA			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$1,000,000.00	C/IVA	

Arq. ANTONIO RÍOS PÉREZ
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Alfredo Moreno Neri
SUPERVISOR

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACION: 02/01/2019
MES QUE SE REPORTA DICIEMBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS ENTRE "EL FALSO Y CEMENTERIO DE SANTA ROSA" DEL KM 0+000 AL KM
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CAMINOS Y PUENTES FEDER	No. DE OBRA: 2018300690412	

ANTECEDENTES:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI <input checked="" type="checkbox"/> X NO <input type="checkbox"/>	GRADO DE REZAGO SOCIAL:
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO X MUY BAJO
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA	CLAVE AGEB: N/A
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI <input checked="" type="checkbox"/> X NO <input type="checkbox"/>	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI <input checked="" type="checkbox"/> X NO <input type="checkbox"/>	DIRECTA INDIRECTA COMPLEMENTARIA X
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	PROYECTO ESPECIAL: CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X
LATITUD: 20.416677	LONGITUD: -97.164713

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIAS, CARGA DE MATERIALES, AFINE Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE, CIMBRA EN FRONTERA, PAVIMENTO DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO, JUNTA DE DILATACIÓN, CORTE DE PAVIMENTO Y APLICACIÓN DE CURACRETO.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIAS, CARGA DE MATERIALES, AFINE Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE, CIMBRA EN FRONTERA, PAVIMENTO DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO, JUNTA DE DILATACIÓN, CORTE DE PAVIMENTO Y APLICACIÓN DE CURACRETO.

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE			FACTURAS				
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACIÓN UN	\$818,817.34	1	\$818,817.34	1	\$822,362.00	\$0.00	\$3,544.66	\$0.00	\$818,817.34
TOTALES	\$818,817.34		\$818,817.34		\$822,362.00	\$0.00	\$3,544.66	\$0.00	\$818,817.34

MONTO AUTORIZADO:	\$2,000,000.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$2,000,000.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	EXISTE X

NO. DE CONTRATO: AGTZ-LR 41-CAPUFE/2018 30 069 041	FECHA: 23/11/2018
CONTRATISTA: FRANCISCO RAFAEL LÓPEZ GONZÁLEZ	
MONTO CONTRATADO:	\$2,000,000.00 C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA REAL
INICIO	01/06/2018 26/11/2018
TÉRMINO	15/12/2018
DÍAS	198 0
ANTICIPO:	APLICA NO APLICA X
MONTO:	
FECHA DE PAGO:	PORCENTAJE:

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$822,362.00	29/11/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$822,362.00	29/11/2018
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	100
REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	41
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	41
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRA PUBLICAS

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		\$172,413.79	
AFIANZADORA:		Fianzas Dorama, S.A.	
No. DE FIANZA:		F18A38968	
FECHA:		23/11/2018	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO PLAZO NO APLICA	EXISTE IMPORTE/PERIODO	FECHA
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$2,000,000.00	C/IVA

Arq. ANTONIO RIOS PÉREZ
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Alfredo Moreno Neri
SUPERVISOR

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACION:	13/12/2018
MES QUE SE REPORTA	DECEMBER

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	GUTIERREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE/JON CINCO DE MAYO, CERRO DE LA CRUZ EN CABECERA MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	CAMINOS Y PUENTES FEDER	No. DE OBRA:	2018300690413		

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		SI	X	NO	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:					
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGE:	N/A	GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	URBANA	SI	X	NO	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA			TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:		
LATITUD	20.4566640	LONGITUD	-97.0855300	DIRECTA	INDIRECTA
				COMPLEMENTARIA	X
				PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE
				SI	NO
				NO	X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

EXCAVACIONES, PLANTILLA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO, CIMBRADO, VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRADO Y RELLENO.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

EXCAVACIONES, PLANTILLA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO, CIMBRADO, VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRADO Y RELLENO.

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ANTICIPO	\$325,000.00	1	\$325,000.00	A76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00
ESTIMACIÓN UNIC	\$322,198.28	2	\$322,198.28	A83	\$650,000.00	\$325,000.00	\$2,801.72	\$0.00	\$322,198.28
TOTALES	\$647,198.28		\$647,198.28		\$650,000.00	\$325,000.00	\$2,801.72	\$0.00	\$647,198.28

MONTO AUTORIZADO:	\$650,000.00	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$650,000.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X		
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	IGTZ-LR 34-CAPUFE/2018 30 069 041	FECHA:	13/11/2018
CONTRATISTA:	GRUPO CARDEÑA DE VERACRUZ S.A DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$650,000.00	C/IVA	
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/06/2018	14/11/2018
	TÉRMINO	15/12/2018	
	DÍAS	198	0
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$325,000.00	PORCENTAJE: 50.00
	FECHA DE PAGO:	14/11/2018	

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$650,000.00	30/11/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$650,000.00	30/11/2018
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80
REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	100
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	100
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:	
----------------	--

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
OBRAS
PÚBLICAS

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$325,000.00	\$56,034.48	\$56,034.00
AFIANZADORA:	Afianzadora SOFIMEX S.Afianzadora SOFIMEX S.Afianzadora SOFIMEX S.A		
No. DE FIANZA:	2270185	2270191	2270196
FECHA:	13/11/2018	13/11/2018	30/11/2018
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERÍODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$650,000.00	C/IVA	

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Leonel Rodríguez Rios
SUPERVISOR

FORMATO 11



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/44426

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	18/01/2019 07:53:07 AM
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/01/2019
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	DICIEMBRE
Fuente de financiamiento:	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

Jx0XLVnqXnmSDM762aOCA9+jXNL+RjtFMe71iC7aOR+zZxgQqFcRLgMtKj25Bes1ILfVUXWzIrcWfNQIH3
GcbWFbpXnvLxJiZv7zF2o7yHhycpD46rYmQajc9lvEv/yua/U9wel+3ORBmK2npFuZQRaRdBtirgXMWiyJ/
jXH9Go=



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2016 - 2021
OBRAS
PÚBLICAS

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/44204

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	18/01/2019 07:54:55 AM
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/01/2019
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	DICIEMBRE
Fuente de financiamiento:	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 2017
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

HZlcj1WSEc7/oSLIDEqNI1sVO1LOW9FfjA7avYzsJdQa+0LkQqM4cX4vw+/
AhJL+6bbxJ6Lki2HHqDUk8Es5JSVA4oDgy+JW9lrWYoYMovzAAXLyckm2SXj1xMXJrdB8S7ibBhCwhCp+
xyvR/DfebhMK0oBGX6DAIxEDvhUA5U=



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
**OBRAS
PÚBLICAS**

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exige de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/44427

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	18/01/2019 07:58:42 AM
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/01/2019
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	DICIEMBRE
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

q9u2mj+L766XmEsHGJ5pXT8RROI9IjczhVDSah24QgOT4bE4E1HTs6UR1shgKuQZxg5rGtpCJOIZkoAPSa
FEKQRQROiKykyqbv27U9wKAoxAApWBohqmkEB3f9vEqdb0tPmf6RKzZHDXhRiKBq0pYHbPhyWPCuJn
8IBazJE+Qw=



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
**OBRAS
PUBLICAS**

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/44425

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	18/01/2019 08:05:41 AM
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/01/2019
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	DICIEMBRE
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

Y47R+jk6lTbEc1rwqpEZiNP5L4aqLmqqs3AWPhUO2QkNXmypfoBtmavIzRe6JJC0tW0bFFbvGBnSBzOBn
MWIIWTHaLK1HltgJ1Wsq0wcW5o9x3eTaFS5EbihezqAk5CBNfunljkHYm+6Y/UUsh7FkSc+yF/
gtLjxtF5vhd4sfA=



"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/44207

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	18/01/2019 08:16:00 AM
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/01/2019
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	DICIEMBRE
Fuente de financiamiento:	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

CfinBbcJoLy4uT6nKzM5AMJDynjBBR2ihkPalK3O+JmtNXImHfRxcV26Zk+jfF6e+OxJcW0gPNWGUusyF0Z
WXjat/rU7EvcZr07w+/
UqK4VkinhQ3irCR5Y7SnFk1NfktZNX2zSiKrdvDMwvP7yJl7wTRm9uJ8aoHWLEp4BUeG4=



H. AYUNTAMIENTO
CONSEJO MUNICIPAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2016 - 2021
**OBRAS
PÚBLICAS**

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/44467

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	18/01/2019 08:20:13 AM
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/01/2019
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	DICIEMBRE
Fuente de financiamiento:	INTERESES FISMDF 2017
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

YChDVPah9oxgSf0q+xD4CwaBYrZLfs5AZWmuXsa5HewJRSjom8501+mjJuMKydSWWPDUZlpb3TzpqfPb9W7I/zxxBoSHg4jm3xHL1GLGIDbN0I9J5xBSxiLLI82myU+SEmGxeCiFr0MoEfEke9IYvaZglFAAOs5fiNLwOKdmdU=



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRAS
PÚBLICAS

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exige de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/44208

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	18/01/2019 08:22:48 AM
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/01/2019
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	DICIEMBRE
Fuente de financiamiento:	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

ISakOclH/mJz0tUEd42le5264DDfpN3fcHV1sE0Cne+xU5XNxaqVhXlxE4v8k6dmROSYyruSAf61+nIAo6/
niEWyyZDdLLK77P6gi5zfiP4icCX76n9TfUsIGojo3zp0pd05gaQVwCkPQNi+yIX0f4d2sN/
FdOOtaSWuAsFbM=



"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exige de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."

C.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUTIÉRREZ ZAMORA
PRESENTE

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACION

INFORMACION RECEPCIONADA: INFORMACION DE OBRA PUBLICA

PERIODO: DICIEMBRE

FECHA DE RECEPCION: 18/01/2019

FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA: 25/01/2019

INFORME ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO		COMENTARIOS MUNICIPIOS	RECEPCION	
	PDF	EXCEL		FECHA	HORA
OFICIO DE REMISIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA	✓		OFICIO 11 REMITE ESTADOS DE OBRA DICIEMBRE 2018	18/01/2019	13:34:49
ACTA DE SESIÓN DE CABILDO DE AUTORIZACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA	✓		ACTA 02 ESTADOS DE OBRA DICIEMBRE 2018	18/01/2019	13:36:15
RELACIÓN Y TOTAL DE OBRAS	✓		LISTA DE OBRAS MES DE DICIEMBRE 2018	18/01/2019	13:43:08
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (FORMATO 9)	✓		FORMA FOTOGRÁFICO DICIEMBRE 2018	18/01/2019	13:44:12
ESTADO MENSUAL DE OBRA POR CONTRATO (FORMATO 11)	✓		FORMA REPORTE DE CONTRATOS DICIEMBRE 2018	18/01/2019	13:47:02

El presente documento se emite en el caso de Estados Financieros y Estados de Obra Pública mensuales de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para las demás se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. No exime de solicitudes, se reciben documentos con reserva de Ley, este recibo no implica validación de la información.
