

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

1. REPORTE: 2
 13/01/2023

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE: CONSTRUCCION DE DOMO EN COLEGIO DE BACHILLERES, PLANTEL No. TREINTA Y OCHO, LOS CAMPOS VILLA GARCIA, ZACATECAS

LUGAR DE OBRA: LOS CAMPOS NUEVA

MODALIDAD EJE: ADJUDICACION DIRECTA

No. CONTRATO: CTO NO. 8 INVG-27-00-2022

EMPRESA: MARIA FERNANDA CARRELLLO GONZALEZ

MONTTO CONTRATO: \$ 1,464,896.24

ECHA CONTRATO: 27/06/2022

MONTTO ANTICIPO: \$ 436,405.57

ECHA PAGO ANTICIPO: 8-Jul-22

No. AMPL. DE CONTRATO: N/A

MONTTO AMPL. CONTRATO: N/A

ECHA AMPL. CONTRATO: N/A

PERIODO DE EJECUCION INICIO TERM.

FECHAS PROGRAMADAS: 20-Jun-22 16-ago-22

FECHAS REALES: 20-Jun-22 30-ene-22

FECHAS REPROGRAMADAS: 20-Jun-22 30-ene-22

OBSERVACIONES

000269

PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA		MESES												DÍAS	% EN BASE TIEMPO		
PARTIDAS	IMPORTE	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE									
PRELIMINAR	\$ 21,010.00																
ZAPATAS	\$ 104,630.00																
DADOS	\$ 71,620.00																
ESTRUCTURA	\$ 1,001,420.00																
UNICA	\$ 55,350.00																

RESIDENTE DE SUPERVISION


ING. JORGE ADRIAN BASTIDA GOMEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


HUMBERTO AGUILAR DAVILA

ING. JORGE ADRIAN BASTIDA GOMEZ

HUMBERTO AGUILAR DAVILA





GERAL
FISMA



MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

INFORME FOTOGRÁFICO

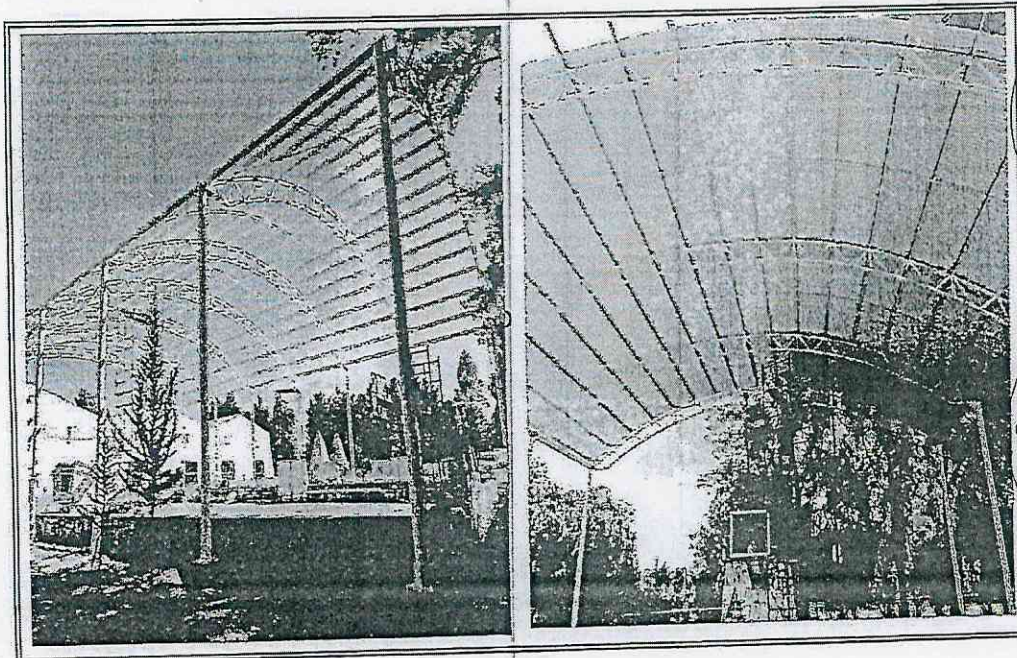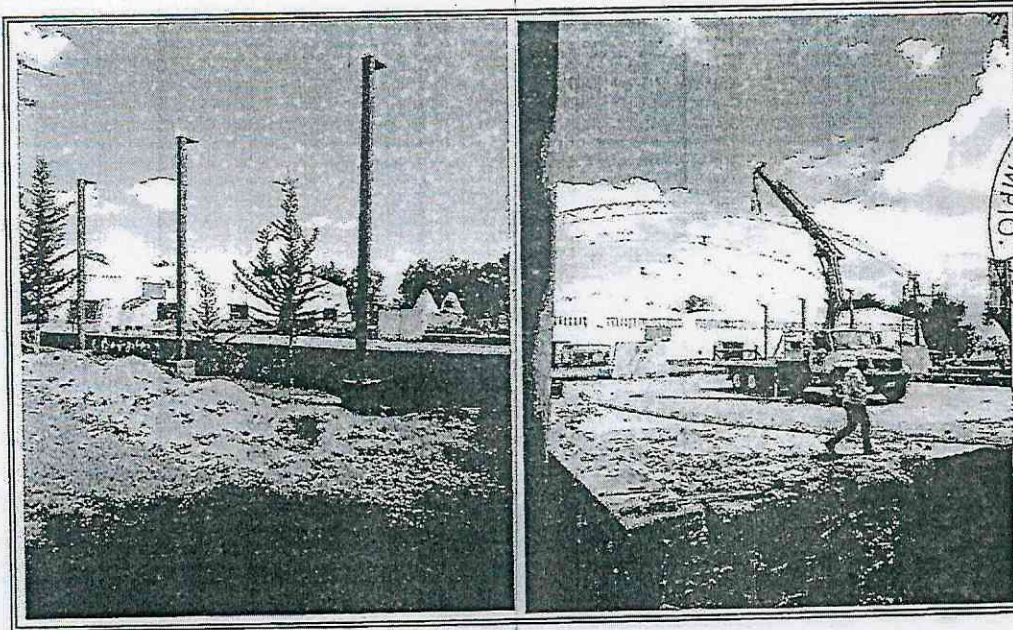

CONSTRUCCION DE DOMO EN COLEGIO DE BACHILLERES, PLANTEL No.
TREINTA Y OCHO, LOS CAMPOS VILLA GARCIA, ZACATECAS

OBRA:

LOCALIDAD:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

20-jun-22

LOS CAMPOS

19-ago-22

viernes 13 de enero de 2023

000270

OPERA
FISMA

BITÁCORA DE OBRA.

Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE DOMO EN COLEGIO DE BACHILLERES,
PLANTEL No. TREINTA Y OCHO, LOS CAMPOS VILLA GARCIA, ZACATECAS

Nota 1: Se inicia la limpa de la zona para la excavacion de las cepas,
procediendo a la demolición de muro de mamposteria que obstruyen la
excavacion de las cepas.

Nota 2: Se inicia la excavacion de las cepas, con la ayuda de rompedor
electrico, y con equipo de corte de disco en concreto existente.

Nota 3: Da inicio la formacion de las parrillas para cada zapata, con
varillas de 1/2" y 3/8

Nota 4: Se terminaron de cimentar las parrillas, así como la simbra para la
cimentación de cada dado.

Nota 5: Se colocan las placas de acero en cada dado, así como la
colocación de postes estructurales de tubo de 8" por 6 metros de largo
cada uno, esto con ayuda de grua hidraulica.

Nota 6: Se da inicio a la elevacion de estructura principal tipo cabrillas de
21 mts, para ensamblarlas en los postes estructurales, con ayuda de un
camion fletero con grúa.

Nota 7: Se da comienzo a montar los montenes en STRUT doble de 5" *
2", en para toda la techumbre

Nota 8: Se finalizaron de colocar montenes estructurales, y se empieza
con el montaje de laminas con un 50% de total de superficie



000271
