



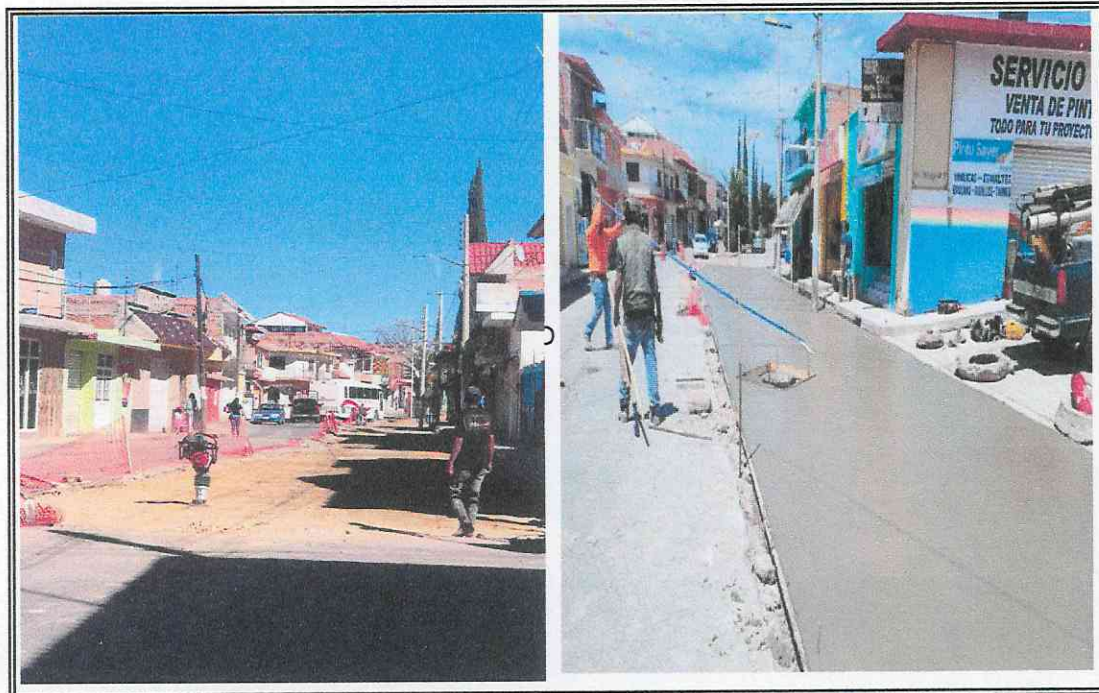

MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

INFORME FOTOGRÁFICO

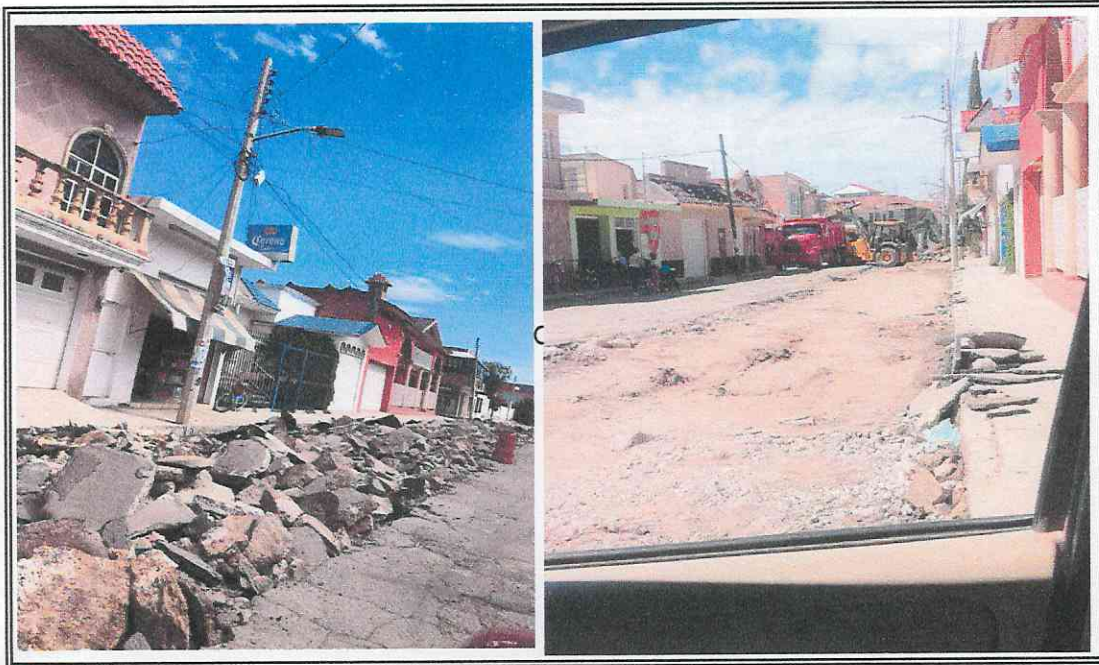

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO SUR, VILLA GARCÍA, ZACATECAS

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO
FECHA
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE): 50%

CALLE HIDALGO SUR, CABECERA MUNICIPAL
19-feb-24 | TERMINO
Jueves, 4 de abril de 2024

BITÁCORA DE OBRA.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO SUR, VILLA GARCÍA, ZACATECAS

NOTA 1:

INICIO DE OBRA SE INICIA CON DEMOLICION DE CONCRETO Y CARPETA ASFALTICA CON MAQUINARIA

NOTA 2:

SE CONCLUYE DEMOLICION DE CONCRETO PRIMERA MITAD DE CALLE Y A SU VEZ RECOLECCION DE ESCOMBRO PARA LIBERAR TRAMO

NOTA 3:

SE FINALIZA LA RECOLECCION DE ESCOMBRO.

NOTA 4:

SE REALIZAN TRABAJOS TOPOGRAFICOS PARA REVISION DE NIVELES DE TERRACERIA, REVISION DE MARCADO DE NIVELES DE PISO TERMINADO

NOTA 5:

REVISION DE COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON BAILARINA Y VIBROCOMPACTADOR MANUAL

NOTA 6:

SE REALIZA PREPARADO DE CAJON PARA COLAR EL CUAL CONSTA DE UNA BASE DE HULE Y MALLA ELECTROSOLDADA.

NOTA 7:

SE COMENZO CON EL TIRADO DE CONCRETO HIDRAULICO CONS SUS RESPECTIVOS ACABADOS

NOTA 8:

VISITA DE OBRA PARA VERIFICAR LOS CORTES DE CONCRETO Y FINALIZAR LA PRIMERA PARTE DE LA CALLE
