



II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!

¡YA ES HORA DE CREER EN TI!
ESPERANZA
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL
Y COMBATE A LA POBREZA



INFORME MENSUAL DE ESTADO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES

ABRIL 2018



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!

¡YA ES HORA DE CREER EN TI!
ESPERANZA
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL
Y COMBATE A LA POBREZA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA.
OFICIO No. P-2018/25/05-0337
ASUNTO: REPORTE MENSUAL DEL
MES DE ABRIL

C.P.C LORENZO ANTONIO PORTILLA VÁSQUEZ
AUDITOR GENERAL TITULAR DEL ORGANO
DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO.
PRESENTE:

El que suscribe **C. Ing. Wilman Monje Morales**, Presidente Municipal Constitucional de Gutiérrez Zamora, Ver.; por medio del presente, me dirijo a Usted para hacer de conocimiento que en cumplimiento a lo que establece el artículo 30 de la *Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*, así como *Las Reglas de Carácter General para el cumplimiento de la Presentación de Información Municipal a través de Medios Electrónicos* al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz; me permito presentar a Usted el **Estado de Obra Pública correspondiente al mes de Abril 2018**, de todos los fondos generados en el Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), así como el acta de cabildo donde fueron aprobados.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Gutiérrez Zamora, Ver.; a Viernes 25 de Mayo de 2018.

ATENTAMENTE


ING. WILMAN MONJE MORALES.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE GUTIÉRREZ ZAMORA.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
PRESIDENCIA

c.c.p. el archivo



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!

YA ES HORA DE CREER EN TI
ESPERANZA
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL
Y COMBATE A LA POBREZA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA.
OFICIO No. P-2018/25/05-0336
ASUNTO: REPORTE MENSUAL DEL
MES DE ABRIL

DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SÁINZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
LXIV LEGISLATURA DEL ESTADO
XALAPA, VERACRUZ.
PRESENTE:

El que suscribe **C. Ing. Wilman Monje Morales**, Presidente Municipal Constitucional de Gutiérrez Zamora, Ver.; por medio del presente, me dirijo a Usted para hacer de conocimiento que en cumplimiento a lo que establece el artículo 30 de la *Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*, así como *Las Reglas de Carácter General para el cumplimiento de la Presentación de Información Municipal a través de Medios Electrónicos* al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz; me permito presentar a Usted el **Estado de Obra Pública correspondiente al mes de Abril 2018**, de todos los fondos generados en el Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), así como el acta de cabildo donde fueron aprobados.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Gutiérrez Zamora, Ver.; a Viernes 25 de Mayo de 2018.

ATENTAMENTE


ING. WILMAN MONJE MORALES.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE GUTIÉRREZ ZAMORA.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
PRP

c.c.p. el archivo



Cabildo

**ACTA NUMERO 35 SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VERACRUZ**

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO efectuada por el Honorable Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz, a las NUEVE horas del QUINCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, de conformidad con lo que disponen los Artículos 36, Fracción I, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz-Llave.- Preside el C. Wilman Monje Morales Presidente Municipal, con quórum integrado por los ciudadanos: C. Rosa María Ortega González, Sindica Única; C. Gonzalo Quiñones López Regidor Primero, Silviana Rodríguez Martínez Regidora Segunda, Francisco Hatzel Gómez Ochoa Regidor Tercero, Rosalía García Guerrero Regidora Cuarta. El C. Presidente Municipal, C. Wilman Monje Morales, declara abierta la Sesión, acto seguido, el Secretario del H. ayuntamiento, procede a pasar lista de asistencia, declarando quórum legal. Inmediatamente da lectura al Orden del Día, misma que a la letra dice:-----

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.-----
- 2.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.-----
- 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-----
- 4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018.-----
- 5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PUBLICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018.-----
- 6.- ASUNTOS GENERALES.-----


Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, C. WILMAN MONJE MORALES, pregunta al Cuerpo Edilicio si están de acuerdo en aprobar el Orden del Día.- ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.-----

CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA APROBADO Y AGOTADOS LOS PUNTOS 1, 2 y 3 SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO.-----

4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018.-----

En uso de la voz la C. Kitzia Eunice Juárez Salazar, Tesorera Municipal, informa al

(Handwritten signatures and marks on the right margin)



cabildo los Estados Financieros del mes de Abril de 2018, acorde a lo establecido en el artículo 45 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre, mismos que fueron preparados por la Tesorería Municipal, en términos del artículo 72 fracción XIII de la misma Ley. En uso de la voz el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al cabildo si son de aprobarse los estados financieros correspondientes al mes de Abril del año 2018.-----

El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO.- Se aprueban los Estados Financieros correspondientes al mes de Abril del año 2018. APROBADO POR UNANIMIDAD. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.-----

5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PUBLICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018.------

En uso de la voz el C. Arq. Antonio Ríos Pérez, Director de Obras Públicas; informa al cabildo los Estados de Obra Pública del mes de Abril de 2018, acorde a lo establecido en el artículo 73 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre. En uso de la voz el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al cabildo si son de aprobarse los estados de Obra correspondientes al mes de Abril del año 2018. El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO.- Se aprueban los Estados de Obra Pública correspondientes al mes de Abril del año 2018. APROBADO POR UNANIMIDAD. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.-----

6.- ASUNTOS GENERALES.------
No hubo asuntos generales.-----

Posterior a ello, el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal, en los términos que marca la Ley, en uso de la voz, hace del conocimiento de los miembros del cabildo que se agotaron los asuntos del orden del día de esta trigésima quinta sesión ordinaria del H. Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz.

7.- CLAUSURA.------

Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS, DEL DÍA QUINCE DE MAYO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA QUE FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS CIUDADANOS EDILES QUE EN ELLA INTERVINIERON ANTE EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, QUE AUTORIZA Y DA FE. REMÍTASE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA AL H. CONGRESO DEL ESTADO-----


(Handwritten signatures and initials on the right margin)



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
BRILLA CON FUERZA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021



C. 

WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL




H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCION
GUTIÉRREZ ZAMOR
2018 - 2021
BRILLA CON FUERZA I
REGIDURIA PRIMERA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
SINDICATURA

C. 

ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICA ÚNICA

C. 

GONZALO QUIÑONES LÓPEZ
REGIDOR PRIMERO




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
BRILLA CON FUERZA I

C. 
SYLVIANA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
REGIDORA SEGUNDA


REGIDURIA SEGUNDA




C. 
FRANCISCO HATZEL GÓMEZ OCHOA
REGIDOR TERCERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
BRILLA CON FUERZA I
REGIDURIA TERCERA



C. 
ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA

C. 

JORGE CHENA BATRES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021

SECRETARÍA



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/36024

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/05/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/05/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	ABRIL
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

Ng5q4QETf9Pm1Q2d/
Mpvv5DzGN4AnCbC76Ekp26b5x9gAWUsPW+KZbueuork99KD2abUIQeVJjcGNUGo3lboqAJkl/
JYbSH9T0sFgwoylcCNSxC8ph9GjsWmliltOxKhXbYcWqXroSine7jOG3+qLL8PRoPdK6V4tqYdwWwqGDw
=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”

Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/36024

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690101	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA DE LA RIBERA ENTRE PUENTE TECOLUTLA Y PUERTO CABALLERO	No	No	No	No
2018300690102	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO CORONADO - LOMAS CHICAS	Sí	Sí	Sí	No
2018300690103	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRILES - EL CEPILLO	No	No	No	No
2018300690104	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRILES - SAN ANTONIO CORONADO	Sí	Sí	Sí	No
2018300690105	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: RAFAEL VALENZUELA-LOMAS CHICAS	No	No	No	No
2018300690106	REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO EN CALLES NIÑOS HÉROES, EMILIANO ZAPATA Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL EJIDO SOTO Y GAMA	Sí	Sí	Sí	No
2018300690107	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, CLAVE: 30DPR5104U COL. ASOCIACIÓN CIVIL.	No	No	No	No
2018300690110	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 109, COLONIAS DEL CARMEN, MURILLO VIDAL, HERNÁNDEZ OCHOA	No	No	No	No
2018300690111	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 151, COLONIAS REVOLUCIÓN, HIDALGO, HIDALGO SEGUNDA SECCIÓN, NIÑOS HÉROES	No	No	No	No
2018300690112	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 202, COLONIAS PRIMERO DE MAYO, AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO Y FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS	No	No	No	No
2018300690113	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 185, COLONIA CUAUHTLAN	No	No	No	No



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/36024

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690114	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 019A, COLONIAS EL PORVENIR, ASOCIACIÓN CIVIL PRIMERO DE MAYO Y AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO.	No	No	No	No
2018300690115	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 096, COLONIAS CUAUHEMOC, LOS PINOS, Y SAN FRANCISCO	No	No	No	No
2018300690116	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 217, COLONIAS FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, LUIS DONALDO COLOSIO Y GUADALUPE	No	No	No	No
2018300690117	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADA EN VIVIENDAS DE AGEB 109, COLONIAS DEL CARMEN, MURILLO VIDAL, HERNÁNDEZ OCHOA	No	No	No	No
2018300690118	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADA EN VIVIENDAS DE AGEB 151, COLONIAS REVOLUCIÓN, HIDALGO, HIDALGO SEGUNDA SECCIÓN, NIÑOS HÉROES.	No	No	No	No
2018300690119	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADA EN VIVIENDAS DE AGEB 202, COLONIAS PRIMERO DE MAYO, AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO Y FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS	No	No	No	No
2018300690120	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADA EN VIVIENDAS DE AGEB 185, COLONIA CUAUHTLAN	No	No	No	No
2018300690121	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADA EN VIVIENDAS DE AGEB AGEB 096, COLONIAS CUAUHEMOC, LOS PINOS, Y SAN FRANCISCO	No	No	No	No
2018300690122	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADA EN VIVIENDAS DE 019A, COLONIAS EL PORVENIR, ASOCIACIÓN CIVIL PRIMERO DE MAYO Y AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO	No	No	No	No
2018300690123	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADA EN VIVIENDAS DE AGEB 217, COLONIAS FERNANDO GUTIERRES BARRIOS, LUIS DONALDO COLOSIO Y GUADALUPE	No	No	No	No



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/36024

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690108	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL ENRIQUE RODRIGUEZ CANO CLAVE: 30DPR0616M, LOCALIDAD EL COCO	No	No	No	No
2018300690109	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE DR. ALEJANDRO CERISOLA EN CABECERA MUNICIPAL.	Sí	Sí	Sí	No

EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/36024



SELLO DIGITAL:

Ng5q4QETf9Pm1Q2d/Mpw5DzGN4AnCbC76Ekp26b5x9gAWUsPW+KZbueMork99KD2abUIQeVJjcGNUGo3lboqAJkI/JYbSH9T0sFgwoyicCNSxC8ph9GjsWmliltOxKhXbYcWqXroSine7jOG3+qLL8PRoPdK6V4tqYdwWwqGDw=



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/36030

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/05/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/05/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	ABRIL
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

O7hE420whwFwFi4+JZdwRW5U/
K1Ff4X2AEPA4BkbdwZ2tc8XxShEcJuj0JgsS8rMfGSAUpVLkaLEJcN2Mo2QNfIDpvPngKX6RuA7A11VvVH
eS534v1B0etpLAIdeN4IKkDv9ThwDtDT5eutTwQr2Wjx5TtQDBGPXsoTUY+QRALw=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/36030

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690225	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES Y OBRAS DE ACCESO EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, GALERAS DE LA FERIA Y LIENZO CHARRO.	No	No	No	No
2018300690226	REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL	No	No	No	No

EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/36030

SELLO DIGITAL:

O7hE420whwFwFi4+JZdwrW5U/K1F4X2AEP4BkbdwZ2tc8XxShEcluj0JgsS8rMfGSAUpVLkaLEJcN2Mo2QNfIDpvPngKX6RuA7A11VvVHeS534v1B0etpLAIdeN4IKkDv9ThwDtdt5eutTwQr2Wjx5TtQD8GPXsoTUY+QRALw=



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/35924

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/05/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/05/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	ABRIL
Fuente de financiamiento:	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

LgOF/Nj93iNjW62xfVinWtf0qzBLUEbiUAoJ0ScgNzqR3LWlqXc+B+RE9WBdBOvbZ+JoQI+XjJR/
NPYnmIZIGW1jRiDJ3IRvNn1BWB4cl5nRI+/liNEabOK5aUsuruOvDKcuTrV5/aQAId/W+DCZK8otBpi0bvC+/J/
Zyp+tAdY=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/35924

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690302	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE MUNICIPAL EN COLONIA CUAHUTÉMOC, EN CABECERA MUNICIPAL	No	No	No	No

EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/35924



SELLO DIGITAL:

LgOF/Nj93iNJW62xfVinWtf0qzBLUEbiUAoJDScgNzqR3LWIqXc+B+RE9WBdBOvbZ+JoQl+XjJR/NPYnmiZlGW1jRiDj3IRvNn1BWB4d5nRI+/iIEabOK5aUsuruOvDKcuTrV5/aQAld/W+DCZK8otBpi0bvC+/)/Zyp+tAdY=



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/35923

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/05/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/05/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	ABRIL
Fuente de financiamiento:	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

KEqYj3McVEERGUtw3q42BmMJXaWIY3sRVY3OnAsP7DtN4IHVWxWbQMEQMbC738/Zb4Pi64yH+/O/
bQp9H4agtWuxsgxuiPK/
hxlTtS0r2CbnGIFjDwnXixQRvIaH6DmVBkj+cev+A5dPsesSEQGLSI4xJ4oFgMVCe6MRiO40/6g=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/35923

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690301	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL "INFRAESTRUCTURA VIAL" EN LA CABECERA MUNICIPAL	No	No	No	No

EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/35923



M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRAS
PUBLICAS

SELLO DIGITAL:

KEqYj3McVEERGUtw3q42BmMjXaWiy3sRvY3OnAsP7DtN4IHVWxWbQMEQMbc738/Zb4Pi64yH+/O/bQp9H4agtWuxsgxuiPK/hxITt50r2CbnGIFJdwnXixQRvIaH6DmVBkj+cev+A5dPsesSEQGLS14xJ4oFgMVce6MRIO40/6g=



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/35936

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/05/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/05/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	ABRIL
Fuente de financiamiento:	INTERESES FISMDF 2017
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

Rm0CPI6CV8jmnZCgFWg8LLi+OjfFd5j5erFa73WfrkkzfstqxjNjJksxbS1kiOsTWySsFsurVqk5G0Px3u3U2ARnQl36pVtqcjchUuqPdglllgtLnLyAaPkTb8e7nNhGlrWUp9s5t4R3q7yKBDVVaVqHZB446juOY+RZtl2yJ9gA=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/35936

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690050	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO EN SECCIONES AISLADOS "BACHEO", EN LA CABECERA MUNICIPAL.	No	No	No	No

EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/35936



EL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRAS
PÚBLICAS

SELLO DIGITAL:

Rm0CPI6CV8jmnZCgFWg8LLi+DjffD5j5erFa73WfrkkzfstqxjNjjksxbS1kiOsTWySsFsurVqlc5GDPx3u3U2ARnQI36pVtqcjCHUqPdgIullgtNlyAaPktB8e7nNhGlrWUp9s5t4R3q7yKBDVVaVqHZB446juOY+RZtl2yJ9gA=



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	LOMAS CHICAS	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690102.00	Periodo:	ABRIL	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO CORONADO - LOMAS CHICAS			Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA I
				Fecha de revisión:	15/05/2018



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

TERMINADA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
**OBRAS
PUBLICAS**

ING. LEONEL RODRÍGUEZ RÍOS
INGENIERO

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	LOMAS CHICAS	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690102.00	Periodo:	ABRIL	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO CORONADO - LOMAS			Fuente de Financiamiento:	MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	15/05/2018



FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:



FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

TERMINADO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
**OBRAS
PÚBLICAS**


ING. LEONEL RODRÍGUEZ RÍOS

IN GENIERO

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	SAN ANTONIO CORONADO	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690104.00	Periodo:	ABRIL	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRILES - SAN ANTONIO CORONADO			Fuente de financiamiento:	OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	15/05/2018



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

TERMINADO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
**OBRAS
PÚBLICAS**

ING. LEONEL RODRÍGUEZ RÍOS
INGENIERO

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	SAN ANTONIO CORONADO	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690104.00	Periodo:	ABRIL	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRILES - SAN ANTONIO CORONADO			Fuente de financiamiento:	OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	15/05/2018



FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:



FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

TERMINADO



ING. LEONEL RODRÍGUEZ RÍOS

INGENIERO

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio: GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad: EJIDO SOTO Y GAMA	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2018
No. de obra: 2018300690106.00	Periodo: ABRIL	Número de estimación: 1.00
Descripción: REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO EN CALLES NIÑOS HÉROES, EMILIANO ZAPATA Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL EJIDO SOTO Y GAMA		Fuente de financiamiento: OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
		Fecha de revisión: 15/05/2018



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

TERMINADO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
**OBRAS
PUBLICAS**

ING. LEONEL RODRÍGUEZ RÍOS
INGENIERO

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio: GUTIÉRREZ ZAMORA **Localidad:** EJIDO SOTO Y GAMA **Ejercicio fiscal:** EJERCICIO 2018
No. de obra: 2018300690106.00 **Periodo:** ABRIL **Número de estimación:** 1.00
Descripción: REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO EN CALLES NIÑOS HÉROES, EMILIANO ZAPATA Y **Fuente de Financiamiento:** OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
Fecha de revisión: 15/05/2018



FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:



FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

TERMINADO



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
 2018 - 2021
**OBRAS
 PÚBLICAS**

ING. LEONEL RODRÍGUEZ RÍOS

INGENIERO

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690109.00	Periodo:	ABRIL	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE DR. ALEJANDRO CERISOLA EN CABECERA			Fuente de financiamiento:	OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	15/05/2018



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

TERMINADO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
OBRAS
PUBLICAS

ING. NORBERTO JUÁREZ MEJIA
INGENIERO
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690109.00	Periodo:	ABRIL	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO			Fuente de Financiamiento:	OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	15/05/2018



FOTO (12)
Concepto de obra ejecutado:

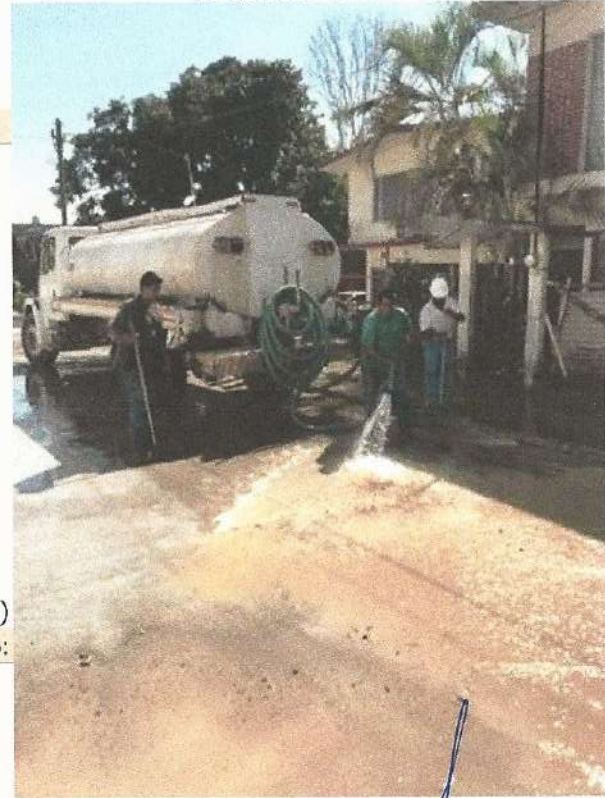


FOTO (13)
Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

TERMINADO



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
**OBRAS
PÚBLICAS**

ING. NORBERTO JUÁREZ MEJIA

INGENIERO

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

FECHA DE ELABORACIÓN:
16/04/2018
MES QUE SE REPORTA
ABRIL

EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA LOCALIDAD: LOMAS CHICAS DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO CORONADO - LOMAS CHICAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES F No. DE OBRA: 2018300690102

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:

TIPO DE ZONA: RURAL X URBANA

CLAVE AGEB: N/A

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI NO

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI NO

GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO X BAJO MUY BAJO

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA INDIRECTA COMPLEMENTARIA X

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA: LATITUD 0.00000000 LONGITUD 0.00000000

PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO CORONADO - LOMAS CHICAS

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
RASTREO Y CUNETEO, EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE BANCO DE SABANA Y DE RIO, ESCARIFICADO Y ACAMELLONADO, TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO DE SUPERFICIE, COMPACTADO.

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE			FACTURAS				
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ANTICIPO	\$387,500.00	2	\$387,500.00	30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,500.00
ESTIMACIÓN UNIC	\$384,159.48	3	\$384,159.48	55	\$775,000.00	\$387,500.00	\$3,340.52	\$0.00	\$384,159.48
TOTALES	\$771,659.48		\$771,659.48		\$775,000.00	\$387,500.00	\$3,340.52	\$0.00	\$771,659.48

MONTO AUTORIZADO: \$775,000.00 C/IVA

MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$775,000.00 C/IVA

VALIDACIÓN DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X

DEPENDENCIA QUE VALIDA:

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X

DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:

TIPO DE LICITACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA X

NO. DE CONTRATO: ICO-AR 002-FISM DF/2018 30 069 01 (FECHA: 02/03/2018)

CONTRATISTA: ISABEL SALAZAR ESPINOSA

MONTO CONTRATADO: \$775,000.00 C/IVA

PERIODO DE EJECUCIÓN: PROGRAMADA REAL INICIO 01/02/2018 05/03/2018 TÉRMINO 15/12/2018 30/03/2018 DÍAS 25 25

ANTICIPO: APLICA X NO APLICA MONTO: \$387,500.00 PORCENTAJE: 50.00 FECHA DE PAGO: 13/03/2018

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$775,000.00	09/04/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$775,000.00	09/04/2018
FINIQUITO:	\$384,159.48	09/04/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:
TERMINADA SIN FINIQUITAR

*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRAS
PÚBLICAS

ING. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ING. EDUARDO RODRIGUEZ RIOS
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACION:
16/04/2018
MES QUE SE REPORTA
ABRIL

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA LOCALIDAD: SAN ANTONIO CORONADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES No. DE OBRA: 2018300690104 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRILES - SAN ANTONIO CORONADO

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL:
TIPO DE ZONA: RURAL X URBANA CLAVE AGE: N/A MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO X MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO SI X NO DIRECTA INDIRECTA COMPLEMENTARIA X
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA: LATITUD 20.44126017 LONGITUD -97.13408624 PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRILES - SAN ANTONIO CORONADO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:

RASTREO Y CUNETEO, EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE BANCO DE SABANA Y DE RIO, ESCARIFICADO Y ACAMELLONADO, TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO DE SUPERFICIE, COMPACTADO.

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ANTICIPO	\$200,000.00	2	\$200,000.00	28	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
ESTIMACIÓN ÚNICA	\$198,275.86	3	\$198,275.86	57	\$400,000.00	\$200,000.00	\$1,724.14	\$0.00	\$198,275.86
TOTALES	\$398,275.86		\$398,275.86		\$600,000.00	\$200,000.00	\$1,724.14	\$0.00	\$398,275.86

MONTO AUTORIZADO: \$400,000.00 C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$400,000.00 C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:
TIPO DE LICITACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA EXISTE X
INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS
LICITACIÓN PÚBLICA

NO. DE CONTRATO: CO-AD 004-FISM DF/2018 30 069 011 FECHA: 02/03/2018
CONTRATISTA: ISRAEL SALAZAR ESPINOSA
MONTO CONTRATADO: \$400,000.00 C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN: PROGRAMADA REAL
INICIO 01/02/2018 05/03/2018
TÉRMINO 15/12/2018 30/03/2018
DÍAS 25 25
ANTICIPO: APLICA X NO APLICA
MONTO: \$200,000.00 PORCENTAJE: 50.00
FECHA DE PAGO: 13/03/2018

REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$200,000.00	13/03/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$200,000.00	13/03/2018
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FISICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO: \$200,000.00 \$34,482.76 \$34,482.76
AFIANZADORA: rta, S.A de C.V. Grupo Firta, S.A de C.V. Grupo Firta, S.A de C.V. Grupo Firta
No. DE FIANZA: 3900-02484-0 3900-02485-5 3900-02494-7
FECHA: 02/03/2018 02/03/2018 05/04/2018
CONVENIO MODIFICATORIO: MONTO EXISTE IMPORTE/PERIODO FECHA
PLAZO INICIAL FINAL
NO APLICA
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: \$400,000.00 C/IVA

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ DIRECTOR DE OBRAS
ING. LEONEL RODRIGUEZ RIOS SUPERVISOR

FORMATO 11



**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACION: 16/04/2018
MES QUE SE REPORTA ABRIL

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: EJIDO SOTO Y GAMA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN CALLES NIÑOS HEROES, EMILIANO ZAPATA Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL EJIDO SOTO Y GAMA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES F	No. DE OBRA: 2018300690105	

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:					
TIPO DE ZONA:	RURAL X URBANA	CLAVE AGE:	N/A	GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI X NO	SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI X NO	MUY ALTO	ALTO MEDIO X BAJO MUY BAJO
TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:					
			DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA X
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA					PROYECTO ESPECIAL
LATITUD	20.42544105	LONGITUD	-97.05118418	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI NO X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO EN CALLES NIÑOS HÉROES, EMILIANO ZAPATA Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL EJIDO SOTO Y GAMA

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

RASTREO Y CUNETEO, EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE BANCO DE SABANA Y DE RIO, ESCARIFICADO Y ACAMELLONADO, TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO DE SUPERFICIE, COMPACTADO.

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACION UNIC	\$395,310.00	7	\$195,951.08	178	\$395,310.00	\$197,655.00	\$1,703.92	\$0.00	\$195,951.08
ANTICIPPO	\$197,655.00	006	\$197,655.00	174	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,655.00
TOTALES	\$592,965.00		\$393,606.08		\$395,310.00	\$197,655.00	\$1,703.92	\$0.00	\$393,606.08

MONTO AUTORIZADO:	\$395,310.00	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$395,310.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	licitación pública	EXISTE X

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$195,951.08	06/04/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$395,310.00	06/04/2018
FINIQUITO:	\$195,951.08	06/04/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	80	20	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	80	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRAS
PUBLICAS**

NO. DE CONTRATO:	IGTZ-AD 06-FISM DF/2018 30 069 010	FECHA:	12/03/2018
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA DE ALBA EN EL GOLFO S.A DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$395,310.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/02/2018	15/03/2018
	TÉRMINO	15/12/2018	
	DÍAS	0	0
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$197,655.00	PORCENTAJE: 50.00
	FECHA DE PAGO:	20/03/2018	
TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$197,655.00	\$34,078.45	\$39,531.00
AFIANZADORA:	CE Fianzas Monterrey, S. de CV Fianzas Monterrey, S. de CV Fianzas Monterrey, S. de CV		
No. DE FIANZA:	18889716	1889719	1894269
FECHA:	12/03/2018	12/03/2018	04/04/2018
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO	INICIAL	FINAL
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:			C/IVA

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ING. LEONEL RODRIGUEZ RÍOS
SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACION:
16/04/2018
MES QUE SE REPORTA
ABRIL

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA LOCALIDAD: GUTIERREZ ZAMORA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE DR. ALEJANDRO CERISOLA EN CABECERA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES No. DE OBRA: 2018300690109

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI NO

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO

TIPO DE ZONA: RURAL CLAVE AGEB: N/A SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI NO SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI NO

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA INDIRECTA COMPLEMENTARIA

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA: LATITUD 20.460777 LONGITUD -97.08291453 PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE DR. ALEJANDRO CERISOLA EN CABECERA MUNICIPAL.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN EN CEPA, CARGA CON MAQUINARIA, ACARREO, NIVELACIÓN DE TUBO, RELLENO EN CAPAS, PAVIMENTO DE CONCRETO

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACIÓN UNIC	\$467,974.15	1	\$467,974.15	A-29	\$470,000.00	\$0.00	\$2,025.86	\$0.00	\$467,974.15
TOTALES	\$467,974.15		\$467,974.15		\$470,000.00	\$0.00	\$2,025.86	\$0.00	\$467,974.15

MONTO AUTORIZADO: \$400,000.00 C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$400,000.00 C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA: EXISTE NO EXISTE NO APLICA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: EXISTE

TIPO DE LICITACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS
LICITACIÓN PÚBLICA

NO. DE CONTRATO: IGZ-AD 07-FISM DF/2018 30 069 01(FECHA: 14/03/2018
CONTRATISTA: GRUPO CARDEÑA DE VERACRUZ S.A DE C.V.
MONTO CONTRATADO: \$470,000.00 C/IVA

PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA		REAL	
	INICIO	TÉRMINO	INICIO	TÉRMINO
DÍAS	01/02/2018	15/12/2018	19/03/2018	26/03/2018
	30		8	

APLICA NO APLICA
MONTO: PORCENTAJE:
FECHA DE PAGO:

REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$467,974.15	02/04/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$470,000.00	02/04/2018
FINIQUITO:	\$467,974.15	02/04/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES: TERMINADA

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
OBRAS
PÚBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO:
MONTO PLAZO NO APLICA
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: \$470,000.00 C/IVA
Arq. ANTONIO RIOS PEREZ DIRECTOR DE OBRAS
ING. NORBERTO BARRERA MEJIA SUPERVISOR
FORMATO 11
