





# OPERADO EISM

MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



## INFORME FOTOGRÁFICO

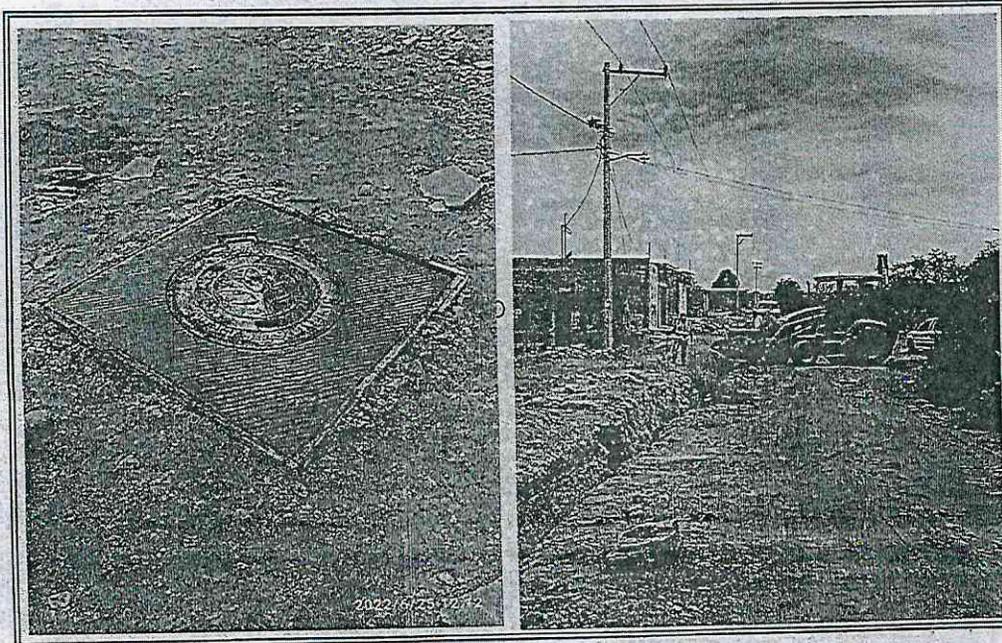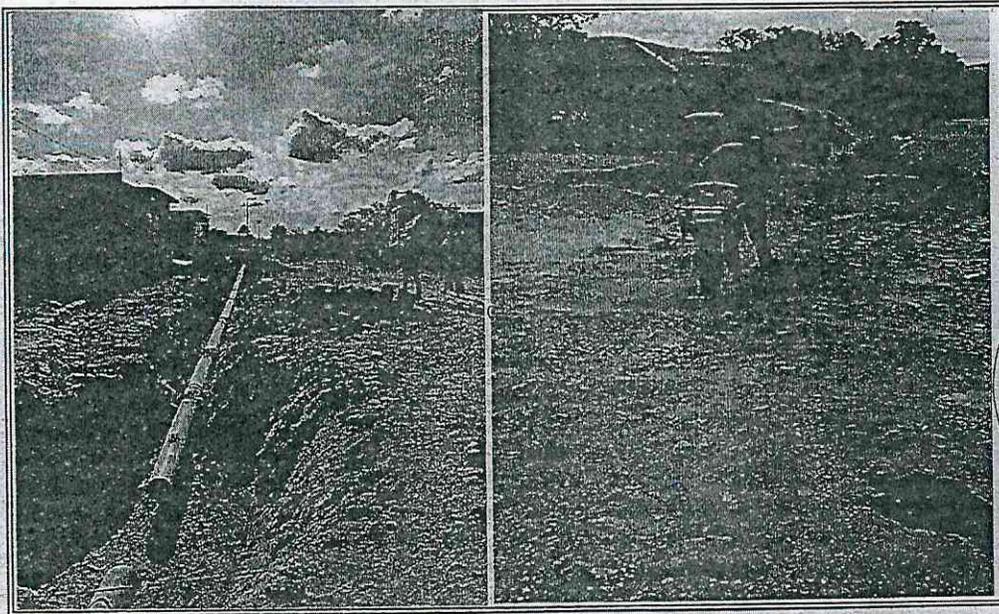

SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN  
CALLE LA LUZ, COLONIA NIEVES, CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA,  
ZACATECAS

OBRA:  
LOCALIDAD:  
PERIODO DE EJECUCIÓN:

CALLE LA LUZ, COLONIA NIEVES, CABECERA MUNICIPAL  
25/06/2022 07/07/2022

000155

**OPERADOS  
FISM**

## BITÁCORA DE OBRA.

**Nombre de la obra: Construcción de Drenaje en Calle la Luz segunda Etapa.**

**Nota 1: 06 de Junio del 2022.**

Con esta nota se da por iniciada la obra por construcción de drenaje en la Calle la Luz segunda etapa con trazo y nivelación de terreno.

**Nota 2: 08 de Julio del 2022**

Se informó a la supervisión que con esta fecha de inicio la excavación en material tipo tres (roca) para lograr la profundidad nos vemos en la necesidad de ampliar la zanja a .80 por que las rocas salen grandes y no es posible respetar el .65mts que viene en el proyecto.

**Nota 3: 09 de Junio del 2022**

En referencia a la nota 2 donde la contratista nos pide autorización para ampliación de zanja en .80 cm se autoriza para su ajuste en los tramos necesarios conforme al avance de obras.

**Nota 4: 13 de Junio del 2022**

Se continúa con la excavación con una maquina Caterpillar 320 con roto martillo de 6" la cuña n roca cerrada.

**Nota 5: 13 de Junio del 2022**

Se continúa con trabajos de excavación, se reciben generadores para la estimación 1 se procede a la revisión física para verificar el avance en obra.

**Nota 6: 16 de Junio del 2022**

Con esta fecha se recibe pago de primera estimación, se continúa con excavación de línea de alcantarillado y donde se solicita a supervisión nos indique donde se construirán las descargas para ubicarlas.

**Nota 7: 20 de Junio del 2022**

Se continúa con los trabajos de supervisión con el trabajo de colocación de plantilla en zanja, marcaje de niveles en varilla así como la colocación de tubo de drenaje al igual que la construcción de pozos de visita

**Nota 8: 22 de Junio del 2022**

Se continúa con trabajos con roto martillo debido al tipo de suelo existente en algunos tramos de zanja, a su vez el inicio de tramo se continúa con los trabajos de colocación de plantilla, nivelación y colocación de tubo.

**Nota 9: 24 de Junio del 2022.**

Se concluyen trabajos de red de alcantarillado con relleno y compactación al igual que la colocación de tapas en pozos de visita.

**Nota 10: 07 de Julio del 2022.**

Se concluyen trabajos de red de alcantarillado, con la limpieza general de la obra, sacar escombros a tiradero oficial

