



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!

¡YA ES HORA DE CREER EN TI!
ESPERANZA
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL
Y COMBATE A LA POBREZA



INFORME MENSUAL DE ESTADO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES

MARZO 2018



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA.
OFICIO No. P-2018/25/04-0283
ASUNTO: REPORTE MENSUAL MARZO

DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SÁINZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
LXIV LEGISLATURA DEL ESTADO
XALAPA, VERACRUZ.
P R E S E N T E :

El que suscribe **Ing. Wilman Monje Morales**, Presidente Municipal Constitucional de Gutiérrez Zamora, para cumplir por medio del presente lo establecido en el artículo 30 de la *Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*; así como *Las Reglas de Carácter General para el cumplimiento de la Presentación de Información Municipal a través de Medios Electrónicos* al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz; presento ante Usted el **Estado de Obra Pública correspondiente al mes de Marzo 2018**, generado en el sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), así como el acta de cabildo donde fueron aprobados.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Gutiérrez Zamora, Ver.; a Miércoles 25 de Abril de 2018.

A T E N T A M E N T E



ING. WILMAN MONJE MORALES.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE GUTIÉRREZ ZAMORA.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
PRESIDENCIA



**DEPENDENCIA: PRESIDENCIA.
OFICIO No. P-2018/25/04-0284
ASUNTO: REPORTE MENSUAL MARZO**

**C.P.C LORENZO ANTONIO PORTILLA VÁSQUEZ
AUDITOR GENERAL TITULAR DEL ORGANO
DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO.
P R E S E N T E :**

El que suscribe **Ing. Wilman Monje Morales**, Presidente Municipal Constitucional de Gutiérrez Zamora, para cumplir por medio del presente lo establecido en el artículo 30 de la *Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*; así como *Las Reglas de Carácter General para el cumplimiento de la Presentación de Información Municipal a través de Medios Electrónicos* al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz; presento ante Usted el **Estado de Obra Pública correspondiente al mes de Marzo 2018**, generado en el sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), así como el acta de cabildo donde fueron aprobados.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Gutiérrez Zamora, Ver.; a Miércoles 25 de Abril de 2018.


A T E N T A M E N T E



**ING. WILMAN MONJE MORALES.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE GUTIÉRREZ ZAMORA.**



c.c.p. el archivo



**ACTA NUMERO 28 SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
GUTIÉRREZ ZAMORA, VERACRUZ**

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO efectuada por el Honorable Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz, a las DIEZ horas con TREINTA minutos del DIECISEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, de conformidad con lo que disponen los Artículos 36, Fracción I, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz-Llave.- Preside el C. Wilman Monje Morales Presidente Municipal, con quórum integrado por los ciudadanos: C. Rosa María Ortega González, Sindica Única; C. Gonzalo Quiñones López Regidor Primero, Silvana Rodríguez Martínez Regidora Segunda, Francisco Hatzel Gómez Ochoa Regidor Tercero, Rosalía García Guerrero Regidora Cuarta. El C. Presidente Municipal, C. Wilman Monje Morales, declara abierta la Sesión, acto seguido, el Secretario del H. ayuntamiento, procede a pasar lista de asistencia, declarando quórum legal. Inmediatamente da lectura al Orden del Día, misma que a la letra dice:-----

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.------
- 2.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.------
- 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.------
- 4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018.------
- 5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PUBLICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018.------
- 6.- ASUNTOS GENERALES.------

Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, C. WILMAN MONJE MORALES, pregunta al Cuerpo Edilicio si están de acuerdo en aprobar el Orden del Día.- ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.------

CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA APROBADO Y AGOTADOS LOS PUNTOS 1, 2 y 3 SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO.------

4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018.------

En uso de la voz la C. Kitzia Eunice Juárez Salazar, Tesorera Municipal, informa al

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



cabildo los Estados Financieros del mes de Marzo de 2018, acorde a lo establecido en el artículo 45 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre, mismos que fueron preparados por la Tesorería Municipal, en términos del artículo 72 fracción XIII de la misma Ley. En uso de la voz el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al cabildo si son de aprobarse los estados financieros correspondientes al mes de Marzo del año 2018.-----

El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO.- Se aprueban los Estados Financieros correspondientes al mes de Marzo del año 2018. APROBADO POR UNANIMIDAD. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.-----

5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PUBLICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018.------

En uso de la voz el C. Arq. Antonio Ríos Pérez, Director de Obras Públicas; informa al cabildo los Estados de Obra Pública del mes de Marzo de 2018, acorde a lo establecido en el artículo 73 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre. En uso de la voz el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al cabildo si son de aprobarse los estados de Obra correspondientes al mes de Marzo del año 2018. El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO.- Se aprueban los Estados de Obra Pública correspondientes al mes de Marzo del año 2018. APROBADO POR UNANIMIDAD. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.-----

6.- ASUNTOS GENERALES.------

No hubo asuntos generales.-----

Posterior a ello, el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal, en los términos que marca la Ley, en uso de la voz, hace del conocimiento de los miembros del cabildo que se agotaron los asuntos del orden del día de esta vigésima octava sesión ordinaria del H. Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz.

7.- CLAUSURA.------

Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS, DEL DÍA DIECISEIS DE ABRIL, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA QUE FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS CIUDADANOS EDILES QUE EN ELLA INTERVINIERON ANTE EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, QUE AUTORIZA Y DA FE. REMÍTASE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA AL H. CONGRESO DEL ESTADO-----

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]


[Firma]

[Firma]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
BRILLA CON FUERZA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021



C. _____

[Signature]

WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021

BRILLA CON FUERZA I
REGIDURIA PRIMERA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021

SINDICATURA

[Signature]

ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICA ÚNICA

C. _____

[Signature]

GONZALO QUIÑONES LÓPEZ
REGIDOR PRIMERO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021

BRILLA CON FUERZA I
REGIDURIA TERCERA

C. _____

[Signature]

FRANCISCO HATZEL GÓMEZ OCHOA
REGIDOR TERCERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021

BRILLA CON FUERZA I
REGIDURIA SEGUNDA



[Signature]

SILVIANA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
REGIDORA SEGUNDA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021

BRILLA CON FUERZA I
REGIDURIA CUARTA

[Signature]

ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA

C. _____

[Signature]

JORGE CHENA BATRES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021

SECRETARIA


El Que Suscribe C. PROF. JORGE CHENA BATRES, Secretario del H. Ayuntamiento
Constitucional de Gutiérrez Zamora, Veracruz de Ignacio de la Llave. Hace constar

CERTIFICA

Que el presente documento es fotocopia y concuerda fiel y exactamente con su original,
mismo que tengo a la vista y que es compulsadas y cotejado ante mí presencia.

A petición de la parte interesada y para los usos legales a que haya lugar, se extiende la
presente en la Cd. de Gutiérrez Zamora, Ver. A los Veintitrés días del mes de Abril del Dos
Mil Dieciocho.

PROF. JORGE CHENA BATRES



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021,

SECRETARIA



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/35240

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	24/04/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/04/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	MARZO
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

n/v3pX997DlpHzAK43suQ0uT3OH0PrxeapRjrwppdOUT3j7bORa1q11a/
khDp+ZCE3UmDBIB5AgvJ6tsD96UFmYyzkxK8OH4V9F6so2NTudtVbkUtDUTjmLOSbil8X+czyoGY9T8Vp
0KArkDDxlgKL594Ux+BbXudqN/1adcMCg=



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
**OBRAS
PÚBLICAS**

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exige de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."

Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/35240

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690101	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA DE LA RIBERA ENTRE PUENTE TECOLUTLA Y PUERTO CABALLERO	Sí	Sí	Sí	No
2018300690102	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO CORONADO - LOMAS CHICAS	Sí	Sí	Sí	No
2018300690103	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRILES - EL CEPILLO	No	No	No	No
2018300690104	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRILES - SAN ANTONIO CORONADO	Sí	Sí	Sí	No
2018300690105	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: RAFAEL VALENZUELA-LOMAS CHICAS	No	No	No	No
2018300690106	REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO EN CALLES NIÑOS HÉROES, EMILIANO ZAPATA Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL EJIDO SOTO Y GAMA	Sí	Sí	Sí	No
2018300690107	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, CLAVE: 30DPR5104U COL. ASOCIACIÓN CIVIL.	No	No	No	No
2018300690110	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 109, COLONIAS DEL CARMEN, MURILLO VIDAL, HERNÁNDEZ OCHOA	No	No	No	No
2018300690111	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 151, COLONIAS REVOLUCIÓN, HIDALGO, HIDALGO SEGUNDA SECCIÓN, NIÑOS HÉROES	No	No	No	No
2018300690112	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 202, COLONIAS PRIMERO DE MAYO, AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO Y FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS	No	No	No	No
2018300690113	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 185, COLONIA CUAUHTLAN	No	No	No	No

Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/35240

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690114	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 019A, COLONIAS EL PORVENIR, ASOCIACIÓN CIVIL PRIMERO DE MAYO Y AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO.	No	No	No	No
2018300690115	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 096, COLONIAS CUAUHEMOC, LOS PINOS, Y SAN FRANCISCO	No	No	No	No
2018300690116	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 217, COLONIAS FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, LUIS DONALDO COLOSIO Y GUADALUPE	No	No	No	No
2018300690117	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADA EN VIVIENDAS DE AGEB 109, COLONIAS DEL CARMEN, MURILLO VIDAL, HERNÁNDEZ OCHOA	No	No	No	No
2018300690118	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADA EN VIVIENDAS DE AGEB 151, COLONIAS REVOLUCIÓN, HIDALGO, HIDALGO SEGUNDA SECCIÓN, NIÑOS HÉROES.	No	No	No	No
2018300690119	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADA EN VIVIENDAS DE AGEB 202, COLONIAS PRIMERO DE MAYO, AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO Y FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS	No	No	No	No
2018300690120	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADA EN VIVIENDAS DE AGEB 185, COLONIA CUAUHTLAN	No	No	No	No
2018300690121	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADA EN VIVIENDAS DE AGEB AGEB 096, COLONIAS CUAUHEMOC, LOS PINOS, Y SAN FRANCISCO	No	No	No	No
2018300690122	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADA EN VIVIENDAS DE 019A, COLONIAS EL PORVENIR, ASOCIACIÓN CIVIL PRIMERO DE MAYO Y AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO	No	No	No	No
2018300690123	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADA EN VIVIENDAS DE AGEB 217, COLONIAS FERNANDO GUTIERRES BARRIOS, LUIS DONALDO COLOSIO Y GUADALUPE	No	No	No	No



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
OBRAS
PÚBLICAS

SELLO DIGITAL:

n/v3pX997DlpHzAK43suQ0uT3OH0PrxeapRjrwppdOUT3j7bORa1q11a/khDp+ZCE3UmDBIB5AgvJ6tsD96UFmYyzkxK8OH4V9F6so2NTudtVbkUtDUTjmLOSbil8X+czyoGY9T8Vp0KArkDDxlgKL594Ux+BbXudqN/1adcMCg=

Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/35240

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690108	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL ENRIQUE RODRIGUEZ CANO CLAVE: 30DPR0616M, LOCALIDAD EL COCO	No	No	No	No
2018300690109	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE DR. ALEJANDRO CERISOLA EN CABECERA MUNICIPAL.	Sí	Sí	Sí	No



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
OBRAS
PÚBLICAS

SELLO DIGITAL:

n/v3pX997DlpHzAK43suQ0uT3OH0PrxeapRjrwpdpOUT3j7bORa1q11a/khDp+ZCE3UmDBlB5AgvJ6tsD96UFmYyzkxK8OH4V9F6so2NTudtVbkUtDUTjmLOSbil8X+czyoGY9T8Vp0KArkDDxlgKL594Ux+BbXudqN/1adcMCg=



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/35212

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	24/04/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/04/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	MARZO
Fuente de financiamiento:	INTERESES FISMDF 2017
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

X9R2SWlinCQjFgU88FYHazzMf1ssFrQbGYq4xi+VD87Y/qcZGhpwsFh0A4BgqufM5xlt/
6OgKeeULNt80tRHVvpkXtL0dlHorkS/
9WlgL70Gi2YTRwLA6YTcOcxMVSO1HQ6Cjp4ikpAs78p2+jO9cCgOdF42Jt3TKM0PlscA=



"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/35212

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690050	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO EN SECCIONES AISLADOS "BACHEO", EN LA CABECERA MUNICIPAL.	Sí	Sí	No	Sí



SELLO DIGITAL:

X9R2SWlinCQjFgU88FYHazzMf1ssFrQbGYq4xi+VD87Y/qcZGhpwsFh0A4BgqufM5xlt/6OgKeeULNt80tRHVvpIkXtL0dlHorKs/9Wlgl70Gi2YTRwLA6YTcOcxMVSO1HQ6Cjp4ikpAs78p2+jO9cCgOdF42It3TKM0PlascA=



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/35257

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	24/04/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/04/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	MARZO
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

G5g9FUdzQRkGwLfSCLvjQYJx5M4ETsm1527DfxC/
k9VIDBF4WlgraYqaQTL5ESZh0IEVv0T4SBEexLx+Yku11OmZ2Fimk8fGdGRV6PfemaFGae+8PMIDSmz+I
YFT1uotGuRHinFAbsq41/t9kLY10H4QorH1WGFSwQI8Yb1dG4=



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2016-2021
**OBRAS
PUBLICAS**

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/35257

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690225	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES Y OBRAS DE ACCESO EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, GALERAS DE LA FERIA Y LIENZO CHARRO.	No	No	No	No
2018300690226	REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL	Sí	Sí	No	Sí



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
OBRAS
PÚBLICAS

SELLO DIGITAL:

G5g9FUdzQRkGwLfSCLvQYJx5M4ETsm1527DfxC/k9VlDBF4WlgraYqaQTL5ESZh0IEVv0T4SBEexLx+Yku11OrnZ2Fimk8fGdGRV6PfemaFGae+8PMIDSmz+HYFT1uotGuRHInFAbsq41/t9kLYlOH4QorH1WGFSwQl8Yb1dG4=



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/35275

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	24/04/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/04/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	MARZO
Fuente de financiamiento:	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

Vd/rquTILywwpYHYvey+YqN4WHHtEwwlGt4I30xBXyyfZZaDJId/
Q2u64U1u6yVekSYZMsoTuKsKa4e6dOqcNxeQUK/
UgQJBpQ8HV1OfjLx4o6GwCnCJUAJcdG7oBznDy1AVHS9+A+2MpFXPxxwtP8iANxRraMU8Hn1EqBGZd
c=



"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/35275

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690301	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL "INFRAESTRUCTURA VIAL" EN LA CABECERA MUNICIPAL	No	No	No	No



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
OBRAS
PUBLICAS

SELLO DIGITAL:

Vd/rquTllywwpYHYvey+YqN4WHHtEwvIGt4l30xBXyyfIZaDJId/Q2u64U1u6yVekSYZMsotuKsKa4e6dOqcNxeQUK/UgQJBpQ8HV1OfjLx4o6GwCnCUAJcdG7oBznDy1AVHS9+A+2MpFXPxxwtP8iANxRraMU8Hn1EqBGZdc=



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/35280

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	24/04/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/04/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	MARZO
Fuente de financiamiento:	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN
¿Incluye anexos?	SÍ
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	


Cadena original:

ZWrC2Y74YxG72IB9kMXvoUIY4LggKW4TkgLjER4eutJmxnOn3NCtcoMFB5nbonlgiwnVXQDDi+YujNVfe3/
wGZIXaHmlxVsWlsJqsp5PHuoSvpfx6keNlk6WGTamYiqwwJqHwPSvR+jh/9z+Ae2/
Npci8ydGzcQHdVBczPsHIQ8=



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
**OBRAS
PÚBLICAS**

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/35280

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690302	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE MUNICIPAL EN COLONIA CUAHUTÉMOC, EN CABECERA MUNICIPAL	No	No	No	No



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
OBRAS
PUBLICAS

SELLO DIGITAL:

ZWrC2Y74YxG72IB9kMXvoUIY4LggKW4TkgLJER4eutJmxnOn3NCtcoMFB5nbonlgiwnVXQDDi+YujNVfe3/wGZlXaHmlxVsWlsJqsp5PHuoSvpfx6keNlk6WGTamYiqvwJqHwPSvR+jh/9z+Ae2/Npci8ydGzcQHdVBczPsHIQ8=

**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.****REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)****DATOS GENERALES**

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690101.00	Periodo:	MARZO	Número de estimación:	2.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA DE			Fuente de financiamiento:	SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	16/04/2018

**FOTO (12)**

Concepto de obra ejecutado:

**FOTO (13)**

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
OBRAS
PÚBLICAS

ARQ. JAIME CASTILLO BERNABE

ARQUITECTO

Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.****REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)****DATOS GENERALES**

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690101.00	Periodo:	MARZO	Número de estimación:	2.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA DE LA RIBERA ENTRE PUENTE TECOLUTLA Y PUERTO CABALLERO			Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA
				Fecha de revisión:	16/04/2018

**FOTO**Concepto de obra
ejecutado:

HABILITADOS

**FOTO**

EXTENSIONES

Concepto de
obra ejecutado:ARQ. JAIME CASTILLO BERNABE
ARQUITECTO

Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio: GUTIÉRREZ ZAMORA
No. de obra: 2018300690102.00

Localidad: LOMAS CHICAS
Periodo: MARZO

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2018
Número de estimación: ANTICIPO
Fuente de financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA L
Fecha de revisión: 20/04/2018

Descripción: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO CORONADO - LOMAS CHICAS



FOTO

APLICACIÓN DE AGUA EN PIPA

Concepto de obra
ejecutado:



FOTO

COMPACTADO

Concepto de
obra ejecutado:



ING. LEONEL RODRÍGUEZ RÍOS
INGENIERO
Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	LOMAS CHICAS	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690102.00	Periodo:	MARZO	Número de estimación:	ANTICIPO
Descripción:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO CORONADO - LOMAS CHICAS			Fuente de Financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA L
				Fecha de revisión:	20/04/2018

FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:


CUNETEO



FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:

CUNETAS

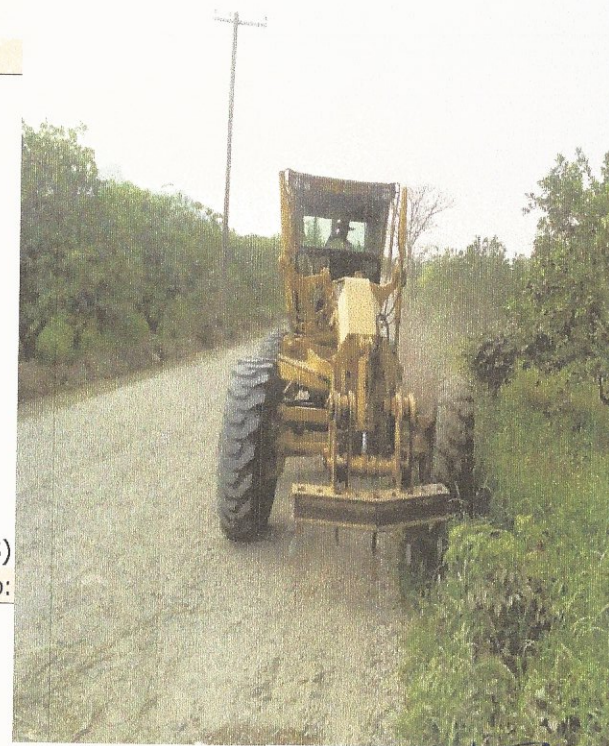

Observaciones:



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
OBRAS
PÚBLICAS

ING. LEONEL RODRÍGUEZ RÍOS

INGENIERO

Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal

c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Públicas



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio: GUTIÉRREZ ZAMORA
No. de obra: 2018300690104.00

Localidad: SAN ANTONIO CORONADO
Periodo: MARZO

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2018
Número de estimación: ANTICIPO
Fuente de financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA L
Fecha de revisión: 16/04/2018

Descripción: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRILES - SAN ANTONIO CORONADO



FOTO

ACARREOS

Concepto de obra
ejecutado:



FOTO

ESCARIFICADO

Concepto de
obra ejecutado:



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
OBRAS
PÚBLICAS

ING. LEONEL RODRÍGUEZ RÍOS
INGENIERO

Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.****REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)****DATOS GENERALES**

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	SAN ANTONIO CORONADO	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690104.00	Periodo:	MARZO	Número de estimación:	ANTICIPO
Descripción:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRILES - SAN ANTONIO CORONADO			Fuente de Financiamiento:	OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	16/04/2018

**FOTO (12)**

Concepto de obra ejecutado:

RIEGO DE AGUA

**FOTO (13)**

Concepto de obra ejecutado:

ESCARIFICADO

Observaciones:

ING. LEONEL RODRÍGUEZ RÍOS
INGENIERO

Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	EJIDO SOTO Y GAMA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690106.00	Periodo:	MARZO	Número de estimación:	ANTICIPO
Descripción:	REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO EN CALLES NIÑOS HÉROES, EMILIANO ZAPATA Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL EJIDO SOTO Y GAMA			Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA L
				Fecha de revisión:	16/04/2018



FOTO

CONFORMADO

Concepto de obra
ejecutado:

FOTO

NIVELACIÓN Y RASTREADO

Concepto de
obra ejecutado:H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
OBRAS
PÚBLICAS
ING. LEONEL RODRÍGUEZ RÍOS
INGENIERO
Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

Observaciones:



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	EJIDO SOTO Y GAMA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690106.00	Periodo:	MARZO	Número de estimación:	ANTICIPO
Descripción:	REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO EN CALLES NIÑOS HÉROES, EMILIANO ZAPATA Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL EJIDO SOTO Y GAMA			Fuente de Financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA L
				Fecha de revisión:	16/04/2018



FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:
CUNETETA

FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:
CONFORMADO Y NIVELADO

Observaciones:

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
OBRAS
PÚBLICASING. LEONEL RODRÍGUEZ RÍOS
INGENIERO

Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690109.00	Periodo:	MARZO	Número de estimación:	SIN ANTICIPO
Descripción:	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE DR. ALEJANDRO CERISOLA EN CABECERA MUNICIPAL.			Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA L
				Fecha de revisión:	16/04/2018



FOTO

COMPACTADO

Concepto de obra
ejecutado:

FOTO

PAVIMENTO

Concepto de
obra ejecutado:

ING. NORBERTO JUAREZ MEJÍA
INGENIERO
Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690109.00	Periodo:	MARZO	Número de estimación:	SIN ANTICIPO
Descripción:	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE			Fuente de Financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA L
				Fecha de revisión:	16/04/2018



FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:
DEMOLICIONES

FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:
EXTRACCIÓN DE MATERIALES

Observaciones:



ING. NORBERTO JUÁREZ MEJÍA

INGENIERO

Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.****REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)****DATOS GENERALES**

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690050.00	Periodo:	MARZO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO EN SECCIONES AISLADOS "BACHEO", EN LA CABECERA MUNICIPAL.			Fuente de financiamiento:	INTERESES FISMDF 2017
				Fecha de revisión:	16/04/2018




FOTO
DEMOLICIONES

Concepto de obra
ejecutado:



FOTO
PAVIMENTOS

Concepto de
obra ejecutado:

Observaciones:

ING. RODOLFO GUTIÉRREZ LECHUGA
INGENIERO
Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690050.00	Periodo:	MARZO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO EN SECCIONES AISLADOS "BACHEO", EN LA			Fuente de Financiamiento:	INTERESES FISMDF 2017
				Fecha de revisión:	16/04/2018



FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:

ELABORACIÓN DE CONCRETO



FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:

DEMOLICIONES

Observaciones:



ING. RODOLFO GUTIÉRREZ LECHUGA

INGENIERO

Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio: GUTIÉRREZ ZAMORA
No. de obra: 2018300690226.00
Localidad: GUTIÉRREZ ZAMORA
Periodo: MARZO
Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2018
Número de estimación:
Descripción: REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL
Fuente de Financiamiento: LOS MUNICIPIOS Y DE LAS
Fecha de revisión: 16/04/2018



FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:

PINTURA



FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:

PINTURA

Observaciones:



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
OBRAS
PÚBLICAS

ING. RODOLFO GUTIÉRREZ LECHUGA

INGENIERO

Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal

c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

FORMATO 09

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio: GUTIÉRREZ ZAMORA
No. de obra: 2018300690226.00
Descripción: REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL

Localidad: GUTIÉRREZ ZAMORA
Periodo: MARZO

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2018
Número de estimación:
Fuente de financiamiento: LOS MUNICIPIOS Y DE LAS
Fecha de revisión: 16/04/2018

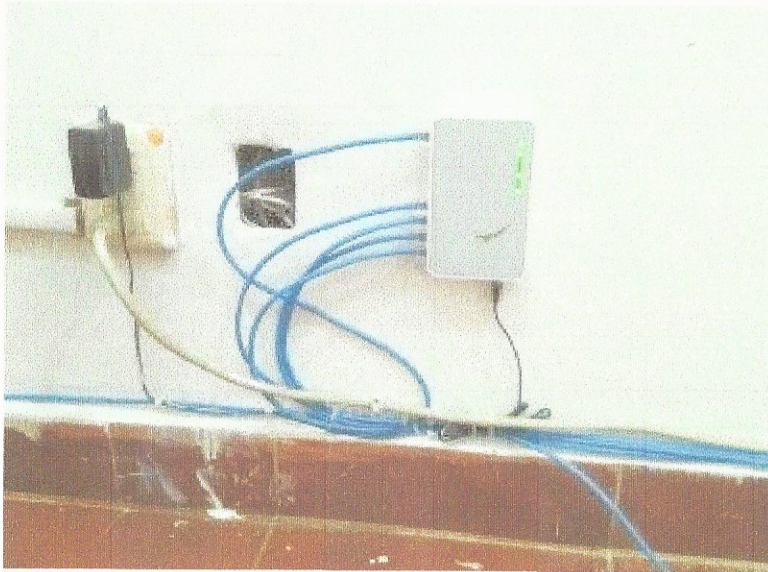


FOTO
RED INTERNA

Concepto de obra
ejecutado:

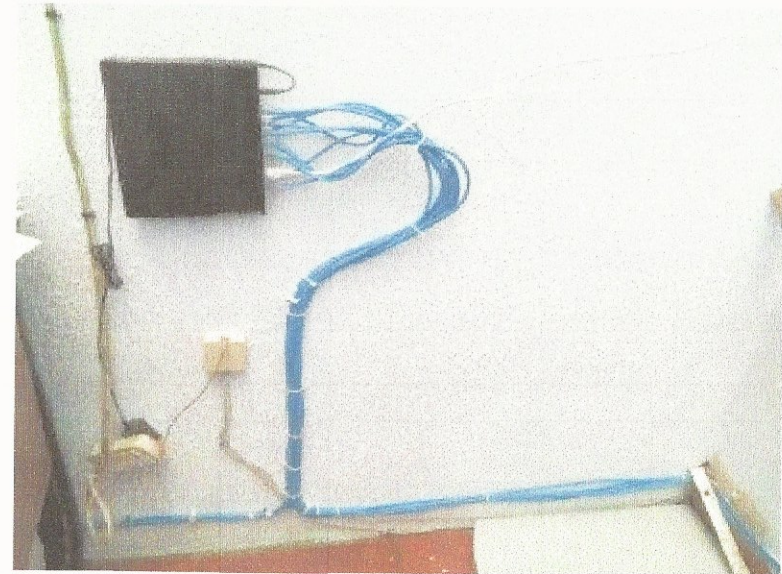


FOTO
RED INTERNA

Concepto de
obra ejecutado:

Observaciones:



ING. RODOLFO GUTIÉRREZ LECHUGA
INGENIERO
Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACION:

16/04/2018

MES QUE SE REPORTA

MARZO

DATOS GENERALES

DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	GUTIÉRREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	GUTIÉRREZ ZAMORA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2018300690101
		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA DE LA RIBERA ENTRE PUENTE TECOLUTLA Y PUERTO CABALLERO

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:						SÍ	X	NO								
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:									GRADO DE REZAGO SOCIAL:							
TIPO DE ZONA:	RURAL					CLAVE AGE:	0151		MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	X		
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	URBANA	X														
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO						SÍ	X	NO	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:							
						SÍ	X	NO	DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA			X		
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA									PROYECTO ESPECIAL					Cuenta con opinión favorable		
LATITUD	20.44147209				LONGITUD	-97.08423998								SÍ	NO	
															X	

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

[illegible]

REPORT

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$832,585.48	13/03/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$832,585.48	13/03/2018
FINIQUITO:	\$832,585.48	13/03/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		16/03/2018

AVANCE FISICO REAL

[illegible]**OBSERVACIONES:**

TERMINADO

* En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
LUMINARIAS

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
--

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
HABILITADO DE TUBOS Y COLOCACIÓN DE EXTENCIONES DE POSTES PARA LUMINARIA

MONTO AUTORIZADO:		\$832,585.48	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$832,585.48	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:			
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:			
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA		EXISTE
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		X
	LICITACIÓN PÚBLICA		

NO. DE CONTRATO:		IGTZ-LR 01-FISM DF/2018 30 069 010		FECHA:		09/02/2018	
CONTRATISTA:		PRODUCCIÓN GESTIÓN Y COMERCIO S.A DE C.V.					
MONTO CONTRATADO:		\$832,585.00				C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA		REAL			
		INICIO		09/02/2018		09/02/2018	
		TÉRMINO		11/03/2018		11/03/2018	
		DÍAS		30		30	
ANTICIPO:		APLICA		NO APLICA		X	
		MONTO:				PORCENTAJE:	
		FECHA DE PAGO:					

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		\$71,774.61	\$71,774.61
AFIANZADORA:		1889700.00	1889715.00
No. DE FIANZA:		Fianzas Monterrey,	Fianzas Monterrey,
FECHA:		09/02/2018	12/03/2018
CONVENIO	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
MODIFICATORIO:	PLAZO		FECHA
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO +			
CONTRATO) DE OBRA:			C/IVA

Arq. ANTONIO RÍOS PÉREZ
DIRECTOR DE OBRAS

Arq. Jaime Guadalupe Castillo Bernabé
SUPERVISOR

FORMATO 11

PLATONAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
OBRAS
PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION:
16/04/2018
MES QUE SE REPORTA
MARZO

DATOS GENERALES				
MUNICIPIO:	GUTIÉRREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	SAN ANTONIO CORONADO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2018300690104	
				REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRILES - SAN ANTONIO CORONADO

ANTECEDENTES:											
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:			SI	X	NO						
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:						GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
TIPO DE ZONA:	RURAL	X	CLAVE:	N/A		MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	X	MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:			SI	X	NO	TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:					
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO			SI	X	NO	DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	X		
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA						PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI	X	
LATITUD	20.44126017		LONGITUD	-97.13408624				N/O			

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRILES - SAN ANTONIO CORONADO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
RASTREO Y CUNETEO, EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE BANCO DE SABANA Y DE RIO, ESCARIFICADO Y ACAMELLONADO, TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO DE SUPERFICIE, COMPACTADO.

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ANTICIPO	\$0.00	001	\$200,000.00	28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
TOTALES	\$0.00		\$200,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00

MONTO AUTORIZADO:		\$400,000.00		C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$400,000.00		C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:			EXISTE	
	ADJUDICACIÓN DIRECTA		X	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:		CO-AD 004-FISM DF/2018 30 069 01		FECHA:		02/03/2018			
CONTRATISTA:		ISAAEL SALAZAR ESPINOSA							
MONTO CONTRATADO:		<table border="1"> <tr> <td>\$400,000.00</td> <td>C/IVA</td> </tr> </table>						\$400,000.00	C/IVA
\$400,000.00	C/IVA								
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO		05/03/2018		05/03/2018			
		TERMINO		30/03/2018		30/03/2018			
		DÍAS		25		25			
ANTICIPO:		APLICA		X		NO APLICA			
		MONTO:		\$200,000.00		PORCENTAJE:		50.00	
		FECHA DE PAGO:				13/03/2018			

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$200,000.00	13/03/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$200,000.00	13/03/2018
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

[illegible]

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$200,000.00	\$34,482.76	\$34,482.76
AFIANZADORA:	Fianza, S.A de C.V. Grupo Fianza, S.A de C.V. Grupo Fianza, S.A de C.V. Grupo Fianza, S.A de C.V. Grupo		
No. DE FIANZA:	3900-02484-0	3900-02485-5	3900-02494-7
FECHA:	02/03/2018	02/03/2018	05/04/2018
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	
	MONTO	FECHA	
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$400,000.00	C/IVA

OBSERVACIONES:		CONVENIO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
		MODIFICATORIO:	MONTO		
			PLAZO	INICIAL	FINAL
		NO APLICA			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:			\$400,000.00	C/IVA	

* En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.


 EL AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIERREZ RAMA, V.
 2018-2021
 OBRAS
 PUBLICAS

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ING. LEONEL RODRÍGUEZ RÍOS
SUPERVISOR

FORMATO 11

FECHA DE ELABORACION:
16/04/2018
MES QUE SE REPORTA
MARZO

MUNICIPIO:	GUTIÉRREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	ELIDO SOTO Y GAMA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO EN CALLES NIÑOS HEROES, EMILIANO ZAPATA Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL ELIDO SOTO Y GAMA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2018300690106		

ANTECEDENTES:											
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:			SI	X	NO						
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:						GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
TIPO DE ZONA:	RURAL	X	CLAVE:	N/A		MUY ALTO	ALTO	MEDIO	X	BAJO	MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:			SI	X	NO	TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:					
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO			SI	X	NO	DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	X		
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA						PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI	NO	X	
LATITUD	20.42544105		LONGITUD	-97.05118418							

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO EN CALLES NIÑOS HÉROES, EMILIANO ZAPATA Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL EJIDO SOTO Y GAMA

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
RASTREO Y CUNETEO, EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE BANCO DE SABANA Y DE RIO, ESCARIFICADO Y ACAMELLONADO, TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO DE SUPERFICIE, COMPACTADO.

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ANTICIPO	\$0.00	006	\$197,655.00	174	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,655.00
TOTALES	\$0.00		\$197,655.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,655.00

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$197,655.00	20/03/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$197,655.00	20/03/2018
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

[illegible]

OBSERVACIONES:	
	

MONTO AUTORIZADO:		\$395,310.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$395,310.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:			
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:			
TIPO DE LICITACIÓN:	EXISTE		
	ADJUDICACIÓN DIRECTA	X	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		
	LICITACIÓN PÚBLICA		

NO. DE CONTRATO:		GTZ-AD 06-FISM DF/2018 30 069 011		FECHA:		12/03/2018		
CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA DE ALBA EN EL GOLFO S.A DE C.V.						
MONTO CONTRATADO:		\$395,310.00				C/IVA		
PERIODO DE EJECUCIÓN:				PROGRAMADA		REAL		
		INICIO		15/03/2018		15/03/2018		
		TÉRMINO		03/04/2018				
		DÍAS		0		0		
ANTICIPO:		APLICA		X		NO APLICA		
		MONTO:		\$197,655.00		PORCENTAJE:		50.00
		FECHA DE PAGO:				20/03/2018		

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:	\$197,655.00	\$34,078.45		
AFIANZADORA:	CE Fianzas Monterrey, S. CE Fianzas Monterrey, S.			
No. DE FIANZA:	18889716	1889719		
FECHA:	12/03/2018	12/03/2018		
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	PLAZO		INICIAL	FINAL
	NO APLICA			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:				C/IVA

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ING. LEONEL RODRÍGUEZ RÍOS
SUPERVISOR

FORMATO 11

CONSTITUCIÓN DE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA
1991-2001
OBRAS
PUBLICAS



FECHA DE ELABORACION:	16/04/2018
MES QUE SE REPORTA	MARZO

DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	GUTIÉRREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	GUTIÉRREZ ZAMORA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2018300690109
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:			REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE DR. ALEJANDRO CERISOLA EN CABECERA MUNICIPAL

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO									
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:						GRADO DE REZAGO SOCIAL:							
TIPO DE ZONA:	RURAL URBANA					CLAVE AGE:	N/A	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	X
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI	X	NO									
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO		TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:							
						DIRECTA		X	INDIRECTA		COMPLEMENTARIA		
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA						PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI			
LATITUD		700007.36		LONGITUD		2263635.21				NO		X	

[illegible]

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00	
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$0.00	
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

[illegible]

INICIADA SIN ANTICIPO

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIERREZ ZACORA, VER.
 2018-2021
 OBRAS
 PUBLICAS

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE
CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE DR. ALEJANDRO CERISOLA EN CABECERA MUNICIPAL.

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN EN CEPA, CARGA CON MAQUINARIA, ACARREO, NIVELACIÓN DE TUBO, RELLENO EN CAPAS, PAVIMENTO DE CONCRETO

MONTO AUTORIZADO:		\$400,000.00		C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$400,000.00		C/IVA
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE		NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	X			
TIPO DE LICITACION:			EXISTE	
	ADJUDICACION DIRECTA		X	
	INVITACION A MENOS 3 PERSONAS			
	LICITACION PUBLICA			

NO. DE CONTRATO:		IGTZ-AD 07-FISM DF/2018 30 069 010		FECHA:		14/03/2018	
CONTRATISTA:		GRUPO CARDENA DE VERACRUZ S.A DE C.V.					
MONTO CONTRATADO:		\$470,000.00				C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:				PROGRAMADA		REAL	
		INICIO		19/03/2018		19/03/2018	
		TÉRMINO		17/04/2018		26/03/2018	
		DÍAS		30		8	
ANTICIPO:		APLICA		NO APLICA		X	
		MONTO:				PORCENTAJE:	
		FECHA DE PAGO:					

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		\$40,517.24	\$47,000.00
AFIANZADORA:		Afianzadora SOFIMEX S.A. Afianzadora SOFIMEX S.A	
Nº. DE FIANZA:		2186911	2192460
FECHA:		14/03/2018	02/04/2018
CONVENIO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
MODIFICATORIO:	MONTO		
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$470,000.00	C/IVA

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ING. NORBERTO J. ÁREZ MEJÍA
SUPERVISOR

C.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUTIÉRREZ ZAMORA

PRESENTE

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACION

INFORMACION RECEPCIONADA: INFORMACION DE OBRA PUBLICA

PERIODO: MARZO

FECHA DE RECEPCION: 25/04/2018

FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA: 25/04/2018

INFORME ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO		COMENTARIOS MUNICIPIOS	RECEPCION	
	PDF	EXCEL		FECHA	HORA
OFICIO DE REMISIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA	✓		OFICIO 0283	25/04/2018	11:00:04
ACTA DE SESIÓN DE CABILDO DE AUTORIZACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA	✓		ACTA 28	25/04/2018	11:08:00
RELACIÓN Y TOTAL DE OBRAS	✓		LISTADO DE OBRAS RECIBIDAS	25/04/2018	15:17:18
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (FORMATO 9)	✓		FOTOGRÁFICO	25/04/2018	15:24:38
ESTADO MENSUAL DE OBRA POR CONTRATO (FORMATO 11)	✓		OBRAS CONTRATADAS	25/04/2018	15:38:15
ESTADO MENSUAL DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (FORMATO 12)	✓		OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	25/04/2018	15:40:57
PROPUESTA DE INVERSIÓN (FORMATO 01)	✓		PGI-FISMDF 2018	25/04/2018	15:42:51

El presente documento se emite en el caso de Estados Financieros y Estados de Obra Pública mensuales de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para las demás se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. No exime de solicitudes, se reciben documentos con reserva de Ley, este recibo no implica validación de la información.
