

DIRECCIÓN DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


	REAL	PROGRAMADO
% AVANCES		
FÍSICO	100	100
FINANCIERO	100	100

[illegible]

OPERATING FISH

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MILWAUKEE AREA (M) & DAVENPORT





OPERADO
FISM



MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

INFORME FOTOGRÁFICO

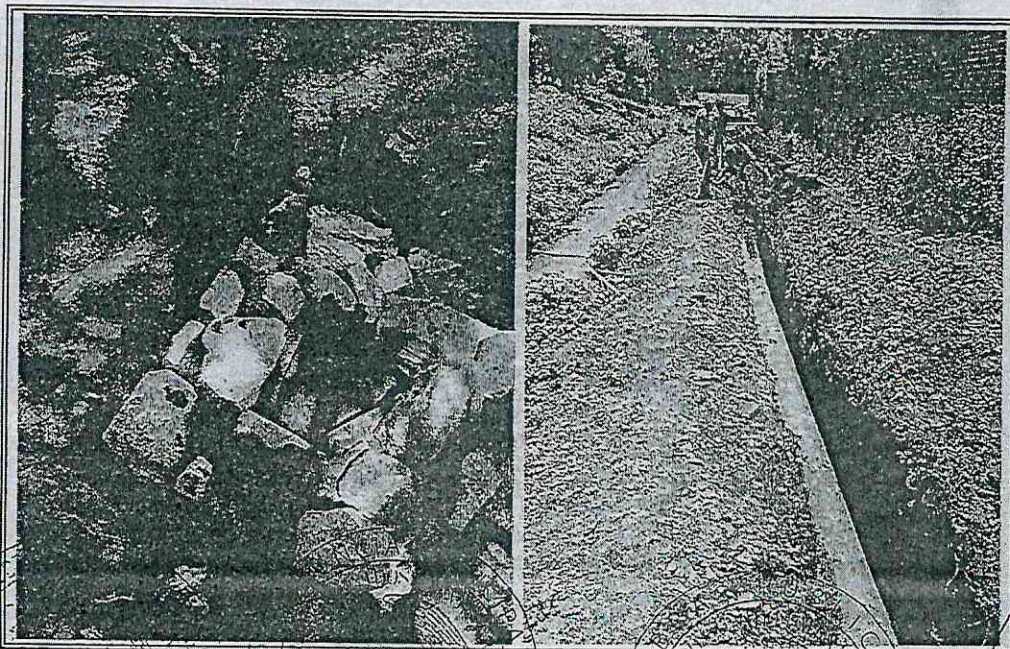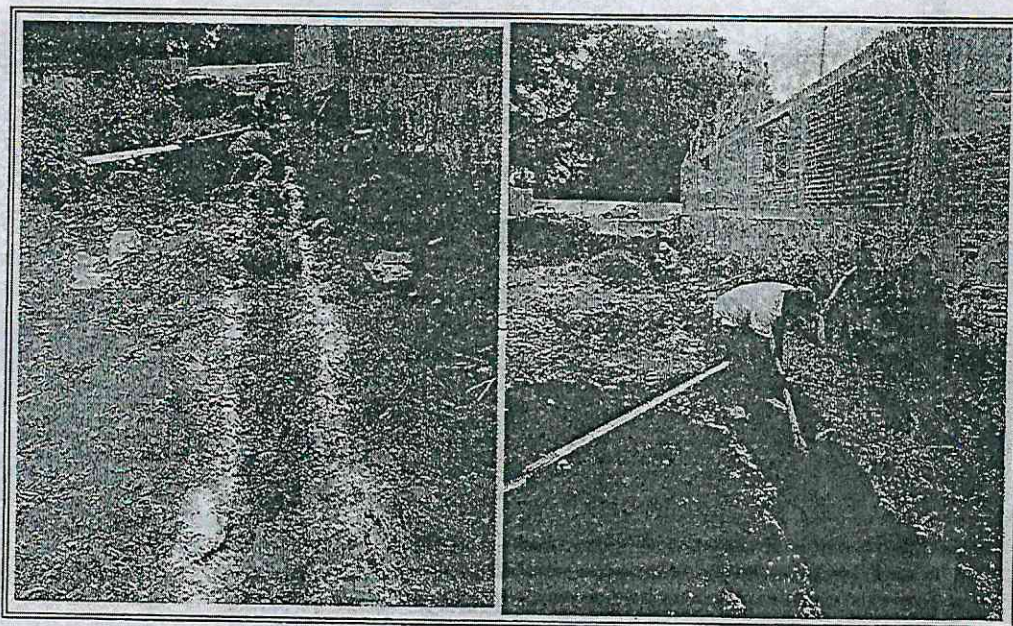

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ARROYO LA TARJEJA, COLONIA
LA FLORIDA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA ZACATECAS.

LOCALIDAD:

VILLA GARCIA

PERIODO DE EJECUCIÓN:

25 Nov 22

000108

BITÁCORA DE OBRA.

Nombre de la obra: AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN ARROYO LA TARJEA, COLONIA LA FLORIDA EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE VILLA GARCIA, ZACATECAS.

Nota 1: 1 Noviembre

Se da inicio con los trabajos correspondientes a las obras de drenaje, se comienza con el trazo de líneas para excavación y marcar los pozos de visita.

Nota 2: 5 Noviembre

Se continua con la excavación de manera manual de la zanja, los pozos de visita, así como la demolición del empedrado.

Nota 3: 17 Noviembre

Se revisa la colocación de plantilla rectificando los niveles correspondientes a las pendientes y a su vez en la misma tubería, también se coloca plantilla para los pozos de vista.

Nota 4: 20 Noviembre

Se revisan los trabajos colocación de tubería y trabajos de relleno, construcción de pozos de visita, y colocación del letrero de obra.

Nota 5: 22 Noviembre

Se inicia la colocación de tapas en pozo de visita, así como la colocación del empedrado.

Nota 6: 25 Noviembre

Se da por finalizada la obra



000109
