



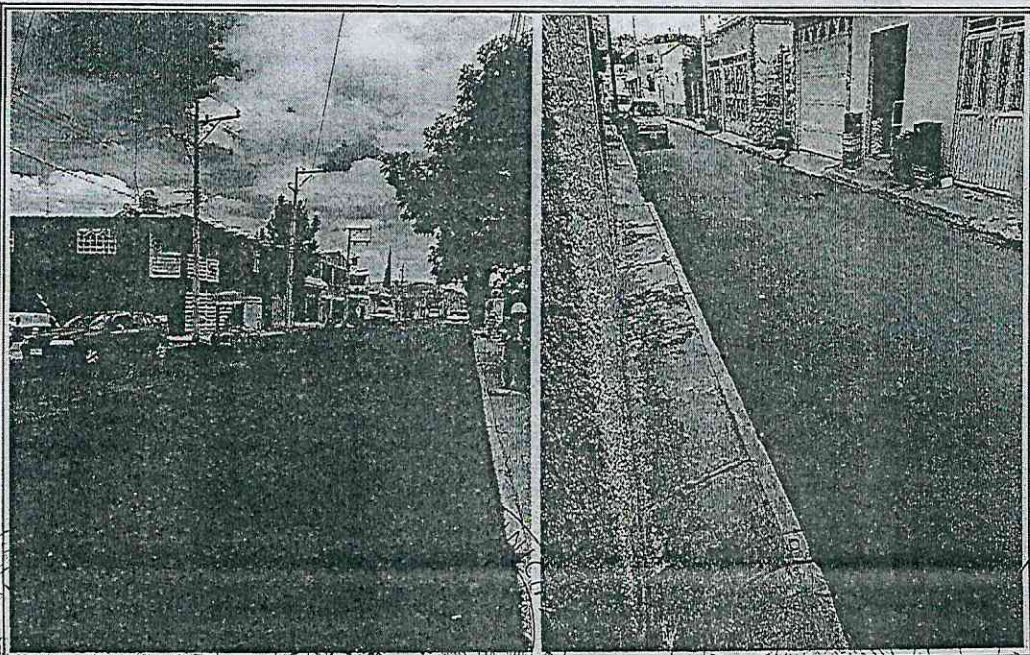

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA ZACATECAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS


INFORME FOTOGRÁFICO

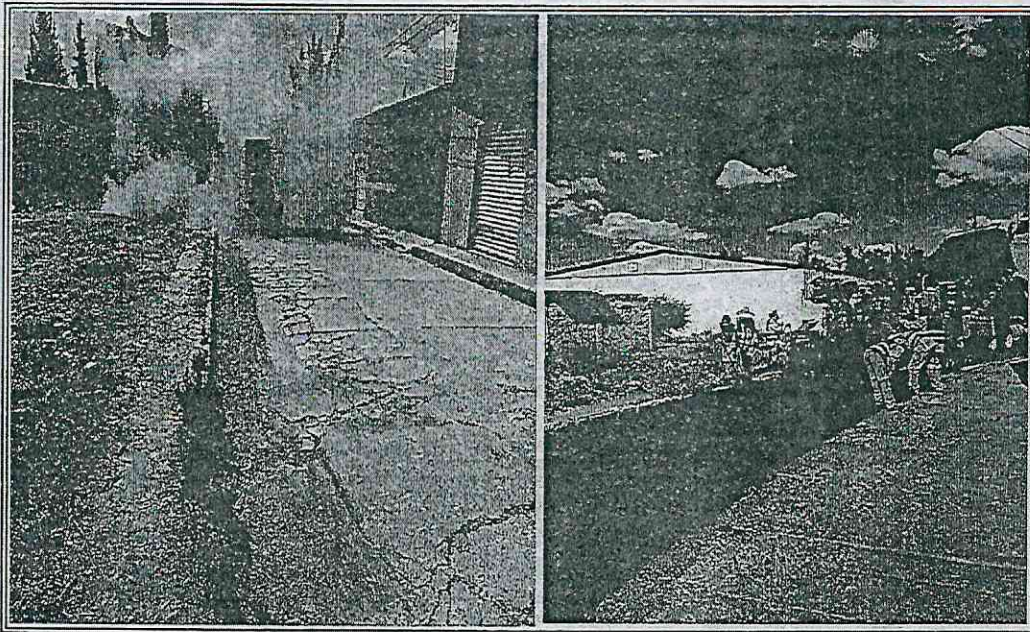

REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE GARCIA DE LA
CADENA, COLONIA LA FLORIDA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA
GARCIA, ZACATECAS

OBRA:
LOCALIDAD:

VILLA GARCIA, ZACATECAS



BITÁCORA DE OBRA.

Nota 1: 5 de Agosto 2022

Se realizan trabajos de demolición en las calles que conectan a la calle García de la Cadena al igual que sus excavaciones para el saqueo y arrastre del material.

Nota 2: 10 de Agosto 2022

Se inicio la colocación de la plantilla para a su vez colocar el tubo y hacer sus respectivos ajustes

Nota 3: 19 de Agosto 2022

Se realizo el relleno y la compactación de zanjas, así como la renivelación de pozos de visita para mayor duración.

Nota 4: 23 de Agosto 2022

Se continúa con la colocación de concreto en las áreas de excavación detalladas para realizar los trabajos de barrido y preparación para la colocación de carpeta.

Nota 5: 29 de Agosto 2022

Se llega a la fase final de la obra con la aplicación de emulsión sobre la calle para la colocación de asfalto, al igual que se inicia y termina con trabajos de pintura en las guarniciones de la calle, terminando así la obra.

