



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!

¡YA ES HORA DE CREER EN TI!
ESPERANZA
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL
Y COMBATE A LA POBREZA



INFORME MENSUAL DE ESTADO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES

JULIO 2018



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!

¡YA ES HORA DE CREER EN TI!
ESPERANZA
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL
Y COMBATE A LA POBREZA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA.
OFICIO No. P-2018/22/08-0468
ASUNTO: REPORTE MENSUAL JULIO

DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SÁINZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
LXIV LEGISLATURA DEL ESTADO
XALAPA, VERACRUZ.
PRESENTE:

El que suscribe **C. Ing. Wilman Monje Morales**, Presidente Municipal Constitucional de Gutiérrez Zamora, Ver.; por medio del presente me dirijo a Usted, para hacer de conocimiento que en cumplimiento a lo que establece el artículo 30 de la *Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*, así como *Las Reglas de Carácter General para el cumplimiento de la Presentación de Información Municipal a través de Medios Electrónicos* al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz; remito a Usted el **Estado de Obra Pública correspondiente al mes de Julio 2018**, generado en el sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), así como el acta de cabildo donde fueron aprobados.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Gutiérrez Zamora, Ver.; a Miércoles 22 de Agosto de 2018.

ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
PRESIDENCIA


ING. WILMAN MONJE MORALES.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE GUTIÉRREZ ZAMORA.

c.c.p. el archivo



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA.
OFICIO No. P-2018/22/08-0469
ASUNTO: REPORTE MENSUAL JULIO

C.P.C LORENZO ANTONIO PORTILLA VÁSQUEZ
AUDITOR GENERAL TITULAR DEL ORGANO
DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO.
PRESENTE:

El que suscribe **C. Ing. Wilman Monje Morales**, Presidente Municipal Constitucional de Gutiérrez Zamora, Ver.; por medio del presente me dirijo a Usted, para hacer de conocimiento que en cumplimiento a lo que establece el artículo 30 de la *Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*, así como *Las Reglas de Carácter General para el cumplimiento de la Presentación de Información Municipal a través de Medios Electrónicos* al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz; remito a Usted el **Estado de Obra Pública correspondiente al mes de Julio 2018**, generado en el sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), así como el acta de cabildo donde fueron aprobados.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Gutiérrez Zamora, Ver.; a Miércoles 22 de Agosto de 2018.

ATENTAMENTE

ING. WILMAN MONJE MORALES.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE GUTIÉRREZ ZAMORA.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
PRESIDENCIA

c.c.p. el archivo



ACTA NUMERO 47 SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
GUTIÉRREZ ZAMORA, VERACRUZ

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO efectuada por el Honorable Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz, a las NUEVE horas del QUINCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, de conformidad con lo que disponen los Artículos 36, Fracción I, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz-Llave.- Preside el C. Wilman Monje Morales Presidente Municipal, con quórum integrado por los ciudadanos: C. Rosa María Ortega González, Sindica Única; C. Gonzalo Quiñones López Regidor Primero, Silvana Rodríguez Martínez Regidora Segunda, Francisco Hatzel Gómez Ochoa Regidor Tercero, Rosalía García Guerrero Regidora Cuarta. El C. Presidente Municipal, C. Wilman Monje Morales, declara abierta la Sesión, acto seguido, el secretario del H. ayuntamiento, procede a pasar lista de asistencia, declarando quórum legal. Inmediatamente da lectura al Orden del Día, misma que a la letra dice: -----

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA. -----
- 2.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -----
- 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----
- 4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018.-----
- 5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018; DE LOS REPORTES DE LOS FONDOS DEL FISM DF 2018, FORTAMUN DF 2018, INTERESES FISM 2017, PRODERE 2018, FORTAFIN 2018, CAPUFE 2017, CAPUFE 2018. -----
- 6.- ASUNTOS GENERALES. -----

Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, C. WILMAN MONJE MORALES, pregunta al Cuerpo Edilicio si están de acuerdo en aprobar el Orden del Día. - ACUERDO APROBADO POR MAYORIA. -----

CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA APROBADO Y AGOTADOS LOS PUNTOS 1, 2 y 3 SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO. -----

(Handwritten signatures in blue ink, including names like 'C. Hatzel', 'C. Quiñones', 'C. Rodríguez', 'C. Ochoa', 'C. García', 'C. Guerrero', 'C. Monje')



4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018.------

En uso de la voz la C. Kitzia Eunice Juárez Salazar, Tesorera Municipal, informa al cabildo los Estados Financieros del mes de Julio de 2018, acorde a lo establecido en el artículo 45 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre, mismos que fueron preparados por la Tesorería Municipal, en términos del artículo 72 fracción XIII de la misma Ley. En uso de la voz el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al cabildo si son de aprobarse los estados financieros correspondientes al mes de Julio del año 2018.-----

El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO. - Se aprueban los Estados Financieros correspondientes al mes de Julio del año 2018. APROBADO POR MAYORIA. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.-----

5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018; DE LOS REPORTES DE LOS FONDOS DEL FISM DF 2018, FORTAMUN DF 2018, INTERESES FISM 2017, PRODERE 2018, FORTAFIN 2018, CAPUFE 2017, CAPUFE 2018.-----

En uso de la voz el C. Arq. Antonio Ríos Pérez, Director de Obras Públicas; informa al cabildo los Estados de Obra Pública del mes de Julio de 2018, acorde a lo establecido en el artículo 73 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre; y presenta los reportes de los fondos del FISM DF 2018, FORTAMUN DF 2018, INTERESES FISM 2017, PRODERE 2018, FORTAFIN 2018, CAPUFE 2017, CAPUFE 2018. En uso de la voz el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al cabildo si son de aprobarse los estados de Obra correspondientes al mes de Julio del año 2018; de los reportes de los fondos del FISM DF 2018, FORTAMUN DF 2018, INTERESES FISM 2017, PRODERE 2018, FORTAFIN 2018, CAPUFE 2017, CAPUFE 2018. El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO. - Se aprueban los Estados de Obra Pública correspondientes al mes de Julio del año 2018, de los reportes de los fondos del FISM DF 2018, FORTAMUN DF 2018, INTERESES FISM 2017, PRODERE 2018, FORTAFIN 2018, CAPUFE 2017, CAPUFE 2018. APROBADO POR MAYORIA. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.-----

6.- ASUNTOS GENERALES.-----
No hubo asuntos generales.-----

CHL31
[Handwritten signatures in blue ink]



Posterior a ello, el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal, en los términos que marca la Ley, en uso de la voz, hace del conocimiento de los miembros del cabildo que se agotaron los asuntos del orden del día de esta cuadragésima séptima sesión ordinaria del H. Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz. ----

7.- CLAUSURA. -----

Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS, DEL DÍA QUINCE DE AGOSTO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA QUE FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS CIUDADANOS EDILES QUE EN ELLA INTERVINIERON ANTE EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, QUE AUTORIZA Y DA FE. REMÍTASE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA AL H. CONGRESO DEL ESTADO. -----


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
 2018 - 2021
 ¡BRILLA CON FUERZA!
 REGIDURIA PRIMERA


 C. 
WILMAN MONJE MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
 2018 - 2021
PRESIDENCIA


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
 2018 - 2021
 C. 
SINDICATURA
ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
 SINDICA ÚNICA


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
 2018 - 2021
 ¡BRILLA CON FUERZA!
REGIDURIA PRIMERA
 C. 
GONZALO QUIÑONES LÓPEZ
 REGIDOR PRIMERO








H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
¡ BRILLA CON FUERZA !
REGIDURIA TERCERA



C. _____

SILVIANA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
REGIDORA SEGUNDA

C. _____

Catalzel

FRANCISCO HATZEL GÓMEZ OCHOA
REGIDOR TERCERO



C. _____

ROSALÍA GARCÍA GONZÁLEZ
REGIDORA CUARTA



C. _____

JORGE CHENA BARRERA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARÍA





Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/38530

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	23/08/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/08/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	JULIO
Fuente de financiamiento:	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 2017
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

oYeB+K27fNfcnNmhQIEynWjiGhkzM4sDK6QbDYGOTQZCKDZTuAt3J3xTI5HBHzeOdzqZ/
3fSdwt3NscqtBriL8yI9+UFvU7YmTMrvPncUCsLF9KUg8IfWoPoymW88IHerizWE4ODwNATMeFz+IcbhAW
cUCo5GnckQKkET0O8II=



“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exige de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/38530

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690033	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO "STA. ROSA"	No	No	Sí	No
2018300690042	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO LOMAS CHICAS A RAFAEL VALENZUELA DEL KM 0+000 AL KM 0+180	No	No	Sí	No
2018300690040	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RAFAEL VALENZUELA A IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, DEL KM 0+669 AL KM 1+334	No	No	Sí	No
2018300690043	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO LOMAS CHICAS A RAFAEL VALENZUELA DEL KM 0+775 AL KM 0+903	No	No	Sí	No

EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/38530



SELLO DIGITAL:

oYeB+K27fNfcnNmhQIEynWjiGhgzM4sDK6QbDYGOTQZCkDZTuAt3J3xTI5HBHzeOdzqlZ/3fSdwt3NscqtBril8yl9+UFvU7YmTMrvPncUCsLF9Kug8IfWoPoymW88lHerizWE4ODwNATMeFz+IcbhAWcUCo5GnckQKkET008II=



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/38435

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	23/08/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/08/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	JULIO
Fuente de financiamiento:	INTERESES FISMDF 2017
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

EGo92ZYlwj/
0gHUVy1u8eoDI6D6mwGGH7J4ZCPVINyc4I+DGLCBuellGj4QLGVazsvnYxTRJF00QBIVDicOahKWMGBw
3aaXu/3HS1Z2nz3CS2+FblQoRJkhOBsoLi/O6DCis6aiRZXHs/bcThacl03LEb73eWKWa/XD6UTopbA8=



"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exige de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/35936

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690050	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO EN SECCIONES AISLADOS "BACHEO", EN LA CABECERA MUNICIPAL.	No	No	No	No

EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/35936



SELLO DIGITAL:

Rm0CPI6CV8jmnZCgFWg8LLi+OjfFd5j5erFa73WfrkkzfstqxjNjksxs1kiOsTWySsFsurVqk5G0Px3u3U2ARnQl36pVtqcjCHUqPdglullgtNlyAaPkTb8e7nNhGlrWUp9s5t4R3q7yKBDVVaVqHQB446juOY+RZtl2yJ9gA=



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/38529

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	23/08/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/08/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	JULIO
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

UoV+ZL9SUTk6A1wuTy5xV24bNtBeq7Q6avfnQc/
QzNmnMIZs3EzF8A4UxjpSQg6cwt7veBWWWwZS9tPWck0N6U1Oc6lzS5JZMPW3sifXaO4PDRXJEZJ/
r5C53ezqBEaDRMYJaOIYhwt31pNAfl6HPcJdd6FgvS1NlpmCPAU4L36M=



"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."

Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/38529

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690101	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA DE LA RIBERA ENTRE PUENTE TECOLUTLA Y PUERTO CABALLERO	No	No	No	No
2018300690102	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO CORONADO - LOMAS CHICAS	No	No	Sí	No
2018300690103	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRILES - EL CEPILLO	No	No	Sí	No
2018300690104	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRILES - SAN ANTONIO CORONADO	No	No	Sí	No
2018300690105	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: RAFAEL VALENZUELA-LOMAS CHICAS	No	No	Sí	No
2018300690106	REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO EN CALLES NIÑOS HÉROES, EMILIANO ZAPATA Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL EJIDO SOTO Y GAMA	No	No	No	No
2018300690107	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, CLAVE: 30DPR5104U COL. ASOCIACIÓN CIVIL.	No	No	Sí	No
2018300690110	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 109, COLONIAS DEL CARMEN, MURILLO VIDAL, HERNÁNDEZ OCHOA	No	No	No	No
2018300690111	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 151, COLONIAS REVOLUCIÓN, HIDALGO, HIDALGO SEGUNDA SECCIÓN, NIÑOS HÉROES	No	No	No	No
2018300690112	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 202, COLONIAS PRIMERO DE MAYO, AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO Y FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS	No	No	Sí	No
2018300690113	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 185, COLONIA CUAUHTLAN	No	No	No	No

Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/38529

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690114	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 019A, COLONIAS EL PORVENIR, ASOCIACIÓN CIVIL PRIMERO DE MAYO Y AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO.	No	No	Sí	No
2018300690115	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 096, COLONIAS CUAUHTEMOC, LOS PINOS, Y SAN FRANCISCO	No	No	No	No
2018300690116	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 217, COLONIAS FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, LUIS DONALDO COLOSIO Y GUADALUPE	No	No	No	No
2018300690108	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL ENRIQUE RODRIGUEZ CANO CLAVE: 30DPR0616M, LOCALIDAD EL COCO	No	No	Sí	No
2018300690109	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE DR. ALEJANDRO CERISOLA EN CABECERA MUNICIPAL.	No	No	No	No
2018300690124	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD LOMAS CHICAS	Sí	Sí	Sí	No
2018300690125	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD LOMAS DE ARENA	No	No	No	No
2018300690126	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD CARRILLO PUERTO SANTA ROSA	No	No	No	No



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/38434

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	23/08/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/08/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	JULIO
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

jCLJNGoWvWPz65h3SyStsvHkCKhBPrL8o+Y7miavZ/W/3o1Sq28R7qS3KxzGM3AuqxrpbO7LwokDG9w/cO7b+Znzw6Y58leo3sfVTiKliE5wUE5GIH4Wlv3Y1c/3/PePGdAGn3osTx0Dp3jg3ewvc/AZ9WkivYiGa8Um5Vw0Do4=



“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exige de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/38434

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690225	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES Y OBRAS DE ACCESO EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, GALERAS DE LA FERIA Y LIENZO CHARRO.	Sí	Sí	Sí	No
2018300690226	REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL	No	No	No	No

EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/38434



SELLO DIGITAL:

jCLJNgoWvWPz65h3SyStsvHkCKhBPrL8o+Y7miavZ/W/3o1Sq28R7qS3KxzGM3AuqxrpbO7LwokDG9w/cO7b+ZnzW6Y58leo3sfVTikIE5wUE5GIH4Wlv3Y1c/3/PePGdAGn3osTx0Dp3jg3ewvc/AZ9WkivYiGa8Um5Vw0Do4=



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/38436

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	23/08/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/08/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	JULIO
Fuente de financiamiento:	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

vIxLyKnQt/
zkyXu4I9+f7Usx7v7r13omeltUMku4f6lf0L16uXnup46IeraOF1X1eSmhKFhWXRN5cy6S5N4MnabDvmBZXqc
mmOCiy3VbYwgjESpO9E0hHnxqf7IKP/33+gd2fulgULiwDYpetQtb4GGwIDt8uSSWQ8dGW8qYUnl=



"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/38436

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690301	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL "INFRAESTRUCTURA VIAL" EN LA CABECERA MUNICIPAL	No	No	No	No

EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/38436



SELLO DIGITAL:

vlxLyKnQt/zkyXu4I9+f7Usx7v7r13omeltUMku4f6lf0L16uXnup46leraOF1X1eSmhKFhWXRN5cy6S5N4MnabDvmBZXqcmOCiy3VbYwgjESpO9E0hHnxqf7IKP/33+gd2fulgULiwDYpetQtb4GGwIDt8uSSWQ8dGW8qYUnl=



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/38437

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	23/08/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/08/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	JULIO
Fuente de financiamiento:	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

f4pUI1+p9x65A9P6Sod1oXL0Aa7+ldV9ef2Tm7oiJU4RYPYk0Q/
HGqQUiVTzZwKs51DXVVT3hUNubAmxpC2DKa/
za0Oz55HFo3bcMDEYyW+oi8Ybf8YNmvSCFaZhQM+n5k2213T8qRSp+nAmwhFJH+/
B6+XdLRpxn6iorZScSPo=



“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/38437

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690302	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE MUNICIPAL EN COLONIA CUAHUTÉMOC, EN CABECERA MUNICIPAL	Sí	Sí	Sí	No

EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/38437



SELLO DIGITAL:

f4pUI1+p9x65A9P6Sod1oXL0Aa7+ldV9ef2Tm7oiJU4RYPYk0Q/HGqQUIVTzZwKs51DXVVT3hUNubAmxpC2DKa/za0Oz55HFo3bcMDEYyW+oi8Ybf8YNmvSCFaZhQM+n5k2213T8qRSp+nAmwhFJH+/B6+XdlRpxn6iorZScSPo=



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/38438

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	22/08/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/08/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	JULIO
Fuente de financiamiento:	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

Tt74qplfkixEyEyeew4YHkLMckugYtx7WVLhXvt631rEQedEquUcRWSujcq8eKLeotGCEqRMn9eHAp9T8sP
lZhmHURwh7RMM6s6uzPXJoZ/
B0a6lVYJ0osja4lS7FUYZBnAMRX6l6alD7Xwpw7GZTR73as8QXYA62LdpUI1gXSU=



"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."

Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/38438

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690401	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - ENTRONQUE PAGUAS DE CORONADO DEL KM 0+000 AL KM 1+400	Sí	Sí	Sí	No
2018300690403	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE "B" ENTRE CALLE 2 Y LIMITE DE COLONIA FIDEL HERRERA, EN COLONIA ASOCIACIÓN CIVIL	No	No	No	No
2018300690404	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN SECCIÓN DE CALLES MELCHOR OCAMPO ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE MELCHOR OCAMPO Y JUVENTINO ROSAS, JUVENTINO ROSAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA ALLENDE EN LA LOCALIDAD RAFAEL	No	No	No	No
2018300690402	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: ARROYO GRANDE - LA GALEANA DEL KM 0+000 AL KM 2+000	Sí	Sí	Sí	No
2018300690405	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MÉXICO ENTRE CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO Y CALLE PERU Y PERÚ ENTRE CALLE MÉXICO Y GUYANA EN LA COLONIA FIDEL HERRERA	No	No	No	No
2018300690406	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMO: RICARDO FLORES MAGON- LAS BOMBAS	No	No	No	No
2018300690407	REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS CON PASAMANOS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES RICARDO FLORES MAGON Y FRANCISCO I. MADERO EN COLONIA REVOLUCIÓN	No	No	No	No



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
ORFIS
PÚBLICO

SELLO DIGITAL:

Tt74qpflkixEyEyeew4YHkLMckugYtx7WVLhXvt631rEQedEquUcRWSujcq8eKLeotGCEqRmN9eHAp9T8sPIZhmHURwh7RMM6s6uzPXJoZ/B0a6IVYJ0osja4IS7FUYZBnAMRX6IaID7Xwpw7GZTR73as8QXYA62LdpUI1gXSU=



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/38438

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690408	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CONSTITUCIÓN, ENTRE AVENIDA DOS DE ABRIL Y CINCO DE FEBRERO EN EL CERRO DE LOS PINOS, CABECERA MUNICIPAL	No	No	No	No
2018300690409	REHABILITACIÓN CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN CALLES: NIÑOS HÉROES, EMILIANO ZAPATA, GENERAL LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO DEL EJIDO SOTO Y GAMA	No	No	No	No
2018300690410	REHABILITACIÓN CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN CALLES AVENIDA MORELOS, AVENIDA HIDALGO, EMILIANO ZAPATA, JUVENTINO ROSAS DE LOCALIDAD RAFAEL VALENZUELA	No	No	No	No
2018300690411	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: ANCLON Y ARENAL BARRILES	No	No	No	No
2018300690412	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS ENTRE "EL FALSO Y CEMENTERIO DE SANTA ROSA" DEL KM 0+000 AL KM 1+460	No	No	No	No
2018300690414	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR MODELOS EFICIENTES TIPO CITI 55-305V EN CABECERA MUNICIPAL	No	No	No	No
2018300690415	REHABILITACIÓN DE PARQUE IGNACIO MUÑOZ ZAPOTAL CONSISTENTE EN: JARDINERAS, QUIOSCO, ANDADORES Y ALUMBRADO PÚBLICO	No	No	No	No
2018300690413	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLEJÓN CINCO DE MAYO, CERRO DE LA CRUZ EN CABECERA MUNICIPAL	No	No	No	No
2018300690416	REHABILITACIÓN DE PARQUE COL. FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS CONSISTENTE: JARDINERAS, ANDADORES, COLOCACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CANAL PLUVIAL Y ALUMBRADO PÚBLICO	No	No	No	No



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRAS

SELLO DIGITAL:

Tt74qplfkixEyEyeew4YHKLmCkugYtx7WVLhXvt631rEQedEquUcRWsujcq8eKLeotGCEqRMn9eHAp9T8sPlZhmHURwh7RMM6s6uzPXJoZ/B0a6IVYJ0osja4IS7FUYZBnAMRX6I6alD7Xwpw7GZTR73as8QXYA62LdpUI1gXSU=



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio: GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad: LOMAS CHICAS	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2018
No. de obra: 2018300690124.00	Periodo: JULIO	Número de estimación: 1.00
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD LOMAS CHICAS		Fuente de financiamiento: SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
		Fecha de revisión: 15/08/2018



FOTO
INICIOS

Concepto de obra ejecutado:



FOTO
EXCAVACIONES PARA DESPLANTES

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

PROCESO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
**OBRAS
PUBLICAS**

Rodolfo Gutiérrez Lechuga
INGENIERO
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	LOMAS CHICAS	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690124.00	Periodo:	JULIO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD LOMAS CHICAS			Fuente de Financiamiento:	OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	15/08/2018



FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:

EXCAVACIONES

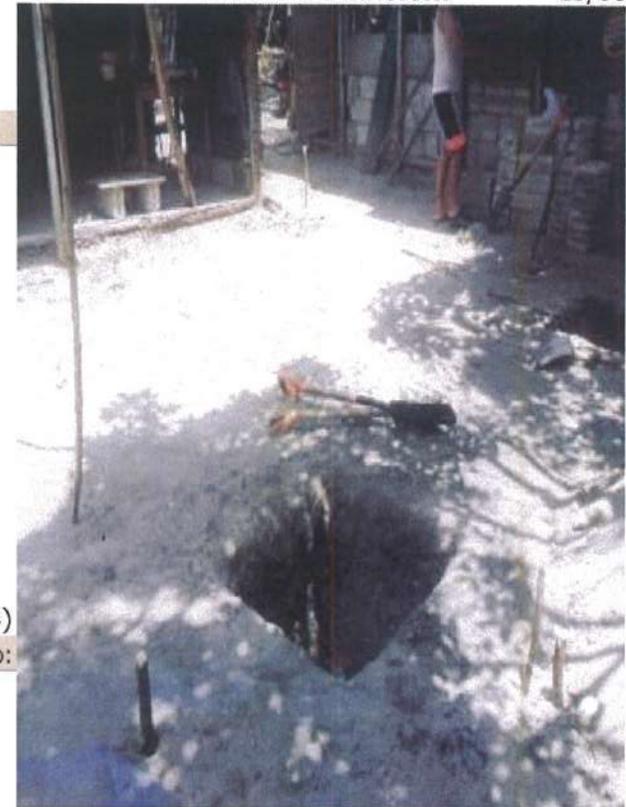


FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:

Obervaciones:

PROCESO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
**OBRAS
PUBLICAS**

Rodolfo Gutiérrez Lechuga
INGENIERO
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690225.00	Periodo:	JULIO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES Y OBRAS DE ACCESO EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, GALERAS DE LA FERIA Y LIENZO CHARRO.			Fuente de financiamiento:	LOS MUNICIPIOS Y DE LAS
				Fecha de revisión:	15/08/2018



FOTO
CONCRETOS

Concepto de obra ejecutado:



FOTO
LUMINARIAS

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

POR FINIQUITAR



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
**OBRAS
PUBLICAS**

Jaime Guadalupe Castillo Bernabé

ARQUITECTO

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690225.00	Periodo:	JULIO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES Y OBRAS DE ACCESO EN CANCHAS DE USOS		Fuente de Financiamiento:	LOS MUNICIPIOS Y DE LAS	
			Fecha de revisión:	15/08/2018	

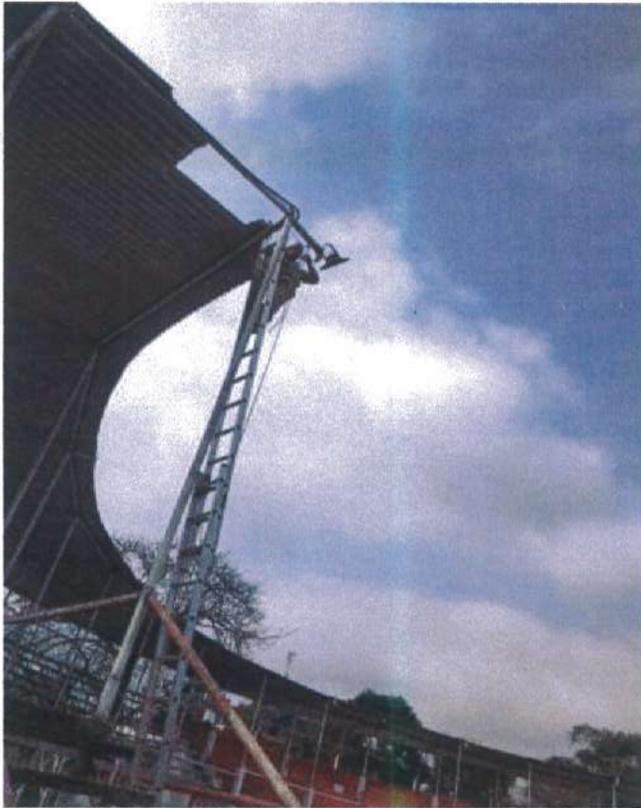


FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:

REFLECTORES



FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Observaciones:

POR FINIQUITAR



Jaime Guadalupe Castillo Bernabé
ARQUITECTO
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690302.00	Periodo:	JULIO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE MUNICIPAL EN COLONIA CUAHUTÉMOC, EN CABECERA MUNICIPAL			Fuente de financiamiento:	ALECIMIENTO FINANCIERO
				Fecha de revisión:	15/08/2018



FOTO

ARMADO DE ESTRUCTURAS DE DESPLANTES

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

VACIADOS DE CONCRETO EN PLANTILLAS

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

PROCESO




 Alfredo Moreno Neri
 INGENIERO
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690302.00	Periodo:	JULIO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE MUNICIPAL EN COLONIA CUAHUTÉMOC, EN CABECERA			Fuente de Financiamiento:	ALECIMIENTO FINANCIERO
				Fecha de revisión:	15/08/2018



FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:

DESPLANTES DE ESTRUCTURAS



FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:

INICIO DE MUROS

Observaciones:

PROCESO



Alfredo Moreno Neri
INGENIERO

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	M. ALTAMIRANO (PLAN DE ALTA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690401.00	Periodo:	JULIO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - ENTRONQUE PAGUAS DE CORONADO DEL KM 0+000			Fuente de financiamiento:	MINOS Y PUENTES FEDERAL
				Fecha de revisión:	15/08/2018



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

COMPACTADO CON APLICACIÓN DE AGUA



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
OBRAS
PÚBLICAS

Alfredo Moreno Neri
INGENIERO
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	M. ALTAMIRANO (PLAN DE ALT/	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690401.00	Periodo:	JULIO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO:			Fuente de Financiamiento:	MINOS Y PUENTES FEDERAL
				Fecha de revisión:	15/08/2018

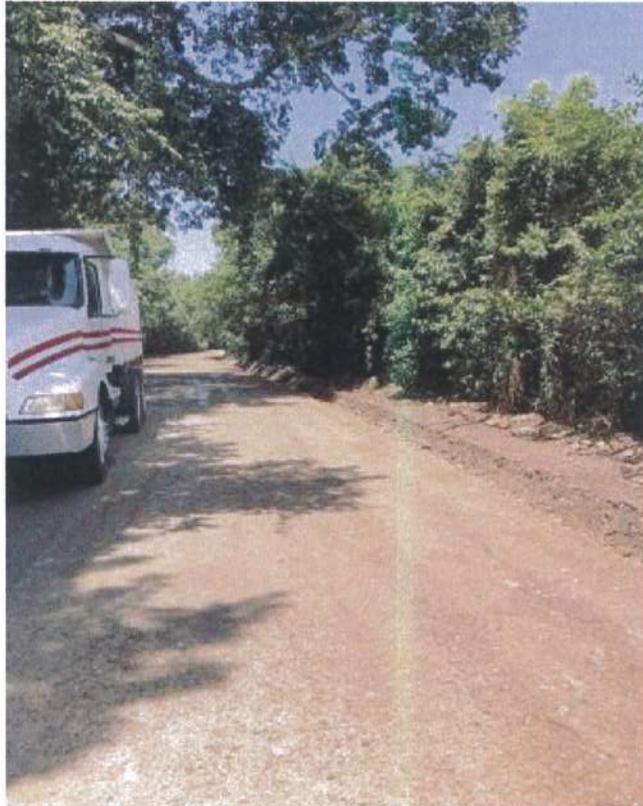


FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:

ACARREOS



FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:

AFINE

Observaciones:

EN PROCESO



Alfredo Moreno Neri
INGENIERO
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	ARROYO GRANDE	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690402.00	Periodo:	JULIO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: ARROYO GRANDE - LA GALEANA DEL KM 0+000 AL KM 2+000			Fuente de financiamiento:	MINOS Y PUENTES FEDERAL
				Fecha de revisión:	15/08/2018



FOTO
CUNETAS

Concepto de obra ejecutado:



FOTO
ESCARIFICADO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

EN PROCESO




 Alfredo Moreno Neri
 INGENIERO
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	ARROYO GRANDE	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690402.00	Periodo:	JULIO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO:			Fuente de Financiamiento:	MINOS Y PUENTES FEDERAL
				Fecha de revisión:	15/08/2018



FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:



FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:

ACARREOS

Obervaciones:

PROCESO



Alfredo Moreno Neri
INGENIERO
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:	16/07/2018
MES QUE SE REPORTA	JULIO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIÉRREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO "STA. ROSA"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	CAMINOS Y PUENTES FEDER	No. DE OBRA:	2018300690033		

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:					
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGE:	N/A	GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
	URBANA			MUY ALTO	ALTO MEDIO BAJO X MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	X	NO	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI		NO	DIRECTA	INDIRECTA COMPLEMENTARIA
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA			PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI NO X
LATITUD	20.420623399	LONGITUD	-97.188314198		

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

BARDA PERIMETRAL Y GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

TERMINADA GRADAS Y MURO

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
FINIQUITO	\$639,552.63	1	\$639,552.63	108	\$642,321.26	\$0.00	\$2,768.63	\$0.00	\$639,552.63
TOTALES	\$639,552.63		\$639,552.63		\$642,321.26	\$0.00	\$2,768.63	\$0.00	\$639,552.63

MONTO AUTORIZADO:	\$642,321.26	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$642,321.26	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA			EXISTE
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			X
	LICITACIÓN PÚBLICA			

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$642,321.00	30/03/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$642,321.00	30/03/2018
FINIQUITO:	\$642,321.00	30/03/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	26/11/2017

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TERMINADA

NO. DE CONTRATO:	CAPUFE-GTZ-IR-2017300690033	FECHA:	02/10/2017
CONTRATISTA:	FELICIANA BARRIOS ZALETÁ		
MONTO CONTRATADO:	\$642,321.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/01/2018	01/01/2018
	TÉRMINO	30/03/2018	30/03/2018
	DÍAS	89	89
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$161,034.48	\$186,800.00	
AFIANZADORA:	Liberty Fianzas, S.A DE C.V. Liberty Fianzas, S.A DE C.V.		
No. DE FIANZA:	1877846-0000	1891232-0000	
FECHA:	02/10/2017	27/11/2017	
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO	INICIAL	FINAL
	PLAZO		
NO APLICA			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$642,321.26	C/IVA	

Arq. ANTONIO RÍOS PÉREZ DIRECTOR DE OBRAS

Arq. ANTONIO RÍOS PÉREZ SUPERVISOR

FORMATO 11

*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.





H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:	16/07/2018
MES QUE SE REPORTA	JULIO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIÉRREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	RAFAEL VALENZUELA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO RAFAEL VALENZUELA A IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DEL KM 0+659 AL KM 1+334
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	CAMINOS Y PUENTES FEDER	No. DE OBRA:	2018300690040		

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO						
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:								
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE	N/A	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	X	MUY BAJO	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		AGEB:								
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO						
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:								
LATITUD	20.400158176	LONGITUD	-97.126243084	DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA				X
		PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI	NO				X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

PAGO DE PAVIMENTO OBRA CAPUFE 2017

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

PAVIMENTO EN CAMINO

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
FINIQUITO	\$746,580.20	1	\$746,580.20	A 196	\$749,812.15	\$0.00	\$3,231.95	\$0.00	\$746,580.20
TOTALES	\$746,580.20		\$746,580.20		\$749,812.15	\$0.00	\$3,231.95	\$0.00	\$746,580.20

MONTO AUTORIZADO:	\$749,812.15	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$749,812.15	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA		EXISTE	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			X
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	CAPUFE-GTZ-IR-2017300690040	FECHA:	09/10/2017
CONTRATISTA:	URIEL DEL ANGEL PÉREZ		
MONTO CONTRATADO:	\$749,812.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/01/2018	01/01/2018
	TÉRMINO	30/03/2018	30/03/2018
	DÍAS	89	89
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$749,812.00	28/03/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$749,812.00	28/03/2018
FINIQUITO:	\$749,812.00	28/03/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	13/12/2017

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TERMINADA

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:	\$323,275.86	\$375,000.00		
AFIANZADORA:	zadora Insurgentes S.A D zadora Insurgentes S.A D			
No. DE FIANZA:	5652-02076-5	5652-02088-8		
FECHA:	09/10/2017	30/11/2017		
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	PLAZO		INICIAL	FINAL
	NO APLICA			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$749,812.15			C/IVA

Arq. ANTONIO RÍOS PÉREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ARQ. ANTONIO RÍOS PÉREZ
SUPERVISOR

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.





H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACION:	15/03/2018
MES QUE SE REPORTA	JULIO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	LOMAS CHICAS	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO LOMAS CHICAS A RAFAEL VALENZUELA DEL KM 0+000 AL KM 0+180
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	CAMINOS Y PUENTES FEDER	No. DE OBRA:	2018300690042		

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	NO	X	ANTECEDENTES:					
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:					GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
TIPO DE ZONA:	RURAL URBANA	CLAVE AGE:	N/A	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	X	BAJO	MUY BAJO	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	NO	X	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:						
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI	NO	X	DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	X			
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		LATITUD			LONGITUD			PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI NO
		20.413178197			-97.141518136					X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:	PAVIMENTO EN CAMINO OBAR DE 2017 CAPUFE PASIVOS
---	---

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:	CONCRETO EN CAMINO TERMINADO
---	------------------------------

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
FINIQUITO	\$975,896.16	1	\$975,896.16	99	\$980,120.82	\$0.00	\$4,224.66	\$0.00	\$975,896.16
TOTALES	\$975,896.16		\$975,896.16		\$980,120.82	\$0.00	\$4,224.66	\$0.00	\$975,896.16

MONTO AUTORIZADO:	\$980,120.82	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$980,120.82	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA			EXISTE
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			X
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	CAPUFE-GTZ-IR-2017300690042	FECHA:	21/11/2017
CONTRATISTA:	PEDRO HERNÁNDEZ REYES		
MONTO CONTRATADO:	\$980,120.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/01/2018	01/01/2018
	TÉRMINO	30/03/2018	30/03/2018
	DÍAS	89	89
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

	REPORTE	
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$980,120.00	30/03/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$980,120.00	30/03/2018
FINIQUITO:	\$980,120.00	30/03/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	21/12/2017

AVANCE	AVANCE FÍSICO REAL											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:	TERMINADO
----------------	-----------

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$84,493.17	\$98,012.08	
AFIANZADORA:	rtta, S.A de C.V. Grupo FIrta, S.A de C.V. Grupo FI		
No. DE FIANZA:	3900-02431-4	3900-02459-2	
FECHA:	21/11/2017	20/12/2017	
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO	INICIAL	FINAL
	PLAZO		
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$980,120.82	C/IVA	

Arq. ANTONIO RÍOS PÉREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ARQ. ANTONIO RÍOS PÉREZ
SUPERVISOR

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.





H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:	16/07/2018
MES QUE SE REPORTA	JULIO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIÉRREZ ZAMORA	LOCALIDAD: RAFAEL VALENZUELA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO LOMAS CHICAS A RAFAEL VALENZUELA DEL KM 0+775 AL KM 0+903
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CAMINOS Y PUENTES FEDER	No. DE OBRA: 2018300690043	

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO						
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		CLAVE		GRADO DE REZAGO SOCIAL:						
TIPO DE ZONA:	RURAL URBANA	AGEB:		N/A	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	X	MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI	X	NO						
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO						
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:								
LATITUD	20.408985841	LONGITUD	-97.135090846	DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	X			
		PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI	NO	X			

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO OBRA 2017-PASIVOS CAPUFE

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
PAVIMENTO EN CAMINO TERMINADO

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
FINIQUITO	\$706,129.98	1	\$706,129.98	36	\$709,186.82	\$0.00	\$3,056.84	\$0.00	\$706,129.98
TOTALES	\$706,129.98		\$706,129.98		\$709,186.82	\$0.00	\$3,056.84	\$0.00	\$706,129.98

MONTO AUTORIZADO:	\$709,186.82	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$709,186.82	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X		
	LICITACIÓN PÚBLICA			

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$709,186.00	30/03/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$709,186.00	30/03/2018
FINIQUITO:	\$709,186.00	30/03/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	18/12/2017

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO. DE CONTRATO:	CAPUFE-GTZ-IR-2017300690043	FECHA:	21/11/2017
CONTRATISTA:	JOSE LUIS ESPINO HERNANDEZ		
MONTO CONTRATADO:	\$709,186.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/01/2018	01/01/2018
	TÉRMINO	30/03/2018	30/03/2018
	DÍAS	89	89
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$61,136.79	\$70,918.68	
AFIANZADORA:	rtta, S.A de C.V. Grupo Fihita, S.A de C.V. Grupo Fi		
No. de FIANZA:	8035-00146-9	8035-00147-2	
FECHA:	21/11/2017	15/12/2017	
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO	INICIAL	FINAL
	PLAZO		
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$709,186.82	C/IVA	

OBSERVACIONES:
TERMINADO

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

Arq. ANTONIO RÍOS PÉREZ
DIRECTOR DE OBRAS

Arq. ANTONIO RÍOS PÉREZ
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:	16/04/2018
MES QUE SE REPORTA	JULIO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	LOMAS CHICAS	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO CORONADO - LOMAS CHICAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES F	No. DE OBRA:	2018300690102		

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO							
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:											
TIPO DE ZONA:	RURAL X URBANA	CLAVE AGE:	N/A	GRADO DE REZAGO SOCIAL:							
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI	X	NO		MUY ALTO	ALTO	MEDIO	X	BAJO	MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO		TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:					
						DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA			X
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		LATITUD		20.4261152	LONGITUD		-97.14089944	PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI	NO
											X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO CORONADO - LOMAS CHICAS
---	--

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:	RASTREO Y CUNETEO, EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE BANCO DE SABANA Y DE RIO, ESCARIFICADO Y ACAMELLONADO, TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO DE SUPERFICIE, COMPACTADO.
---	--

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE			FACTURAS				
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACIÓN UNIC	\$384,159.48	3	\$384,159.48	55	\$775,000.00	\$387,500.00	\$3,340.52	\$0.00	\$384,159.48
ANTICIPO	\$387,500.00	2	\$387,500.00	30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,500.00
TOTALES	\$771,659.48		\$771,659.48		\$775,000.00	\$387,500.00	\$3,340.52	\$0.00	\$771,659.48

MONTO AUTORIZADO:	\$775,000.00	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$775,000.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	EXISTE			
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA			
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		X	
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	ICO-AR 002-FISM DF/2018 30 069 014	FECHA:	02/03/2018
CONTRATISTA:	ISABEL SALAZAR ESPINOSA		
MONTO CONTRATADO:	\$775,000.00		C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/02/2018	05/03/2018
	TÉRMINO	30/03/2018	30/03/2018
	DÍAS	25	25
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$387,500.00	PORCENTAJE: 50.00
	FECHA DE PAGO:	13/03/2018	

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$775,000.00	09/04/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$775,000.00	09/04/2018
FINIQUITO:	\$384,159.48	09/04/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	06/04/2018

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:	TERMINADA
----------------	-----------

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$387,500.00	\$66,810.35	\$66,810.00
AFIANZADORA:	Irta, S.A de C.V. Grupo Fiertra, S.A de C.V. Grupo Fiertra, S.A de C.V. Grupo Fiertra		
No. DE FIANZA:	3900-02488-4	3900-02489-5	3900-02495-8
FECHA:	01/03/2018	01/03/2018	05/04/2018
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO		INICIAL
	NO APLICA		FINAL
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$775,000.00		C/IVA

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ING. LEONEL RODRIGUEZ RIOS
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:	15/06/2018
MES QUE SE REPORTA	JULIO

DATOS GENERALES	
MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA LOCALIDAD: EL CEPILLO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRILES - EL CEPILLO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES No. DE OBRA: 2018300690103	

ANTECEDENTES:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO	GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO X BAJO MUY BAJO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: TIPO DE ZONA: RURAL X URBANA CLAVE AGE: N/A	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA INDIRECTA COMPLEMENTARIA X
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO	PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI X NO	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA: LATITUD 20.43160765 LONGITUD 20.43160765	

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
ESCARIFICADO, CUNETEO, ACARREOS DE MATERIAL DE BANCO, TENDIDO Y MEZCLADO DE MATERIAL, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACIÓN UNC	\$669,181.03	2	\$669,181.03	59	\$1,350,000.00	\$675,000.00	\$5,818.97	\$0.00	\$669,181.03
ANTICIPO	\$675,000.00	1	\$675,000.00	31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,000.00
TOTALES	\$1,344,181.03		\$1,344,181.03		\$1,350,000.00	\$675,000.00	\$5,818.97	\$0.00	\$1,344,181.03

MONTO AUTORIZADO:	\$1,350,000.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$1,350,000.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	EXISTE X

NO. DE CONTRATO:	CO-AR 003-FISM DF/2018 30 069 01	FECHA:	02/03/2018
CONTRATISTA:	ISABEL SALAZAR ESPINOSA		
MONTO CONTRATADO:	\$1,350,000.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	05/03/2018	05/03/2018
	TÉRMINO	30/03/2018	30/03/2018
	DÍAS	25	25
ANTICIPO:	APLICA	X NO APLICA	
	MONTO:	\$675,000.00	PORCENTAJE: 50.00
	FECHA DE PAGO:	13/03/2018	

REPORTE		
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$1,350,000.00	09/04/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$1,350,000.00	09/04/2018
FINIQUITO:	\$669,181.03	09/04/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	06/04/2018

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:
TERMINADO

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$675,000.00 \$116,379.31 \$135,000.00
AFIANZADORA:	INZADORA ASERTA S.A DINZADORA ASERTA S.A DINZADORA ASERTA S.A DE
No. DE FIANZA:	3900-02482-2 3900-02483-9 3900-02493-0
FECHA:	02/03/2018 02/03/2018
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE IMPORTE/PERIODO FECHA
	MONTO PLAZO INICIAL FINAL
	NO APLICA
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$1,350,000.00 C/IVA

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ING. NORBERTO JUÁREZ MEJÍA
SUPERVISOR

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:	15/06/2018
MES QUE SE REPORTA	JULIO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	GUTIERREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE: 30DPR5104U COL. ASOCIACIÓN CIVIL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2018300690107		

ANTECEDENTES:										
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:			SI	X	NO					
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:										
TIPO DE ZONA:					GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
RURAL					MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	X
URBANA	X									
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:			SI	X	NO					
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO			SI	X	NO					
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA					TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:					
LATITUD 20.4437152					DIRECTA X INDIRECTA COMPLEMENTARIA					
LONGITUD -97.09677834					PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X					

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR
---	-------------------------

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:	DESPLANTE DE ESTRUCTURA, COLUMNAS, ESTRUCTURA PARA TECHADO, BARRA DE COCINA Y MOBILIARIO
---	--

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACIÓN DOS	\$167,362.15	2	\$167,362.15	186	\$168,086.66	\$0.00	\$724.51	\$0.00	\$167,362.15
ESTIMACIÓN UNO	\$181,129.24	1	\$181,129.24	182	\$181,913.35	\$0.00	\$784.11	\$0.00	\$181,129.24
TOTALES	\$348,491.39		\$348,491.39		\$350,000.01	\$0.00	\$1,508.62	\$0.00	\$348,491.39

MONTO AUTORIZADO:	\$350,000.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$350,000.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	EXISTE X

NO. DE CONTRATO:	IGTZ-AD 10-FISMDF/2018 30 069 010	FECHA:	13/04/2018
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA DE ALBA EN EL GOLFO S.A DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$350,000.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	16/04/2018	16/04/2018
	TÉRMINO	24/06/2018	31/05/2018
	DÍAS	70	46
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$167,362.00	31/05/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$350,000.00	31/05/2018
FINIQUITO:	\$167,362.15	31/05/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	22/06/2018

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	25	50	100	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	50	100	100	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:	TERMINADO
----------------	-----------

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$30,172.41	\$35,000.00	
AFIANZADORA:	Fianzas Monterrey S.A DFianzas Monterrey S.A D		
No. DE FIANZA:	1904088	1910277	
FECHA:	13/04/2018	31/05/2018	
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO	INICIAL	FINAL
	PLAZO		
NO APLICA			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$350,000.00	C/IVA	

Arg. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ARQ. JAIME GUABALUPE CASTILLO
BERNABE SUPERVISOR

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACION:	15/06/2018
MES QUE SE REPORTA	JULIO

DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	EL COCO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	No. DE OBRA:	2018300690108
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL ENRIQUE RODRIGUEZ CANO CLAVE: 30DPR0616M, LOCALIDAD EL COCO	

ANTECEDENTES:											
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:			SI	X	NO						
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:											
TIPO DE ZONA:	RURAL	X	CLAVE AGEB:	N/A	GRADO DE REZAGO SOCIAL:						
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	URBANA		SI	X	NO	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	X	BAJO	MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO			SI	X	NO	TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:					
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA			PROYECTO ESPECIAL			CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE			SI	NO	X
LATITUD	20.45378545	LONGITUD	-97.1424358								

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR
---	-------------------------

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:	DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS, HABILITADO DE ESTRUCTURA PARA TECHADO, BARRA PARA COCINA Y MESAS.
---	---

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACIÓN DO:	\$117,865.15	2	\$117,865.15	184	\$118,375.39	\$0.00	\$510.24	\$0.00	\$117,865.15
ESTIMACIÓN UN:	\$131,057.27	1	\$131,057.27	180	\$131,624.62	\$0.00	\$567.35	\$0.00	\$131,057.27
TOTALES	\$248,922.42		\$248,922.42		\$250,000.01	\$0.00	\$1,077.59	\$0.00	\$248,922.42

MONTO AUTORIZADO:	\$250,000.00	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$250,000.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE	X	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	AGTZ-AD 11-FISMDF/2018 30 069 010	FECHA:	13/06/2018
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA DE ALBA EN EL GOLFO S.A DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$250,000.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	16/04/2018	16/04/2018
	TÉRMINO	31/05/2018	31/05/2018
	DÍAS	70	46
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$117,865.15	31/05/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$250,000.00	31/05/2018
FINIQUITO:	\$17,865.15	31/05/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	21/06/2018

AVANCE FISICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	25	50	100	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	50	100	100	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:	\$21,551.72	\$25,000.00		
AFIANZADORA:	Fianzas Monterrey S.A DE FIANZAS Monterrey S.A DE			
No. DE FIANZA:	1904096	1910279		
FECHA:	13/04/2018	31/05/2018		
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	
	PLAZO		INICIAL	FINAL
	NO APLICA			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$250,000.00	C/IVA		

OBSERVACIONES:

TERMINADO

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

Arg. ANTONIO RÍOS PEREZ DIRECTOR DE OBRAS

ARG. JAIME GUADALUPE CASTILLO SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACION:	15/08/2018
MES QUE SE REPORTA	JULIO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIÉRREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	GUTIÉRREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES Y OBRAS DE ACCESO EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, GALERAS DE LA FERIA Y LIENZO CHARRO.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2018300690225		

ANTECEDENTES:									
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:			SI	X	NO				
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:					GRADO DE REZAGO SOCIAL:				
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGEB:	N/A	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	X
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI	X	NO					
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO					
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA					TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:				
LATITUD	20.46366928	LONGITUD	-97.08338339	DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA			
				PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI	NO	X	

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE CONCRETO EN ANDADORES Y CANCHAS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y LUMINARIAS, PINTURA EN HERRERIAS
---	--

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:	REHABILITACIÓN DE CONCRETO EN ANDADORES Y CANCHAS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y LUMINARIAS, PINTURA EN HERRERIAS
---	--

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE			FACTURAS				
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACION UNIC	\$297,297.00	1	\$297,297.00	1	\$298,584.00	\$0.00	\$1,287.00	\$0.00	\$297,297.00
TOTALES	\$297,297.00		\$297,297.00		\$298,584.00	\$0.00	\$1,287.00	\$0.00	\$297,297.00

MONTO AUTORIZADO:	\$503,533.23	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$503,533.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X		
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	Z-AD 08-FORTAMUNDF/2018 30 069	FECHA:	11/04/2018
CONTRATISTA:	MATEO GOMEZ GUERRA		
MONTO CONTRATADO:	\$503,533.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	13/04/2018	13/04/2018
	TÉRMINO	12/05/2018	12/05/2018
	DÍAS	30	30
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$297,297.00	10/05/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$297,297.00	10/05/2018
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FISICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	50	100	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	50	100	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:	POR FINIQUITAR
----------------	----------------

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$43,408.04		
AFIANZADORA:	Fianzas Monterrey S.A DI		
No. DE FIANZA:	1895289		
FECHA:	09/05/2018		
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO	INICIAL	FINAL
	PLAZO		
NO APLICA			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:			C/IVA

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

Arq. Jaime Guadalupe Castillo Bernabé
SUPERVISOR

FORMATO 11



**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACION:	15/08/2018
MES QUE SE REPORTA	JULIO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: GUTIERREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE MUNICIPAL EN COLONIA CUAHUTEMOC, EN CABECERA MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE FORTALECIMIENTOS	No. DE OBRA: 2018300690302	

ANTECEDENTES:										
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:			SI	X	NO					
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:										
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGE:	N/A	GRADO DE REZAGO SOCIAL:						
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP. SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	URBANA	SI	X	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	X	
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:										
			SI	X	NO					
			SI	X	NO					
				DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	X			
				PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI	NO	X		

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS PARA ZAPATAS, DADOS Y CADENAS DE DESPLANTE, MUROS, HABILITADO DE ACERO PARA LOSAS Y CONCRETO, ACABADOS Y PINTURA,

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS PARA ZAPATAS, DADOS Y CADENAS DE DESPLANTE, MUROS

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACION UNIC	\$1,161,500.00	2	\$1,161,500.00	2	\$0.00	\$1,171,600.00	\$10,100.00	\$0.00	\$1,161,500.00
ANTICIPO	\$1,450,000.00	1	\$1,450,000.00	1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450,000.00
TOTALES	\$2,611,500.00		\$2,611,500.00		\$0.00	\$1,171,600.00	\$10,100.00	\$0.00	\$2,611,500.00

MONTO AUTORIZADO:	\$2,900,000.00	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$2,900,000.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X		
	licitación pública			

NO. DE CONTRATO:	GTZ-LR 13-FORTAFIN/2018 30 069 03	FECHA:	19/06/2018
CONTRATISTA:	MIGUEL ANGEL LIMA ESCAMILLA		
MONTO CONTRATADO:	\$2,900,000.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	25/06/2018	25/06/2018
	TÉRMINO	23/09/2018	
	DÍAS	90	0
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$1,450,000.00	PORCENTAJE: 50.00
	FECHA DE PAGO:	20/06/2018	

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$1,161,500.00	12/07/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$2,611,500.00	12/07/2018
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FISICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	10	45	85	100	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	10	80	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$1,450,000.00	\$250,000.00	
AFIANZADORA:	Fianzas Monterrey S.A DE CV Fianzas Monterrey S.A DE CV		
No. DE FIANZA:	1947510	1947512	
FECHA:	19/06/2018	19/06/2018	
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO	INICIAL	FINAL
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	NO APLICA		C/IVA

ARG. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Alfredo Moreno Neri
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:
15/08/2018
MES QUE SE REPORTA
JULIO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA LOCALIDAD: NACIO M. ALTAMIRANO (PLAN DE ALTAMIRANO) DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - ENTRONQUE PAGUAS DE CORONADO DEL KM 0+000
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CAMINOS Y PUENTES FEDER No. DE OBRA: 2018300690401

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI NO X

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO X MUY BAJO

TIPO DE ZONA: RURAL URBANA CLAVE AGE: N/A

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI NO X

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI NO X

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA INDIRECTA COMPLEMENTARIA X

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA: LATITUD 20.38588257 LONGITUD -97.149765199

PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

CUNETEO, RASTREO DE SUPERFICIE, ESCARIFICADO, ACARREO DE MATERIAL DE BANCO, MEZCLA Y TENDIDO DE MATERIAL, COMPACTADO CON APLICACIÓN DE AGUA.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

CUNETEO, RASTREO DE SUPERFICIE, ESCARIFICADO, ACARREO DE MATERIAL DE BANCO, MEZCLA Y TENDIDO DE MATERIAL, COMPACTADO CON APLICACIÓN DE AGUA.

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMA UNICA	\$743,534.48	2	\$743,534.48	4	\$1,500,000.00	\$750,000.00	\$6,465.52	\$0.00	\$743,534.48
ANTICIPO	\$750,000.00	1	\$750,000.00	187	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00
TOTALES	\$1,493,534.48		\$1,493,534.48		\$1,500,000.00	\$750,000.00	\$6,465.52	\$0.00	\$1,493,534.48

MONTO AUTORIZADO: \$1,500,000.00 C/IVA

MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$1,500,000.00 C/IVA

VALIDACIÓN DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA

DEPENDENCIA QUE VALIDA: EXISTE NO EXISTE NO APLICA

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA

DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: EXISTE

TIPO DE LICITACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA

NO. DE CONTRATO: IGZ-LR 17-CAPUFE/2018 30 069 040 FECHA: 18/07/2018

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DE ALBA EN EL GOLFO S.A DE C.V.

MONTO CONTRATADO: \$1,500,000.00 C/IVA

PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO 23/07/2018 REAL 23/07/2018

TERMINO 05/09/2018

DÍAS 45

APLICA X NO APLICA

ANTICIPO: MONTO: \$750,000.00 PORCENTAJE: 50.00

FECHA DE PAGO: 18/07/2018

REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$743,534.48	31/07/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$1,500,000.00	31/07/2018
FINIQUITO:	\$743,534.48	31/07/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	10/08/2018

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	50	90	100	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRAS
PUBLICAS

TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS

MONTO AFIANZADO: \$750,000.00 \$129,310.35

AFIANZADORA: Fianzas Monterrey S.A DE Fianzas Monterrey S.A DE

No. DE FIANZA: 1925024 1925028

FECHA: 18/07/2018 18/07/2018

CONVENIO MODIFICATORIO: MONTO EXISTE IMPORTE/PERIODO FECHA

PLAZO INICIAL FINAL

NO APLICA

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: C/IVA

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Alfredo Moreno Neri
SUPERVISOR

FORMATO 11

