





MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

OPERADO
FISM

INFORME FOTOGRÁFICO

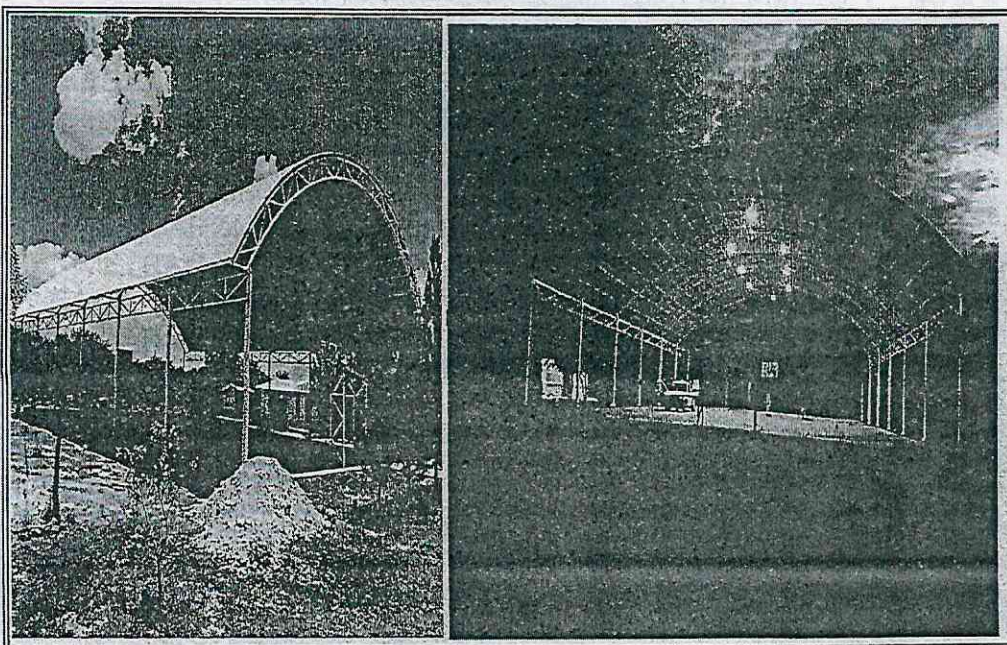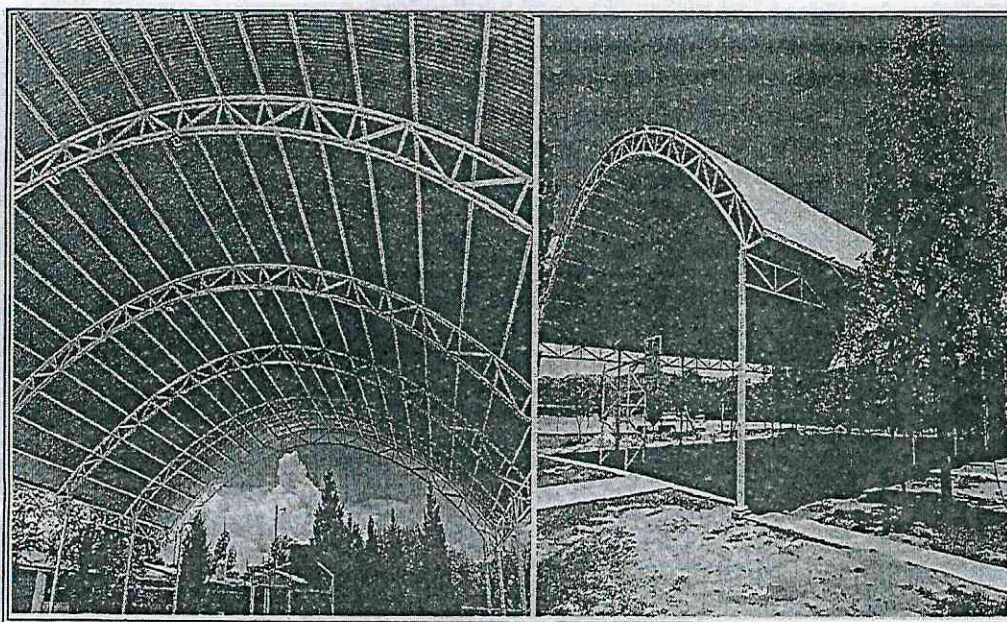

000237

CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "JUAN
OBRA: ESCUTIA" DE LA COMUNIDAD DE AGUAGORDITA, VILLA GARCIA, ZACATECAS.

LOCALIDAD: AGUAGORDITA, VILLA GARCIA, ZACATECAS

PERIODO DE EJECUCIÓN: 18-mav-22

28-jun-22

BITÁCORA DE OBRA.

Nombre de la obra: Construcción de arco techo en la Escuela Telesecundaria de la Comunidad de Agua Gordita, Villa García, Zacatecas.

Nota 1: 17 de Mayo del 2022.

SE DA INICIO FORMALMENTE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Nota 2: 28 de Mayo del 2022

SE EMPIEZA CON EL ARMADO DE LA ZAPATA CON ESPECIFICACIONES TECNICAS DE 1.20 X 1.20 X 0.4 MTS, UTILIZANDO BARRAS DEL #4 CADA 15 CM DE SEPARADO CON RECUBRIMIENTO LIBRE DE 5 CM

Nota 3: 7 de Junio del 2022

UNA VEZ QUE EL CONCRETO DE LOS DADOS Y ZAPATAS ALCANZO SU MAXIMA RESISTENCIA SE PROSIGUIO A PONER LOS SOPORTES DE CARGA LOS ACTUALES PERFILES ESTRUCTURALES

Nota 4: 15 de Junio del 2022

SE COLOCARON LAS CABRILLAS ESTRUCTURALES PARA CERRAR LA PERIMETRAL, SE COLOCARON LOS LARGUEROS ENTRE CABRILLAS PARA SOPORTE DE LA LAMINA

Nota 4: 21 de Junio del 2022

SE COLOCÓ LA LAMINA PINTRO DURAPLUS CAL 26, SE PROCEDIÓ A LA COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED INDUSTRIAL

Nota 5: 28 de Junio del 2022

CON ESTA FECHA SE DA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, QUEDANDO CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS, EJECUTADOS AL 100%

