




MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

INFORME FOTOGRÁFICO

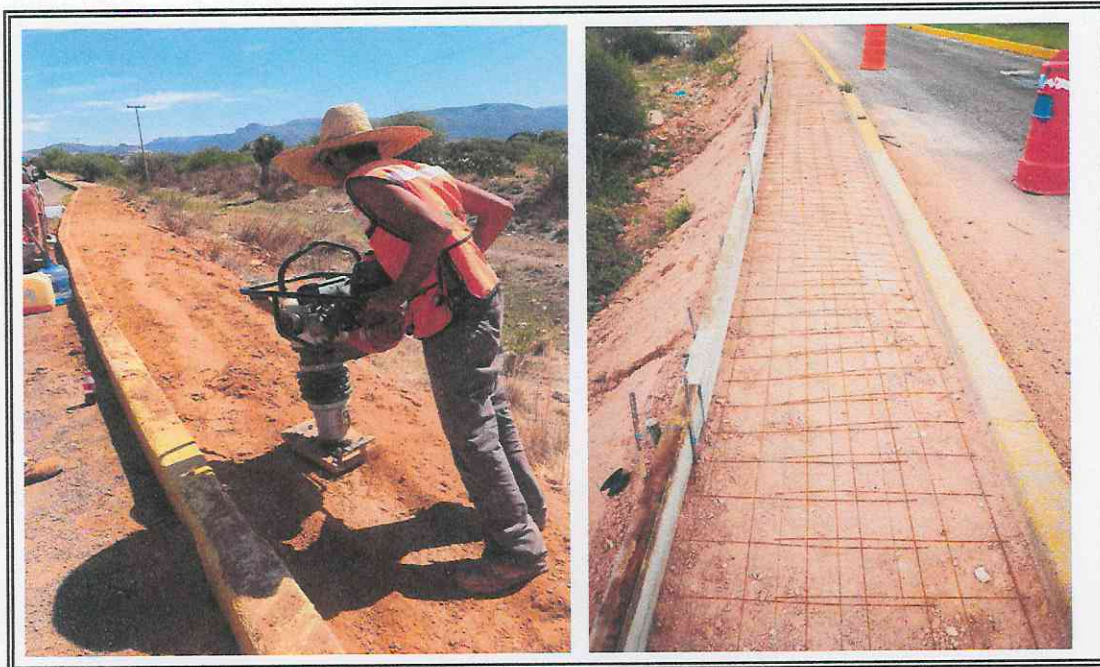

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR Y
REHABILITACION DE GUARNICIÓN DE CONCRETO DE 35 X 15 CMS DE
DIMENSIÓN EN BOULEVARD GUADALUPE, VILLA GARCIA, ZACATECAS

OBRA:

LOCALIDAD:

PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO

FECHA

PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

CALLE LA LUZ, COLONIA NIEVES, CABECERA MUNICIPAL

7-ago-23

TERMINO

28-ago-23

martes, 3 de octubre de 2023

100%

BITÁCORA DE OBRA.

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR Y REHABILITACION DE GUARNICIÓN DE CONCRETO DE 35 X 15 CMS DE DIMENSIÓN EN BOULEVARD GUADALUPE, VILLA GARCIA, ZACATECAS

Nota 1: Se da inicio a la obra con el trazo y nivelación de las áreas en donde se construirán las guarniciones.

Nota 2: Se comienza a vaciar el material de relleno en diferentes puntos de la obra, para posteriormente iniciar con el tendido y compactado del mismo.

Nota 3: Se da inicio al acomodo del material de relleno, así como a la hidratación y compactación del terreno.

Nota 4: Se da por finalizada la etapa del relleno, hidratación y compactación.

Nota 5: Se comienza a realizar el encofrado de la guarnición asegurándose que las tablas de madera estén bien colocadas y aseguradas para soportar el concreto.

Nota 6: Se comienzan a cimbrar las guarniciones y se dan por terminadas.

Nota 7: Se inicia la construcción de las banquetas, con el tendido de malla electrosoldada, y una vez finalizado su acomodo, se da inicio al tendido de la mezcla de concreto.

Nota 8: Se finalizó la construcción de las banquetas, por lo que se procede a realizar la limpieza de los materiales restantes en el área de trabajo, y se da por concluida la obra.
