


**DIRECCIÓN DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

|            | REAL | PROGRAMADO |
|------------|------|------------|
| % AVANCES  |      |            |
| FISICO     | 30   | 30         |
| FINANCIERO | 30   | 30         |

000192

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN:

RECTOR DE OBRAS PUBLICAS



WASH  
D.C.







MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS

INFORME FOTOGRÁFICO

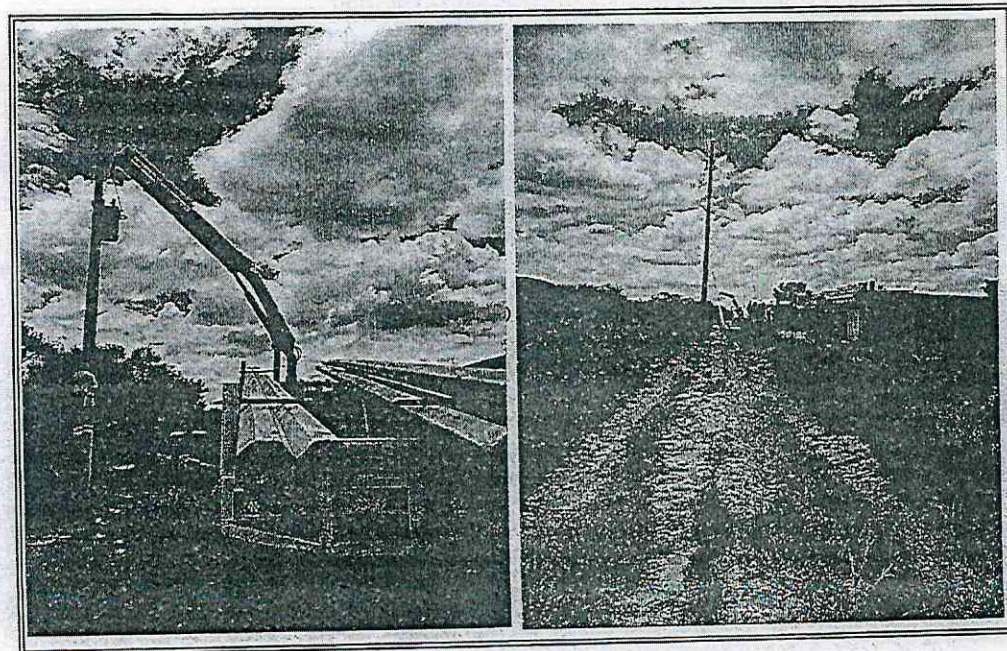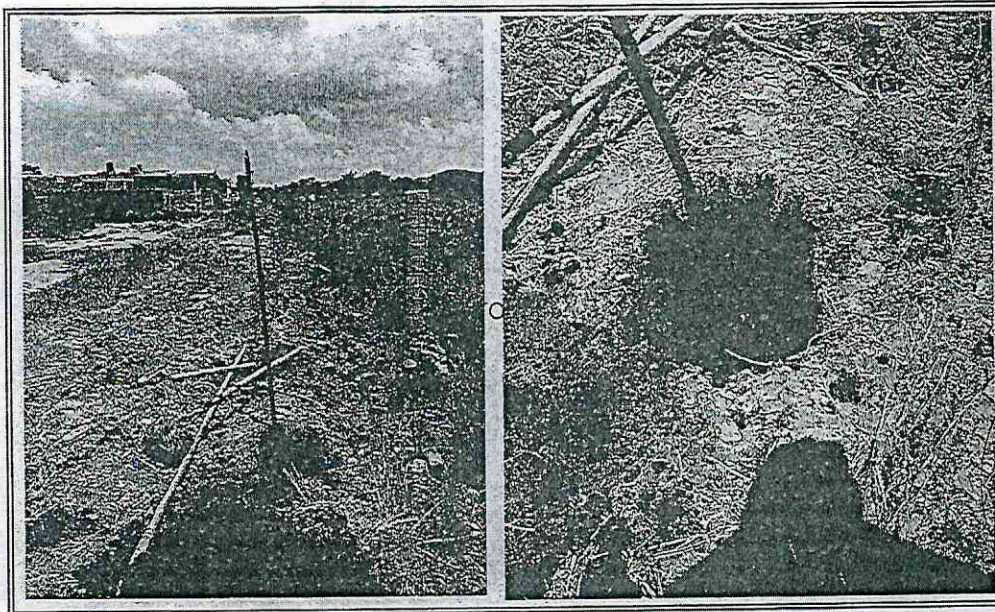

000193

CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE LA MONTESA DE LA  
CABECERA MUNICIPAL, DE VILLA GARCIA, ZACATECAS

OBRA:

LOCALIDAD:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

11-ago-22

VILLA GARCIA, ZACATECAS

30-ago-22

hasta 3 de octubre de 2022



**OPERADO  
FISM**

## **BITÁCORA DE OBRA.**

**CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE LA MONTESA DE LA CABECERA  
MUNICIPAL, DE VILLA GARCIA, ZACATECAS**

**Nota 1: 11 Agosto 2022**

Se da el arranque de obra con el despalme, para comenzar la excavacion de las cepas

**Nota 2: 20 Agosto 2022**

Se revisa la obra y ya estan colocados todos los postes y el trasformador.



000194










MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS

## INFORME FOTOGRÁFICO

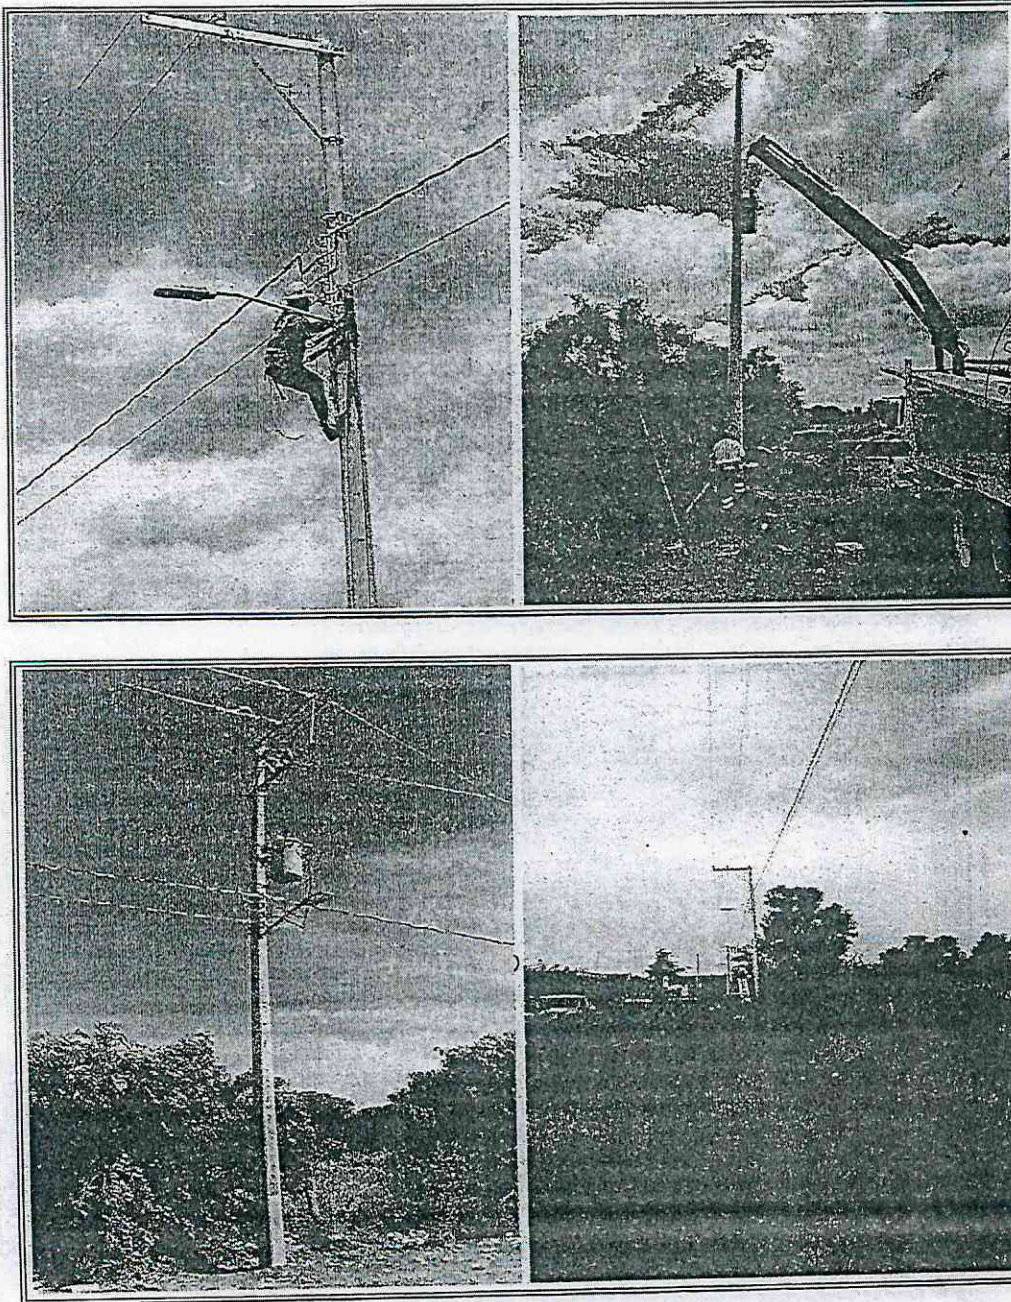

000196

CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE LA MONTESA DE LA  
CABECERA MUNICIPAL, DE VILLA GARCIA, ZACATECAS

OBRA:

LOCALIDAD:

VILLA GARCIA, ZACATECAS

PERIODO DE EJECUCIÓN:

1-sep-22

11-oct-22



**OPERADO  
FISM**

## BITÁCORA DE OBRA.

CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE LA MONTESA DE LA CABECERA  
MUNICIPAL, DE VILLA GARCIA, ZACATECAS

**Nota 1:**

Se da el arranque de obra con el despalme, para comenzar la excavacion de las cepas

**Nota 2:**

Se revisa la obra y ya estan colocados todos los postes y el trasformador.

**Nota 3:**

Se llevó a cabo la visita a la obra corroborando la terminación del cableado y luminarias para alumbrado público.

**Nota 4:**

Se da por finalizada la obra y en espera de respuesta de tramites ante CFE



000197
