

MANTENIMIENTO REDES HIDRAULICAS SUMINISTRO CONJUNTO RESIDENCIAL DALI

Constructora Martínez el día 23 de noviembre de 2020 atendiendo la llamada de la administración del conjunto residencial DALI se acercó a las instalaciones del conjunto a realizar la atención de una emergencia hidráulica evidenciada en la zona de parqueaderos frente a la torre 26 del conjunto.

Una vez inspeccionada el área afectada se procede a realizar el retiro del pavimento flexible y a excavar aproximadamente 1,20 metros de profundidad hasta localizar la red principal en tubería de PVC-P de 4" la cual presentaba una fractura por fatiga e el material en uno de los accesorios de derivación. Por lo anterior se procedió a realizar el corte de las tuberías afectadas y el retiro de los accesorios que se encontraron fracturados, posterior a esto se realizó la reparación reemplazando una TEE unión mecánica, una unión multi usos en hierro dúctil y una unión unión mecánica para garantizar movilidad y mayor manejo a las altas presiones a las cuales esta expuesta esta red de tuberías.

Una vez concluidas las reparaciones se procedió a realizar el relleno de las áreas excavadas y a reconstruir las áreas de adoquín retiradas para poder acceder a las tuberías intervenidas.


Constructora Martinez adjunta registro fotográfico correspondiente a las actividades desarrolladas como soporte de los trabajos realizados así mismo ratificamos nuestro compromiso y respaldo con el conjunto DALI para los trabajos realizados y el apoyo técnico necesario para el buen desarrollo de estos.

**LUIS EDUARDO MARTINEZ AREVALO
GERENTE GENERAL**

REGISTRO FOTOGRAFICO





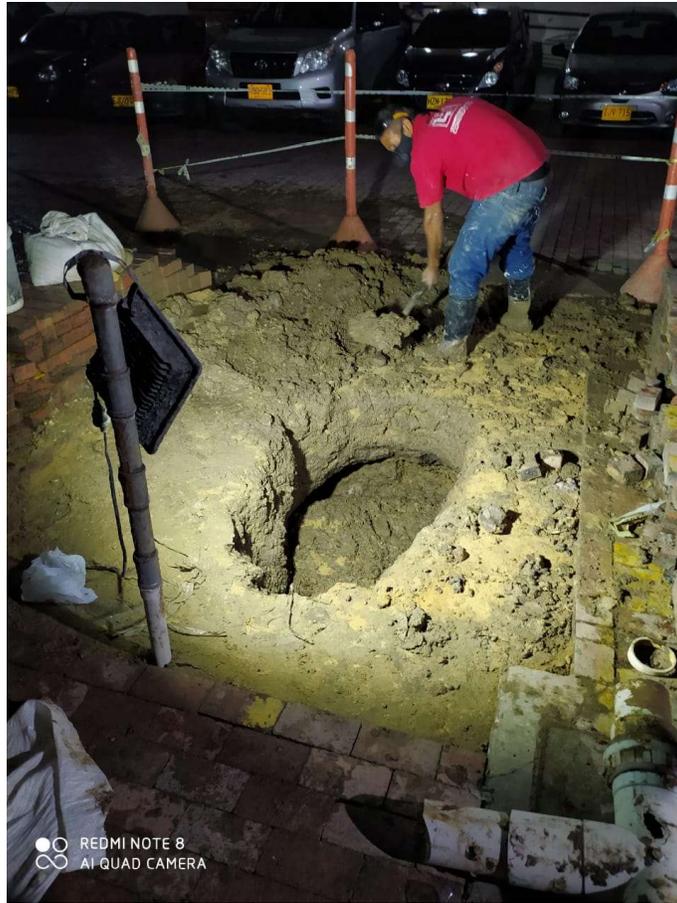

LUIS EDUARDO MARTINEZ AREVALO
GERENTE GENERAL
