INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ORTE :	1
REPORTE :	13/01/2023

% AVANCES	REAL	PROGRAMADO
FÍSICO	100	100
FINANCIERO	100	100

DATOS DE LA OBRA

E :	ONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR IPO" EN LA COMUNIDAD DE TIERRITAS BLANCAS, VILLA GARCIA, ZACATECAS
CIÓN :	TIERRITAS BLANCAS
E OBRA :	NUEVA
LIDAD EJEC.:	ADJUDICACIÓN DIRECTA
NTRATO :	CTO NO. 11 MVG -30-09-2022
ESA :	MARTIN RODRIGUEZ BAEZ
O CONTRATO :	$ 1,399,960.93
R CONTRATO :	30/09/2022
O ANTICIPO :	$ 419,988.27
A PAGO ANTICIPO :	30-sep-22
MPL. DE CONTRATO:	N/A
TO AMPL. CONTRATO:	N/A
IA AMPL. CONTRATO:	N/A

IODO DE EJECUCIÓN	INICIO	TERM.
HAS PROGRAMADAS :	3-oct-22	16-dic-22
HAS REALES :	3-oct-22	16-dic-22
HAS REPROGRAMADAS :		

OBSERVACIONES

PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA

PARTIDAS	IMPORTES
PRELIMINARES	$ 12,553.64
CIMENTACION	$ 9,295.72
ZAPATAS	$ 58,070.07
ESTRUCTURA	$ 1,103,581.18
ILUMINACION	$ 23,362.26
SUB-TOTAL	$ 1,206,862.87
16% I.V.A.	$ 193,098.06
TOTAL	$ 1,399,960.93

MESES: OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE

PROGRAMADO

REAL

DIAS

% EN BASE TIEMPO

REPRESENTANTE DE SUPERVISION

[redacted]

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

[redacted]

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL · MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC. · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

OBRAS PÚBLICAS · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

000166

OPERADO
FISM

MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

INFORME FOTOGRÁFICO

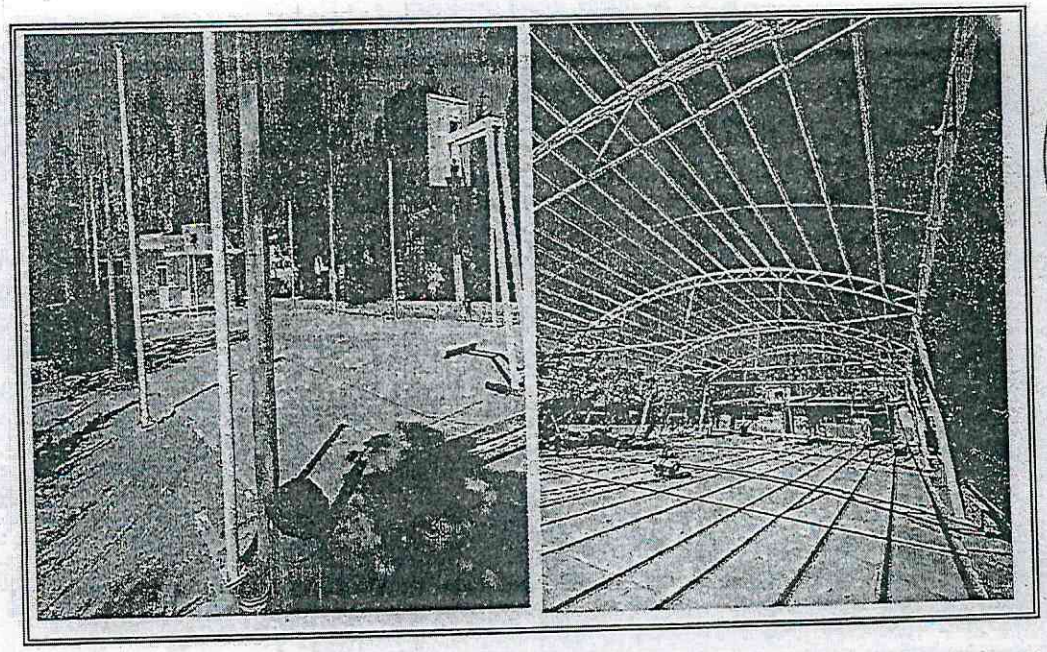

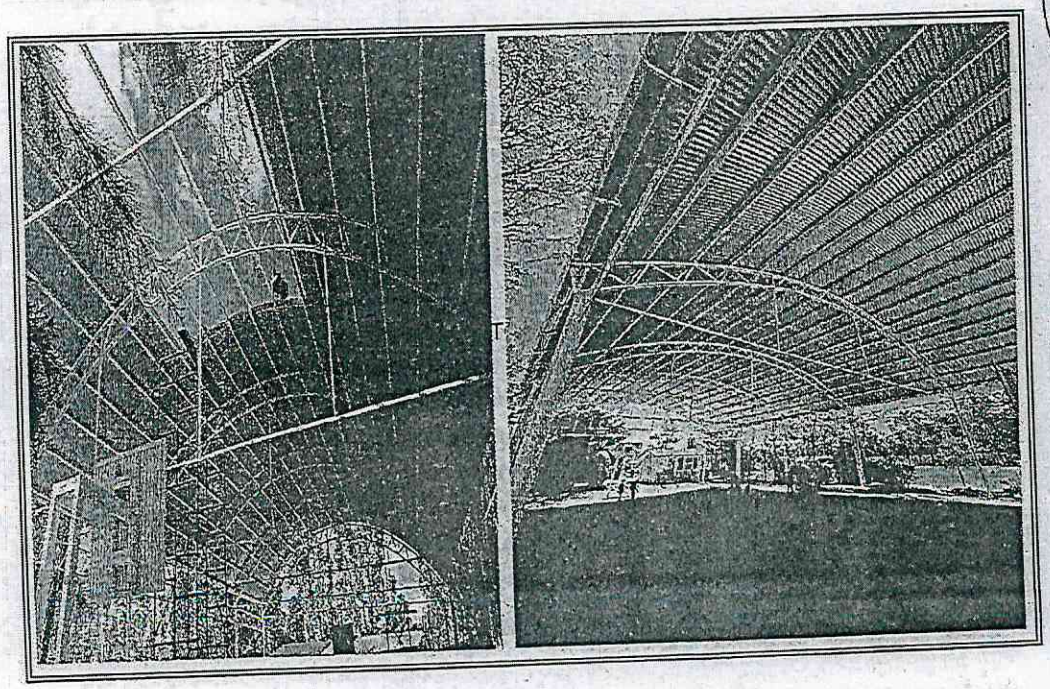

PRESIDENCIA MUNICIPAL • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

OBRAS PÚBLICAS • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

000167

CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO" EN LA COMUNIDAD DE TIERRITAS BLANCAS, VILLA GARCIA, ZACATECAS

OBRA:

LOCALIDAD: LOS CAMPOS

PERIODO DE EJECUCIÓN: 3-oct-22 16-dic-22

OPERADO
FISM

BITÁCORA DE OBRA.

Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO" EN LA COMUNIDAD DE TIERRITAS BLANCAS, VILLA GARCIA, ZACATECAS

Nota 1: 3 octubre
Se inicia la obra con la colocaciondel letrero de obra, asi como limpieza, trazo y nivelación de 608 m2 del terreno a construir.
Nota 2: 12 Octubre
Se verifica la excavácion a mano de material tipo "a" y la aplicación de la base de concreto, así como el armado de las parrillas de acero.
Nota 3: 30 Octubre
Se aplica cimentación en cepas para zapatas, 8.06 m3 de concreto elaborado en obra con máquina revolvedora
Nota 4: 15 Noviembre
Se colocan 48 anclas a base de redondo de 5/8, y se procede al armado y soldado de 12 placas de base de 40*40 cm de 3/4
Nota 5: 28 Noviembre
Se procede con habilitado, armado, y soldado de estructura principal de 12 tubos de acero
Nota 6: 4 Diciembre
Elevacion de estructura principal con ayuda de grua hidraulica, asi como la colocacion y soldado de montenes para techumbre
Nota 7: 8 Diciembre
Suministro, elevación y montaje de cubierta para techumbre, a base de lámina pintro cal 24, así como la colocación del canalón de lamina para bajada pluvial a base de tuvo PVC de 6",
Nota 8: 13 Diciembre

Suministro y colocación de luminaria según materiales y limpieza general

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

OBRAS PÚBLICAS • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

000168
