H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!

¡YA ES HORA DE CREER EN TI!
ESPERANZA
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL
Y COMBATE A LA POBREZA

INFORME MENSUAL DE ESTADO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES

FEBRERO 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!

¡YA ES HORA DE CREER EN TI!
ESPERANZA
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL
Y COMBATE A LA POBREZA

DEPENDENCIA: H. AYTTO. DE GUTIÉRREZ ZAMORA
SECCION: OBRA PÚBLICA
OFICIO No: OP-033/2021
ASUNTO: REPORTE MES DE FEBRERO

Gutiérrez Zamora, Ver. 25 de marzo 2021.

MTRA. DELIA GONZÁLEZ COBOS
AUDITOR GENERAL TITULAR DEL ORGANO
DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO.
P R E S E N T E :

El que suscribe **C. Ing. Wilman Monje Morales**, Presidente Municipal Constitucional en el Municipio de Gutiérrez Zamora, por medio del presente me dirijo a usted para hacer de conocimiento que en cumplimiento a lo que establece el artículo 30 de la *Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*, así como *Las Reglas de Carácter General para el cumplimiento de la Presentación de Información Municipal a través de Medios Electrónicos* al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz; Remito a usted el **Estado de Obra Pública correspondiente al mes de febrero 2021**, así como el acta de cabildo donde fueron aprobados.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021 PRESIDENCIA

ING. WILMAN MONJE MORALES
Presidente Municipal Constitucional

C.C.P. Archivo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!

¡YA ES HORA DE CREER EN TI!
ESPERANZA
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL
Y COMBATE A LA POBREZA

DEPENDENCIA: H. AYTTO. DE GUTIÉRREZ ZAMORA
SECCION: OBRA PÚBLICA
OFICIO No: OP-034/2021
ASUNTO: REPORTE MES DE FEBRERO

Gutiérrez Zamora, Ver. 25 de marzo 2021.

DIP. ADRIANA PAOLA LINARES CAPITANACHI
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
LXV LEGISLATURA DEL ESTADO
XALAPA, VERACRUZ.
P R E S E N T E :

El que suscribe **C. Ing. Wilman Monje Morales**, Presidente Municipal Constitucional en el Municipio de Gutiérrez Zamora, por medio del presente me dirijo a usted para hacer de conocimiento que en cumplimiento a lo que establece el artículo 30 de la *Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*, así como *Las Reglas de Carácter General para el cumplimiento de la Presentación de Información Municipal a través de Medios Electrónicos* al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz; Remito a usted el **Estado de Obra Pública correspondiente al mes de febrero 2021**, así como el acta de cabildo donde fueron aprobados.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIÉRREZ ZAMORA 2018-2021 PRESIDENCIA

ING. WILMAN MONJE MORALES
Presidente Municipal Constitucional

C.C.P. Archivo.

ACTA NÚMERO **19** **SESIÓN ORDINARIA** DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VERACRUZ.

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO efectuada por el Honorable Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz, a las **NUEVE horas** del **DIECISÉIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO**, de conformidad con lo que disponen los Artículos 36, Fracción I, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz-Llave.- Preside el C. Wilman Monje Morales Presidente Municipal, con quórum integrado por los ciudadanos: C. Rosa María Ortega González, Sindica Única; C. Gonzalo Quiñones López Regidor Primero, Francisco Hatzel Gómez Ochoa Regidor Tercero, Rosalía García Guerrero Regidora Cuarta. El C. Presidente Municipal, C. Wilman Monje Morales, declara abierta la Sesión, acto seguido, el secretario del H. ayuntamiento, procede a pasar lista de asistencia, declarando quórum legal. Inmediatamente da lectura al Orden del Día, misma que a la letra dice: -

1.- LISTA DE ASISTENCIA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021. -

En uso de la voz la C. Luis Javier Orostico López, Tesorero Municipal, informa al cabildo los Estados Financieros del mes de **febrero** de **2021**, acorde a lo establecido en el artículo 45 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre, mismos que fueron preparados por la Tesorería Municipal, en términos del artículo 72 fracción XIII de la misma Ley. En uso de la voz el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al cabildo si son de aprobarse los estados financieros correspondientes al mes de **febrero** del año **2021**. - - - - - - - - - - - - - - - -

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICA ÚNICA

El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO. – Se aprueban los Estados Financieros correspondientes al mes de **febrero** del año **2021**. **APROBADO POR MAYORÍA.** COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Posterior a ello, el C. Ing. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal, en los términos que marca la Ley, en uso de la voz, hace del conocimiento de los miembros del cabildo que se agotaron los asuntos del orden del día de esta **Décimo Novena Sesión Ordinaria** del H. Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz. - - - -

7.- CLAUSURA. - - -

ORFIS

Anexo al oficio No. EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA/66939

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2021300690001	REHABILITACIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	No	No	No	No
2021300690002	REHABILITACIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES EN GUTIÉRREZ ZAMORA	No	No	No	No

EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA/66939

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIÉRREZ ZAMORA

SELLO DIGITAL:

OhDtVdvViV4cKve+AtWgZ3Jy7bjHxoVdzJBKirfWf5RgjnRWvX6IntQGqqsVlTke7pawVe/niOICQbxfl/k0XnyA0Qb/7M4To7NzH8HsbgsK37vtxBr+bDCKo5lttueqz+aOhTFIWNg3TqWNhUq6PPnoITCH90INKwgaZVAOlF0=

ORFIS

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

Anexo al oficio No. EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA/66940

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12

EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA/66940

SIN MOVIMIENTOS EN EL PERIODO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIÉRREZ ZAMORA, VER. 2017 - 2021 OBRAS PÚBLICAS

SELLO DIGITAL:

TFdcL2LUcBeb5ad8jP+KcgdoO2o6lbg7OPlmbf/9MCxFKCRadAsJonkqgSn+TOb+rDgPNfixuDGvqd99c6LoTWf58oKA6aTNw17o3N3g60whEsFUoHZqUNwZZDxlwu5cYahCBytUqRapcz9M05L1Ao+uRToUzJfmB0QdxmPv2N0=

ORFIS

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

Anexo al oficio No. EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA/66971

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12

SIN MOVIMIENTOS EN EL PERIODO.

EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA/66971

SELLO DIGITAL:

Bp+lHf6830EWFvRNGcri7O2ZFHQjTOK8AoVlTjK459kS11M92cWiUcUTcAJ9RjlwHSUMlVjqnVxOlvFAbIDRlRqmSqnWKMB8azMlOwadLcDjVx9zEzjPfha5Su9fqLYD1f2BddInUZuB17qjkjchV/BJEbjuaqD+T3o8ldzcwnE=

ORFIS

Anexo al oficio No. EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA/66961

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690461	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA HIDALGO E IGNACIO ALLENDE DEL KM 0+460 AL 0+852.	Sí	No	Sí	No
2020300690464	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁILICO EN CAMINO RURAL LOMAS CHICAS – CORONADO KM 0+928 AL1+436	Sí	No	Sí	No

EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA/66961

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIÉRREZ ZAMORA, VER. 2017 - 2021 OBRAS PÚBLICAS

SELLO DIGITAL:

jE52IYZHn7c6hsUtK4nkhLwPSWIP4JUTSY0xvi1XQK7fPJMqBWGDD4ZBvJBCGJ5uTMvYrpLT6GXVTepkW7LgSn9sC2i+TxFqHqSD/4BxXsZv+xk/KHcNI6MeCwCUDTpxR71NHJzsU+gf+J+n1p3Nou4stHBLNVWxxnTNKbjL3Rs=

FORMATO 09A

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	**Localidad:**	RAFAEL VALENZUELA	**Ejercicio fiscal:**	EJERCICIO 2021
No. de obra:	2020300690461.00	**Periodo:**	FEBRERO	**Número de estimación:**	2.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO			**Fuente de financiamiento:**	O CAMINOS Y PUENTES FED
				Fecha de revisión:	25/03/2021

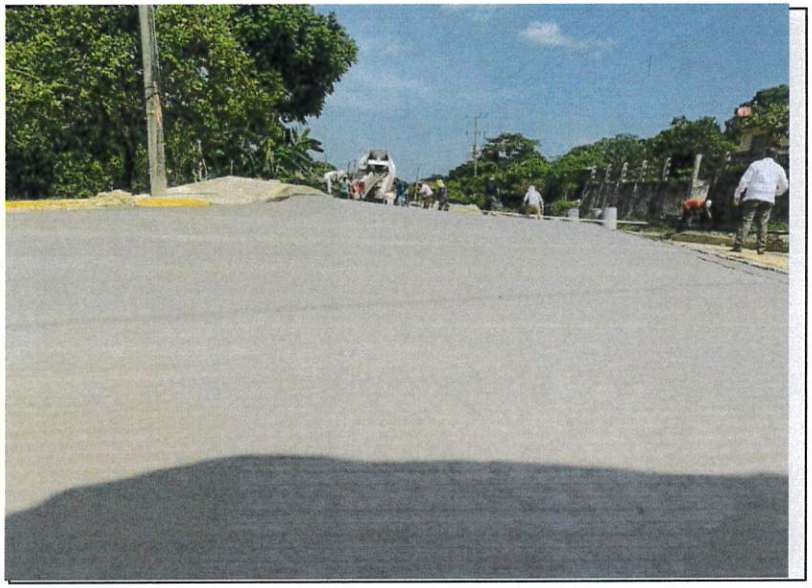

FOTO

Concepto de obra ejecutado:

FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIÉRREZ ZAMORA, VER. 2018-2021 OBRAS PÚBLICAS

ALFREDO MORENO NERI
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

FORMATO 09A

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	**Localidad:**	LOMAS CHICAS	**Ejercicio fiscal:**	EJERCICIO 2021
No. de obra:	2020300690464.00	**Periodo:**	FEBRERO	**Número de estimación:**	
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁILICO EN CAMINO RURAL LOMAS CHICAS – CORONADO KM 0+928 AL1+436			**Fuente de financiamiento:**	O CAMINOS Y PUENTES FED
				Fecha de revisión:	25/03/2021

FOTO

Concepto de obra ejecutado:

FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIÉRREZ ZAMORA, VER. OBRAS PÚBLICAS

ALFREDO MORENO NERI

Supervisor de obra Responsable

INGENIERO

Profesión del Supervisor

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2021

FECHA DE ELABORACIÓN:
25/03/2021
MES QUE SE REPORTA
FEBRERO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIÉRREZ ZAMORA	**LOCALIDAD:**	RAFAEL VALENZUELA	**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:**	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	SEGUIMIENTO CAMINOS Y P	**No. DE OBRA:**	2020300690461		

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:

TIPO DE ZONA: RURAL / URBANA — **CLAVE AGEB:** N/A

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI ___ NO X

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO SI X NO ___

GRADO DE REZAGO SOCIAL:

MUY ALTO | ALTO | MEDIO | BAJO X | MUY BAJO

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:

DIRECTA | COMPLEMENTARIA X | RESTRINGIDA

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LATITUD 20.406400000 **LONGITUD** -97.127398000

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA, TRAZO Y NIVELACION TOPOGRÁFICA DEL TERRENO PARA, EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIA CON EQUIPO MECANICO, CARGA CON MAQUINARIA, ACARREO EN CAMION 1ER. KM. DE MATERIAL MIXTO, ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, AFINE Y COMPACTACION DE SUB-BASE, BASE HIDRAULICA 70-30% (GRAVA 1 1/2"-

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA, TRAZO Y NIVELACION TOPOGRÁFICA DEL TERRENO PARA, EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIA CON EQUIPO MECANICO, CARGA CON MAQUINARIA, ACARREO EN CAMION 1ER. KM. DE MATERIAL MIXTO, ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, AFINE Y COMPACTACION DE SUB-BASE, BASE HIDRAULICA 70-30% (GRAVA 1 1/2"-

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ESTIMACIÓN 1	$1,073,000.00	1	$1,068,375.00	ZAM038	$1,073,000.00	$0.00	$4,625.00	$0.00	$1,068,375.00
ESTIMACIÓN 2	$562,600.00	2	$560,175.00	ZAM040	$562,600.00	$0.00	$2,425.00	$0.00	$560,175.00
TOTALES	$1,635,600.00		$1,628,550.00		$1,635,600.00	$0.00	$7,050.00	$0.00	$1,628,550.00

MONTO AUTORIZADO:	$1,768,031.58					C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	$3,403,631.58					C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE		NO EXISTE		NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:						
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE		NO EXISTE		NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:						
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE		NO EXISTE		NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:						

TIPO DE LICITACIÓN:	
	EXISTE
ADJUDICACIÓN DIRECTA	
INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X
LICITACIÓN PÚBLICA	

NO. DE CONTRATO:	MGZ-CAPUFE2020/0461/OP-004	**FECHA:**	03/12/2020
CONTRATISTA:	CLAUDIA GRISELDA MORALES CALDERON		
RFC:	MOCC790904T35		
MONTO CONTRATADO:	$3,403,631.58		C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA		REAL
INICIO	01/01/2021		04/12/2020
TÉRMINO	31/03/2021		28/02/2021
DÍAS	89		86
ANTICIPO: APLICA		NO APLICA	X
MONTO:		PORCENTAJE:	
FECHA DE PAGO:			

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:		$293,416.52	$340,363.16	
AFIANZADORA:		RTA, S.A DE C.V., GRUPO	RTA, S.A DE C.V., GRUPO	
No. DE FIANZA:		3900-03242-4	3900-03405-01	
FECHA:		03/12/2020	28/02/2021	
CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
MONTO				
PLAZO		INICIAL	FINAL	
NO APLICA				
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	$3,403,631.58			C/IVA

B)REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	$0.00	
MONTO PAGADO ACUMULADO:	$0.00	
FINIQUITO CON IVA:	$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FISICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

FALTA POR MINISTRAR CAPUFE

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

Ing. Rodolfo Gutiérrez Lechuga
DIRECTOR DE OBRAS

ALFREDO MORENO NERI
SUPERVISOR

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2021

FECHA DE ELABORACIÓN:
25/03/2021
MES QUE SE REPORTA
FEBRERO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIÉRREZ ZAMORA	**LOCALIDAD:**	LOMAS CHICAS	**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:**	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAILICO EN CAMINO RURAL LOMAS CHICAS – CORONADO KM 0+928 AL1+436
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	SEGUIMIENTO CAMINOS Y P	**No. DE OBRA:**	2020300690464		

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:

TIPO DE ZONA: RURAL / URBANA — **CLAVE AGEB:** N/A

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI NO X

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI X NO

GRADO DE REZAGO SOCIAL:

MUY ALTO | ALTO | MEDIO X | BAJO | MUY BAJO

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:

DIRECTA | COMPLEMENTARIA X | RESTRINGIDA

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LATITUD 20.427206000 **LONGITUD** -97.140138000

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA, TRAZO Y NIVELACION TOPOGRÁFICA DEL TERRENO PARA, EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIA CON EQUIPO MECANICO, CARGA CON MAQUINARIA, ACARREO EN CAMION 1ER. KM. DE MATERIAL MIXTO, ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, AFINE Y COMPACTACION DE SUB-BASE, BASE HIDRAULICA 70-30% (GRAVA 1 1/2"-

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA, TRAZO Y NIVELACION TOPOGRÁFICA DEL TERRENO PARA, EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIA CON EQUIPO MECANICO, CARGA CON MAQUINARIA, ACARREO EN CAMION 1ER. KM. DE MATERIAL MIXTO, ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, AFINE Y COMPACTACION DE SUB-BASE, BASE HIDRAULICA 70-30% (GRAVA 1 1/2"-

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ESTIMACIÓN 3	$423,300.04	3	$421,475.47	ZAM041	$423,300.04	$0.00	$1,824.56	$0.00	$421,475.47
ESTIMACIÓN 2	$800,400.00	2	$796,950.00	ZAM037	$800,400.00	$0.00	$3,450.00	$0.00	$796,950.00
ESTIMACIÓN 1	$272,600.00	1	$271,425.00	ZAM036	$272,600.00	$0.00	$1,175.00	$0.00	$271,425.00
ESTIMACIÓN 4	$342,200.00	4	$340,725.00	ZAM 042	$342,200.00	$0.00	$1,475.00	$0.00	$340,725.00
TOTALES	$1,838,500.04		$1,830,575.47		$1,838,500.04	$0.00	$7,924.56	$0.00	$1,830,575.47

MONTO AUTORIZADO:	$2,003,699.96		C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	$3,500,000.00		C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:			
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	SIOP		
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:			

TIPO DE LICITACIÓN:	EXISTE
ADJUDICACIÓN DIRECTA	
INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X
LICITACIÓN PÚBLICA	

NO. DE CONTRATO:	MGZ-CAPUFE2020/0464/OP-005	**FECHA:**	18/11/2020	
CONTRATISTA:	CLAUDIA GRISELDA MORALES CALDERON			
RFC:	MOCC790904T35			
MONTO CONTRATADO:	$3,500,000.00			C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/01/2021	01/01/2021	
	TÉRMINO	31/03/2021		
	DÍAS	89	58	
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA	
	MONTO:		PORCENTAJE:	
	FECHA DE PAGO:			

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		$301,724.14	$350,000.00
AFIANZADORA:		RTA, S.A DE C.V., GRUPO	RTA, S.A DE C.V., GRUPO
No. DE FIANZA:		3900-03240-0	3900-03403-6
FECHA:		18/11/2020	02/03/2021

CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO		FECHA
MONTO	X			01/01/2021
PLAZO	X	INICIAL	FINAL	01/01/2021
		01/01/2021	31/03/2021	
NO APLICA				
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	$2,276,766.55			C/IVA

B)REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	$0.00	
MONTO PAGADO ACUMULADO:	$342,200.00	
FINIQUITO CON IVA:	$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FISICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	37	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	37	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	80	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

FALTA MINISTRACIÓN DE CAPUFE

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

Ing. Rodolfo Gutiérrez Lechuga
DIRECTOR DE OBRAS

ALFREDO MORENO NERI
SUPERVISOR

FORMATO 11

Sistema de Información Municipal de Veracruz

SIMVER

Recibo No. EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA /66971

C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/03/2021 06:19:19 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/03/2021
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	FEBRERO
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Rodolfo Gutiérrez Lechuga
Observaciones:	

Cadena original:

Bp+IHf6830EWFvRNGcri7O2ZFHQjTOK8AoVITjK459kS11M92cWiUcUTcAJ9RjlwHSUMlVjqnVxOlvFAbID
RlRqmSqnWKMB8azMlOwadLcDjVx9zEzjPfha5Su9fqLYD1f2BddInUZuB17qjkjchV/BJEbjuaqD+T3o8ldzcw
nE=

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIÉRREZ ZAMORA VER. 2018 - 2021 OBRAS PUBLICAS

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."

Sistema de Información Municipal de Veracruz
SIMVER

Recibo No. EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA /66940

C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/03/2021 06:20:10 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/03/2021
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	FEBRERO
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Rodolfo Gutiérrez Lechuga
Observaciones:	

Cadena original:

TFdcL2LUcBeb5ad8jP+KcgdoO2o6lbg7OPImbf/9MCxFKCRadAsJonkqgSn+TOb+rDgPNfixuDGvqd99c6LoTWf58oKA6aTNw17o3N3g60whEsFUoHZqUNwZZDxlwu5cYahCBytUqRapcz9M05L1Ao+uRToUzJfmB0QdxmPv2N0=

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIERREZ ZAMORA, VER. 2019 - 2021 OBRAS PUBLICAS

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."

Sistema de Información Municipal de Veracruz

SIMVER

Recibo No. EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA /66939

C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/03/2021 06:21:01 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/03/2021
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	FEBRERO
Fuente de financiamiento:	RECURSOS FISCALES
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Rodolfo Gutiérrez Lechuga
Observaciones:	

Cadena original:

OhDtVdvViV4cKve+AtWgZ3Jy7bjHxoVdzJBKirfWf5RgjnRWvX6IntQGqqsVITke7pawVe/niOICQbxfl/k0Xny
A0Qb/7M4To7NzH8HsbgsK37vtxBr+bDCKo5lttueqz+aOhTFIWNg3TqWNhUq6PPnoITCH90INKwgaZVAOI
F0=

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIÉRREZ ZAMORA, VER. 2018 - 2021 OBRAS PÚBLICAS

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."

Sistema de Información Municipal de Veracruz

SIMVER

Recibo No. EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA /66961

C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/03/2021 06:21:46 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/03/2021
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	FEBRERO
Fuente de financiamiento:	SEGUIMIENTO CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 2020
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Rodolfo Gutiérrez Lechuga
Observaciones:	

Cadena original:

jE52lYZHn7c6hsUtK4nkhLwPSWIP4JUTSY0xvi1XQK7fPJMqBWGDD4ZBvJBCGJ5uTMvYrpLT6GXVTepk
W7LgSn9sC2i+TxFqHqSD/4BxXsZv+xk/KHcNI6MeCwCUDTpxR71NHJzsU+gf+J+n1p3Nou4stHBLNVWxx
nTNKbjL3Rs=

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIÉRREZ ZAMORA, VER. 2018 - 2021 OBRAS PÚBLICAS

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OBRA PÚBLICA

NÚM. RECIBO: 20210325185540238

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE GUTIéRREZ ZAMORA
PRESENTE

ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

INTEGRACIÓN DEL ESTADO MENSUAL DE OBRA PÚBLICA

PERIODO: MARZO 2021

FECHA DE RECEPCIÓN: 15/03/2021 AL 31/03/2021

DOCUMENTO ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO	RECEPCIÓN	
		FECHA	HORA
OP1. OFICIO DE REMISIÓN.	PDF	25/03/2021	18:49:24
OP2. ACTA DE SESIÓN DE CABILDO.	PDF	25/03/2021	18:49:35
OP3. RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES.	PDF	25/03/2021	18:49:48
OP4. REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (FORMATO 9).	PDF	25/03/2021	18:49:58
OP5. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO (FORMATO 11).	PDF	25/03/2021	18:50:29
OP6. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. (FORMATO...	PDF	25/03/2021	18:54:55
OP11. PROPUESTA GENERAL DE INVERSIÓN (FORMATO 01)	PDF	-	-

El presente documento se emite en el caso de Estados Financieros y Estados de Obra Pública mensuales de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para las demás se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. No exime de solicitudes, se reciben documentos con reserva de Ley, este recibo no implica validación de la información.

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OBRA PÚBLICA

NÚM. RECIBO: 20210331093218741

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE GUTIéRREZ ZAMORA
PRESENTE

ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

INTEGRACIÓN DEL ESTADO MENSUAL DE OBRA PÚBLICA

PERIODO: MARZO 2021

FECHA DE RECEPCIÓN: 15/03/2021 AL 31/03/2021

DOCUMENTO ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO	RECEPCIÓN	
		FECHA	HORA
OP1. OFICIO DE REMISIÓN.	PDF	25/03/2021	18:49:24
OP2. ACTA DE SESIÓN DE CABILDO.	PDF	25/03/2021	18:49:35
OP3. RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES.	PDF	25/03/2021	18:49:48
OP4. REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (FORMATO 9).	PDF	25/03/2021	18:49:58
OP5. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO (FORMATO 11).	PDF	25/03/2021	18:50:29
OP6. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. (FORMATO...	PDF	25/03/2021	18:54:55
OP11. PROPUESTA GENERAL DE INVERSIÓN (FORMATO 01)	PDF	31/03/2021	09:32:04

El presente documento se emite en el caso de Estados Financieros y Estados de Obra Pública mensuales de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para las demás se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. No exime de solicitudes, se reciben documentos con reserva de Ley, este recibo no implica validación de la información.

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
OBRAS
PÚBLICAS
